

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 1-2020

FECHA: 24 de julio de 2020.
HORA: 05:00 p.m.
LUGAR: Videoconferencia vía Teams.
ASISTENTES: Los relacionados en la lista de asistencia.

PARTICIPANTES:

DIEGO ALVAREZ – CONSULTOR DEL PROYECTO
EDGAR RONCANCIO HERNANDEZ
MILENA CANCHANO – EVALUADOR DEL PROYECTO MVCT
KAREN VERGARA – GRUPO DE RESIDUOS SÓLIDOS

DESARROLLO:

Teniendo en cuenta las observaciones presentadas por FINDETER al proyecto denominado “relleno sanitario regional de San José del Guaviare”, se realiza mesa técnica con el consultor y evaluador del proyecto a fin de dar claridad a las observaciones y realizar los ajustes respectivos a los planos de obra.


De la mano Edgar Roncancio quien es el dibujante del proyecto, se realiza a juste a los planos en los siguientes aspectos:


1. Plano general: dada la escala y la cantidad de información que este contiene, no se aprecia lo que se quiere mostrar en este, por tanto, se requiere quitar de este plano lo relacionado con detalles de canales, caseta de bombeo y detalles de impermeabilización como de excavaciones y dejar aquí solo la vista en planta de las obras contempladas en la etapa 1 a financiar.
2. Plano de detalles: se debe dejar en este lo relacionado con los detalles de celda, chimenea, espina de pescado.
3. Detalle perfil red evacuación de lixiviados: se debe ajustar este plano teniendo en cuenta que no se tiene cotas en el perfil de la red de lixiviado, no se define la profundidad de los pozos como tampoco las cotas batea y clave de la tubería de llegada y salida en cada uno de los

pozos. Ajustar este detalle a una escala tal que se pueda ver claramente.

4. Ajustar detalle de la caseta administrativa, no se tiene claridad de las redes hidrosanitarias, no hay claridad del suministro de agua potable hasta los aparatos sanitarios como tampoco se tiene claridad de tipo de pozo séptico, profundidad, perfil, cotas y desague del mismo.
5. No concuerda en los planos el tipo de puerta de acceso con la presupuestada, por tanto, se debe ajustar.
6. No hay plano de la bascula
7. Se recomienda ajustar los planos conforme al siguiente listado:
 - Plano1- general relleno sanitario
 - Plano 2- general etapa 1
 - Plano 3- Excavaciones e impermeabilización
 - Plano 4- lixiviados y recirculación
 - Plano 5- Aguas lluvias y canale
 - Plano 6- Obras complementarias: cierre perimetral, bascual, puerta, caseta, tanque (ojo con calculo estructural), séptico.
 - Plano 7: Detalles.

Como soporte de esta reunión se tiene las siguientes fotos

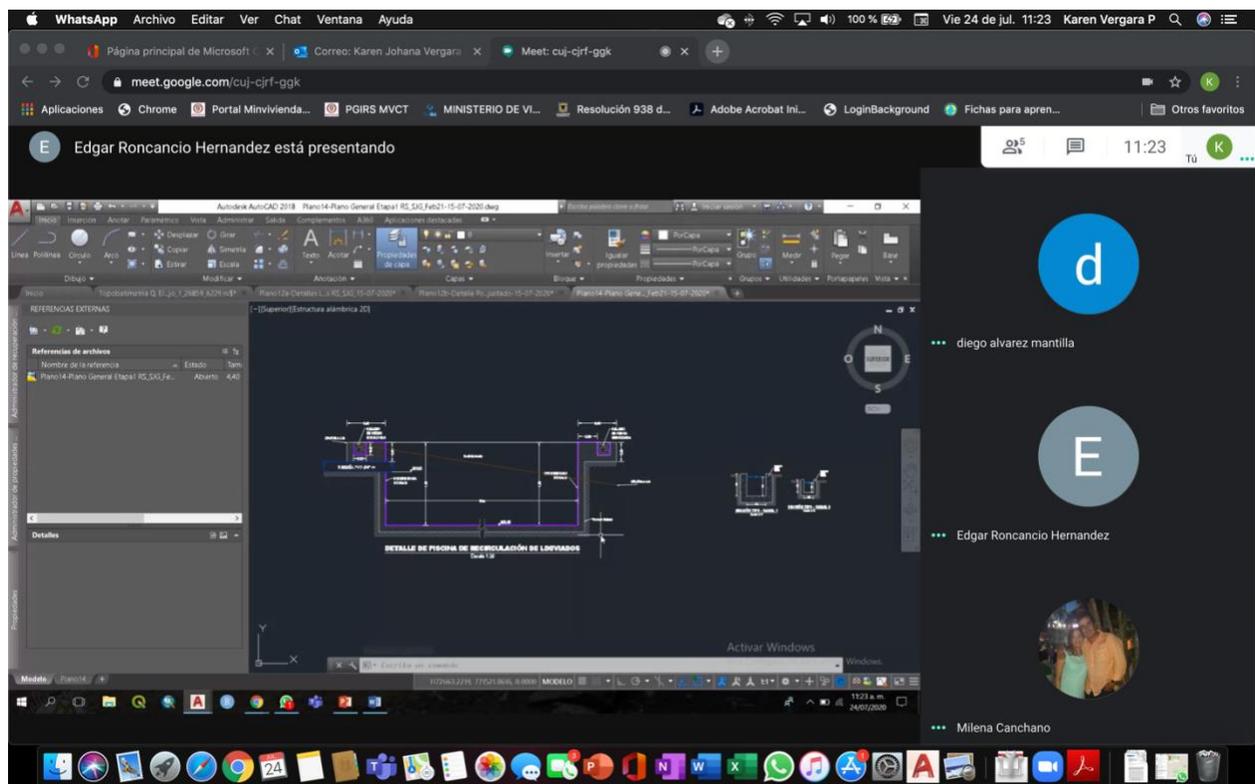

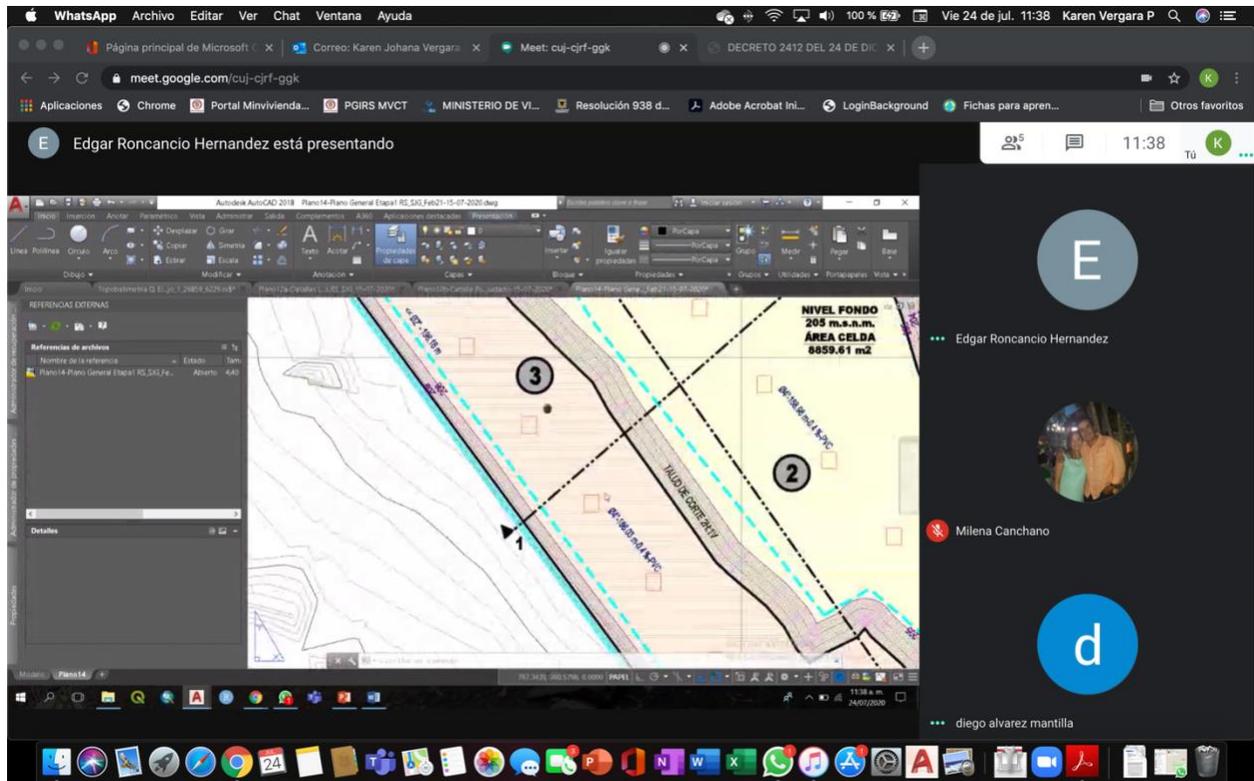

FIRMAS: Las relacionadas en lista de asistencia
Elaboró: Kvergara.
