

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 06

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 27 de octubre de 2023
HORA:	De 10:00 a 10:25 horas
LUGAR:	Presencial y virtual – Aplicativo de TEAMS
ASISTENTES:	Reimer Cordero – Consultoría – EKKO SOLUCIONES S.A.S. ESP. - Esoluciones.esp@gmail.com Jair Angarita – Consultoría – Ingeniero de apoyo. Alvaro Andrés Corcho – Contratista – Evaluador Líder – MVCT - aacorcho@minvivienda.gov.co
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los participantes.
2. Presentación de la respuesta de los requerimientos presupuestales.
3. Compromisos.

DESARROLLO:

1. Se presenta a la mesa técnica del 27 de octubre de 2023 el Ingeniero Reimer Cordero y Jair Angarita del proyecto **1-2021-272 OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUDUCTO PARA EL CASCO URBANO DE SAN JOSÉ DE MIRANDA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER**. Por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, se encuentra el Ingeniero Alvaro Corcho, evaluador líder del proyecto.
2. La mesa inicia con la revisión de los diferentes requerimientos de la última versión del presupuesto a partir del proceso de evaluación realizado por la ingeniera Mayra Martínez, especialista en presupuestos del ministerio.
3. Inicialmente se tiene que hay algunos componentes del presupuesto que no se presenta el detalle completo de la actividad por ejemplo en las estaciones reguladoras de presión se indica la necesidad de pasamuros en acero, pero no se indica longitudes.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

4. En el mismo componente de estaciones reguladoras hay un error ya que se no hay consistencia entre el modelo de diseño, el informe y en el presupuesto con respecto a las unidades requeridas. En el documento se menciona que son 9 estaciones, en el presupuesto 17 y en el modelo tan solo 16. Se solicita revisar y complementar la información en donde se necesite.
5. Se hace también la aclaración que se debe ajustar el presupuesto ya que las estaciones reguladoras de presión son de 2" y no de 3" como se presenta en el presupuesto, por lo que se solicita la aclaración y modificación de esto.
6. Con respecto a los macromedidores, no se especifica la longitud de los niples pasamuros, para esto, se solicita incluir el plano de detalle del macromedidor con todos los accesorios que se requieran.
7. Se solicita la revisión de los accesorios tipo codo, ya que todos se proyectan en PVC, y el proyecto no solo contempla el suministro e instalación de tubería en PVC, sino además en PEAD, por lo que se sugiere hacer un barrido de estos codos por el tipo de material proyectado
8. Con respecto a las cajas de las válvulas de cierre se solicita el detalle de estas cajas para incluirlas en el presupuesto.
9. A este punto el Ingeniero Reimer Cordero indica que realizará estos ajustes junto con el equipo de la alcaldía, ya que ellos son los responsables de este componente.
10. El Ingeniero Alvaro Corcho indica que con esto ya se puede hacer la última revisión del presupuesto para pasar el proyecto a comité, sin embargo, indica que en la entrega de documentos realizadas el 23 de octubre hay algunas falencias, las cuales fueron enviadas por correo electrónico ese mismo día.
11. Entre estas observaciones se encuentra que el componente topográfico no se cargó completamente.
12. Al respecto, el Ingeniero Reimer Cordero indica que esto ya fue solucionado, por lo que el ingeniero Alvaro Corcho procede a la revisión del documento, dando por sentado que los planos del componente se encuentran sin firmas.
13. Continuando con los demás componentes, se tiene que el informe de alternativas no tiene las firmas del interventor y supervisor del contrato, el Ingeniero Reimer Cordero indica que realizarán el ajuste.
14. El Ingeniero Alvaro Corcho solicita que en el plano general del proyecto se incluya una tabla con la ubicación de las VRP, macromedidores y válvulas de cierre.
15. Con respecto al plano de detalle de las estaciones reguladoras, el ingeniero Alvaro Corcho menciona que esto ya fue trabajado con el Ingeniero Juan Rodríguez, especialista hidráulico del proyecto, quien dará también alcance a la modificación del informe con respecto a las cantidades de las estaciones reguladoras de presión.


FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

- 16.** La reunión termina a las 10:25 a.m., y el ingeniero Reimer Cordero solicita la grabación de la mesa para hacer su plan de trabajo con el equipo de consultoría y formulador.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Envío de las últimas versiones	Consultoría	31/10/2023

FIRMAS:

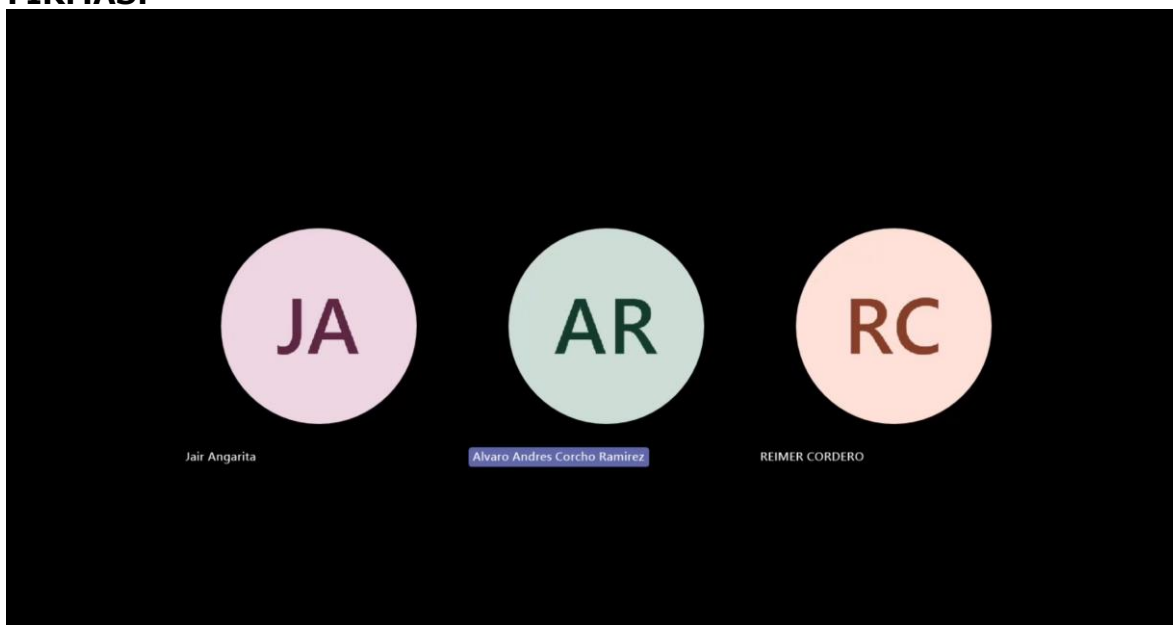

Anexos: Lista de asistentes reuniones externas

Elaboró: Alvaro Andrés Corcho Ramírez 
Fecha: 27/10/2023
