



FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-01

ACTA No. 6

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., 23 de octubre de 2024
HORA:	De 14:00 a 15:00 horas
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Aldo Romero, Alcaldía de El Banco, Magdalena Uri Acuña, Alcaldía de El Banco, Magdalena Sammy Arias, Alcaldía de El Banco, Magdalena Naty Vanesa Rivero Galvis, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP Andrés Fabián Vargas Fernández, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes e introducción
2. Reunión en el marco de la evaluación del proyecto
3. Comentarios de los asistentes
4. Cierre de la reunión

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes e introducción. Participantes de la entidad territorial, consultoría del proyecto y evaluadores del MVCT.
2. Reunión en el marco de la evaluación del proyecto ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN MAESTRO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE EL BANCO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
3. Comentarios de los asistentes
 - El Ingeniero Jaime Fuentes, abre la reunión dando la palabra a la Ingeniera Naty Rivero para que se refiera a sus observaciones al componente geotécnico del proyecto.
 - La Ingeniera Naty Rivero indica que recibió la documentación de la preinversión. Para la NSR-10, el geotecnista debe cumplir con la idoneidad. La página 36 especifica la experiencia específica del geotecnista. Indica que debe ser ingeniero civil. Indica que en la segunda observación se reitera para el diagnóstico un rubro de 160 millones.
 - La Ingeniera Sammy Arias indica que se relacionaron unos entregables en parte de suelos y geotecnia. Los sondeos a realizar son tres, para las tres estructuras que son la


estructura de bombeo proyectada y estructura de tratamiento. El objetivo de la exploración de las estructuras existentes, si es el caso de ampliación, se tiene en cuenta. Se contempla patología estructural.

- La Ingeniera Naty Rivero indica que para las descargas se proponen sondeos de 6 metros de profundidad. Indica que posiblemente no quepan los 3 sondeos en la estructura de entrega. En la estructura de tratamiento, se plantean de 3 a 6 metros. En cuanto a los redes se observa que en los términos de referencia, se tienen 60 kilómetros de redes.
 - La Ingeniera Sammy Arias indica que se prevee optimización de redes existentes.
 - La Ingeniera Naty Rivero, solicita revisar las profundidades de los apiques por ser redes de alcantarillado. Se recomienda que algunos de los apiques se dejen a una profundidad mayor.
 - La Ingeniera Sammy Arias indica que se tienen las cotizaciones.
 - La Ingeniera Naty Rivero solicita se revise el ítem de límites para clasificación de los suelos. Los límites serían por cada muestra que se tome. Se recomienda ensayo por ensayo. El CBR y Proctor se deben hacer solamente para proyectos de vías. Se debe justificar la necesidad de los ensayos.
 - El Ingeniero Aldo Romero, indica que el ensayo de características químicas debe hacer parte del estudio. Se va a reutilizar el material para los rellenos.
 - La Ingeniera Naty Rivero indica que la estructura debe estar cimentada en la losa de cimentación. Hay relación con la capacidad portante y de soporte. Se deben hacer ensayos de corrosión. Revisar que todos los ensayos que se hayan incluido, caractericen el suelo.
 - El Ingeniero Aldo Romero que van a haber estructuras afectadas por la composición del suelo.
 - La Ingeniera Sammy Arias indica que se revisarán los apiques.
 - La Ingeniera Naty Rivero, indica que la exploración geotécnica se realiza a juicio del geotecnista. Hay una normativa y lineamientos que indican cantidades mínimas. Ajustar un poco los términos de referencia para que sean muy claros. En los términos de referencia se incluyen unos estudios de geofísica que no se observan en el presupuesto, los cuales se deben omitir de los términos de referencia si no se van a realizar.
 - El Ingeniero Andrés Vargas indica que está revisando las observaciones y que las más relevantes son las cantidades y estudios de mercado. El Ingeniero Ambiental tiene una tarifa para unos productos y otra tarifa para otros productos. Lo que se pidió en las observaciones es para garantizar que el presupuesto incluya los impuestos y pólizas para la legalización del contrato. Se debe tener una base los impuestos aplicables para el contrato. Pregunta por la versión de honorarios.
 - La Ingeniera Sammy Arias indica que va a remitir el presupuesto definitivo actualizado. Hay actividades que se superponen entre sí, pero hay un director de proyecto que está presente durante todo el proyecto.
 - La Ingeniera Naty Rivero indica que para las alternativas se tienen 440 millones de pesos para geotecnia, considerándose como valor alto. Se sugiere revisar.
 - El Ingeniero Aldo Robayo indica que la entrega de subsanaciones se realizará el 30 de octubre de 2024.
4. Cierre de la reunión

COMPROMISOS.

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega de subsanaciones a los términos de referencia	Aldo Romero, Alcaldía de El Banco, Magdalena	30 de octubre de 2024

FIRMAS:

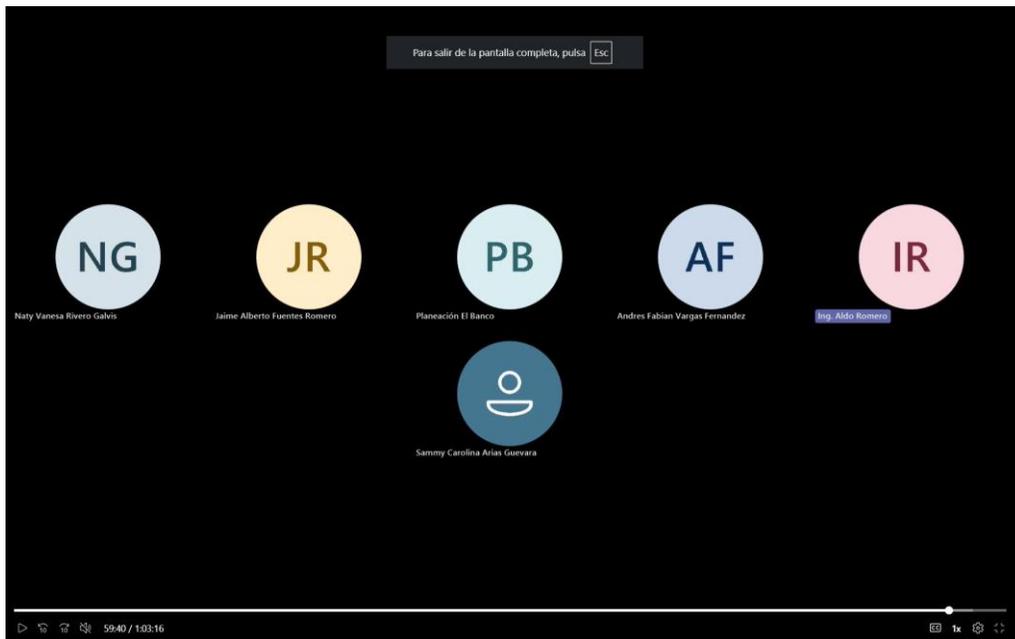

Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol
Jaime Alberto Fuentes Romero	10/23/24, 2:00:28 PM	10/23/24, 3:12:29 PM	1 h 12 min	JFuentes@minvivienda.gov.co	Organizador
Andres Fabian Vargas Fernandez	10/23/24, 2:00:10 PM	10/23/24, 3:12:26 PM	1 h 12 min 15 s	AFVargas@minvivienda.gov.co	Moderador
Naty Vanesa Rivero Galvis	10/23/24, 2:00:37 PM	10/23/24, 3:12:25 PM	1 h 11 min 48 s	NRivero@minvivienda.gov.co	Moderador
Planeación El Banco (No comprobado)	10/23/24, 2:02:14 PM	10/23/24, 3:12:29 PM	1 h 10 min 14 s		Moderador
Ing. Aldo Romero (No comprobado)	10/23/24, 2:08:33 PM	10/23/24, 3:12:29 PM	1 h 3 min 55 s		Moderador
Sammy Carolina Arias Guevara	10/23/24, 2:14:16 PM	10/23/24, 3:12:25 PM	58 min 8 s		Moderador
Uri Gabriel Acuña (No comprobado)	10/23/24, 3:09:00 PM	10/23/24, 3:12:26 PM	3 min 26 s		Moderador

Elaboró: Jaime Alberto Fuentes Romero
 Fecha: 23-10-2024
