ACTA DE ASISTENCIA TÉCNICA No. SIN

FECHA: 06/08/2020

HORA: 8 – 9:18 AM

LUGAR: Virtual (Microsoft Teams). La reunión se realiza a través de canales digitales.

ASISTENTES: Se adjunta lista de asistencia.

TEMA DE LA REUNIÓN:
Seguimiento avances de los ajustes del proyecto CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE CALAMAR DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

ORDEN DEL DIA:

- Antecedentes
- Observaciones
- Recomendaciones
- Compromisos.

Antecedentes:
PROYECTO: Construcción del alcantarillado sanitario del municipio de Calamar.
Valor: $46.660 millones.
Fuente: Sin fuente definida.
Fecha radicación: 23 de septiembre de 2019.
Fecha requerimiento: 20 de diciembre de 2019.
Observaciones principales del requerimiento:

- El proyecto propone el alcantarillado para la zona urbana del municipio de Calamar (Bolívar), con base en los diseños elaborados en el año 2015. De conformidad con la Resolución No.650/2017, los proyectos que a 31/12/2019 no hayan iniciado la etapa de construcción o el proceso de contratación, deberán actualizarse a la Resolución No.330/2017 - RAS. Por ende este proyecto requiere actualización normativa.
- Por otra parte, debe presentar el PSMV, permisos de ocupación de cauce (emisarios finales y tuberías de alivio), permiso de vertimientos (PTAR).
- De igual manera, actualizar la fase de intervención, considerando que en el año 2018 el PDA de Bolívar (Aguas de Bolívar S.A. E.S.P.) contrató la Fase I de este proyecto, indicar estado de ejecución, componentes del alcance, fecha estimada de entrega y puesta en operación de esta Fase.
- Así las cosas, este proyecto será la Fase II del Alcantarillado, por lo que se requiere actualizar a la normativa Res.330/2017 y componentes faltantes según intervenciones previamente realizadas.

Observaciones:

- La nueva Administración Municipal, contrató equipo consultor nuevo para que trabaje con los diseños iniciales.

- Estos consultores cambiaron ubicaciones de EBAR y PTAR, teniendo en cuenta que no se logró conseguir los predios del primer diseño.
- Actualmente, se cuenta con las proyecciones de población y caudal, las modelaciones.
- Se requiere que el Municipio presente:
    - Hace falta la geotecnia de los nuevos puntos de EBAR y PTAR.
    - Falta PSMV y permiso de vertimientos.
    - El MVCT solicitó que el municipio remita las 2 topografías, con el fin de revisar la armonización de los levantamientos 2015 y 2020 (nuevas ubicaciones). A la fecha, no han sido enviados.
    - Falta radicar ante INVIAS permiso para cruce corredor vial hacia Barranquilla, sobre la ruta nacional 25.
    - Falta el trámite de predios nuevos. Según lo manifestado por el municipio, este trámite lo llevan adelantado, pero no han enviado soportes.
    - Falta servidumbres del emisario final.
- El MVCT ha venido acompañando al municipio para atender los requerimientos.
- La última reunión que se llevó a cabo fue el pasado 06 de agosto de 2020, con participación del Secretario de Planeación del Municipio, la Consultora y el MVCT.
- En esa reunión el Municipio se comprometió a tener listos los ajustes para el mes de septiembre, mes en el que se estima sea radicado el proyecto ante el MVCT.
- La próxima reunión se estableció para el 01 de septiembre de 2020.
- El operador de energía eléctrica era Electricaribe actualmente interviene en la prestación la empresa EPM S.A. E.S.P.

Recomendaciones

- Iniciar los trámites de permisos ambientales ante CARDIQUE: PSMV, Permiso de vertimientos, Permiso de ocupación de cauce para el cabezal de desarga del emisario final sobre el río Magdalena.
- En el estudio de la Hidrología definir la cota de inundación para las estructuras PTAR y EBAR y asegurar que las estructuras queden ubicadas sobre la cota de inundación, lo anterior considerando que se tienen 2 cuerpos de agua importantes en el área de influencia del proyecto, a saber Río Magdalena y Canal del Dique.
- Iniciar los trámites de permisos ante INVIAS para los cruces sobre el corredor vial Barranquilla, ruta nacional 25.
- Revisar la posibilidad de colocar aliviaderos de caudal de aguas lluvias para aminorar el caudal a tratar y asegurar que se trate sólo de aguas residuales domésticas.
- Atender las observaciones estructurales, geotécnicas, de Topografía, prediales, eléctricas, y presupuestales indicadas durante la reunión.

Compromisos *(Si aplica)*:

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
Remitir los avances en el componente de topografía.	Consultoría.	Agosto – 2020.
Próxima reunión.	Municipio – Consultoría - MVCT	01 – Septiembre - 2020

FIRMAS: Pantallazo TEAMS.

Anexos: Lista de asistencia.

Elaboró: Ghisel González - Contratista MVCT.

Fecha: 06/08/2020.

La vivienda y el agua son de todos · Minvivienda	**FORMATO:** LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS **PROCESO:** GESTION DOCUMENTAL	Versión: 4.0 Fecha: 10/09/2019 Código: GDC-F-17

LUGAR: VIRTUAL **FECHA:** 06-08-2020 **HORA:** 8 – 9:18 AM

TEMA: CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE CALAMAR DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

PRESIDE: EQUIPO DE EVALUACIÓN MVCT **EQUIPO ACOMPAÑANTE:** EQUIPO CONSULTOR Y SEC. PLANEACION MUNICIPAL

No.	NOMBRE	CARGO	ENTIDAD / MUNICIPIO	TELÉFONOS Y CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	SOLICITUDES/ TEMÁTICA	FIRMA
1	LILIBETH ARIZA	CONSULTORA	MUNICIPIO DE CALAMAR		liliariza75@gmail.com	PROYECTO	PANTALLAZO TEAMS
2	JAIDER ESCORCIA CASSIANI.	SECRETARIO DE PLANEACIÓN	MUNICIPIO DE CALAMAR	3148087580	jaiderluisec@gmail.com	PROYECTO	PANTALLAZO TEAMS
3	DIANA ROA	CONTRATISTA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS	MVCT		droa@minvivienda.gov.co	PROYECTO	PANTALLAZO TEAMS
4	ISABEL LOPERA	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS	MVCT		ilopera@minvivienda.gov.co	PROYECTO	PANTALLAZO TEAMS
5	JUAN ALEJANDRO GARZÓN	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS	MVCT		jgarzon@minvivienda.gov.co	PROYECTO	PANTALLAZO TEAMS
6	JONH MARROQUIN	INGENIERO EVALUADOR DE PRESUPUESTOS.	MVCT		jmarroquin@minvivienda.gov.co	PROYECTO	PANTALLAZO TEAMS
7	JORGE	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN	MVCT		jcaro@minvivienda.gov.co	PROYECTO	PANTALLAZO

No.	NOMBRE	CARGO	ENTIDAD / MUNICIPIO	TELÉFONOS Y CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	SOLICITUDES/ TEMÁTICA	FIRMA
	CARO	DE PROYECTOS					TEAMS
8	JUAN CARLOS RESTREPO	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS	MVCT		jrestrepo@minvivienda.gov.co	PROYECTO	PANTALLAZO TEAMS
9	JOSÉ EDUARD GUAZÁ	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS	MVCT		jguaza@minvivienda.gov.co	PROYECTO	PANTALLAZO TEAMS
10	JUAN ALEJANDRO GARZÓN	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS	MVCT	3102138823	jgarzon@minvivienda.gov.co	PROYECTO	PANTALLAZO TEAMS
11	GHISEL GONZÁLEZ	CONTRATISTA SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS	MVCT	3107761655	gagonzalez@minvivienda.gov.co	PROYECTO	PANTALLAZO TEAMS
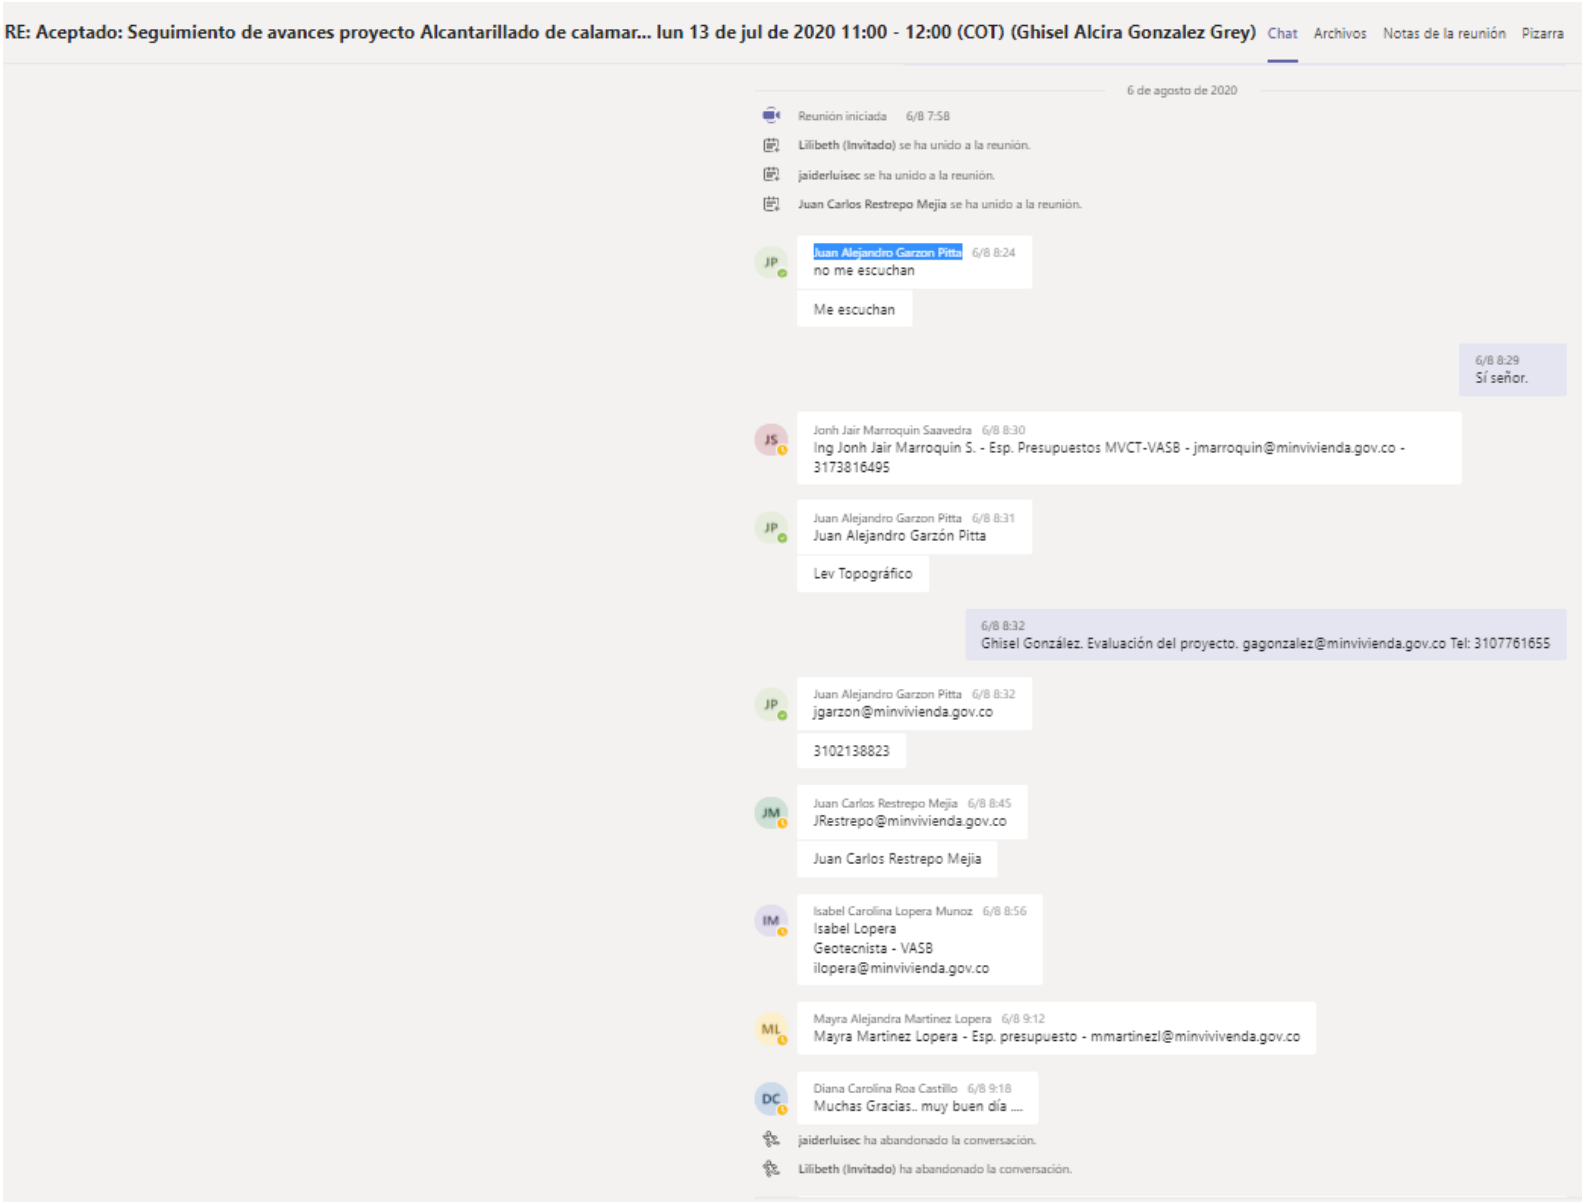
PANTALLAZO TEAMS
