ACTA No. 02

FECHA: 10 de septiembre de 2020

HORA: 5:00 Pm

LUGAR: Mesa virtual

ASISTENTES: Jorge Luis Mendoza – Alcalde Municipal de Leticia (Amazonas)
Jaime Riascos – Profesional de Apoyo Sec. Planeación
Carlos A. Solano Fajardo - MVCT
Cesar H. Torres A. - MVCT

INVITADOS:

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de asistentes a la reunión.
2. Revisión del estado del proyecto
3. Compromisos

DESARROLLO:

1. Se da por inicio a la mesa técnica virtual para el proyecto "IMPLEMENTACION PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ETAPA 2, MUNICIPIO DE LETICIA - AMAZONAS", donde se hace primero una presentación de cada uno de los asistentes por parte del Municipio y por parte del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio (MVCT).

2. Los pendientes que habían quedado de la primera mesa técnica realizada eran:

    - Presentar un consolidado de las inversiones que se han realizado en el marco del Plan maestro de acueducto y alcantarillado del Municipio de Leticia.
    - Presentar cual podría ser el alcance de la segunda etapa que se pretende viabilizar en el MVCT.

3. El municipio informa que en el marco del PMAA se han realizado seis (6) inversiones en el municipio así:

OBJETO	Valor Costo Directo	AIU	PAGA	PMT	PUESTA EN MARCHA	INTERVENTORIA	Total
REHABILITACIÓN DE LA CALZADA Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE OCTAVA DEL MUNICIPIO DE LETICIA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	$ 3.706.266.973,00	$ 1.189.711.698	$ 60.348.668	$ 53.202.115	-	$ 426.803.900	$ 5.436.333.354,00
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CENTRALIZADA EN EL MUNICIPIO DE LETICIA	$ 8.856.497.288,79	$ 2.834.079.132,41	$ 32.406.500,00	$ -	$ 207.620.640,00	$ 773.894.671,00	$ 12.704.498.232,20
OPTIMIZACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE LETICIA	$ 10.014.612.714,00	$ 2.980.608.176,00	$ 62.290.000,00	$ 70.746.520,00	-		$ 13.128.257.410,00
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO (FASE 1) DEL MUNICIPIO DE LETICIA, AMAZONAS	$ 4.535.112.194,02	$ 1.197.148.618,89	-	-	-	$ 462.549.568,11	$ 6.194.810.381,02
REHABILITACIÓN DE LA CALZADA Y REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CARRERA 11 DEL MUNICIPIO DE LETICIA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	$ 5.519.807.769,00	$ 1.596.936.191	-	$ 70.748.940,00		$ 471.418.472	$ 7.658.911.372,00
OPTIMIZACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA CARRERA 11 ENTRE CALLES 3 Y 6 Y CALLE 3 ENTRE CARRERAS 6 Y 11 Y MEJORAMIENTO DE LA VIA EN LETICIA	$ 12.003.013.531,06	$ 3.827.246.571	83.580.000,00	$ 129.257.650,32		$ 1.162.827.475,00	$ 17.205.925.227,00
TOTAL INVERSION PMAA	**$ 44.635.310.469,87**	**$ 13.625.730.386,92**	**$ 238.625.168,00**	**$ 323.955.225,32**	**$ 207.620.640,00**	**$ 3.297.494.086,11**	**$ 62.328.735.976,23**

Y el estado de estos proyectos son:

- Redes de acueducto y alcantarillado de la calle octava: se encuentra ejecutado en un 99%.
- Planta de tratamiento de aguas residuales: Ya se encuentra contratado, pero no se ha iniciado su ejecución por inconvenientes prediales y ambientales.
- Optimización PMAA calle 11: se encuentra suspendido por temas de cuarentena, con un avance del 40% d ejecución.
- Implementación del PMAA fase 1: Se inicio obra el 30 de enero de 2020, pero a la fecha se encuentra suspendido por temas de cuarentena, se ha ejecutado la topografía del contrato.
- Reposición de redes de acueducto y alcantarillado en la carrera 11: se encuentra en ejecución.
- Optimización de las redes de acueducto y alcantarillado de la carrera 11 entre calles 3 y 6, y calle 3 entre carrera 6 y 11: Fue contratado por la gobernación, pero no se ha iniciado su ejecución.

4. El municipio propone que el alcance del proyecto "IMPLEMENTACION PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ETAPA 2, MUNICIPIO DE LETICIA - AMAZONAS" fueran la contrauccion de las redes de aguas lluvias y alcantarillado de la calle 10, calle 9 y calle 6.

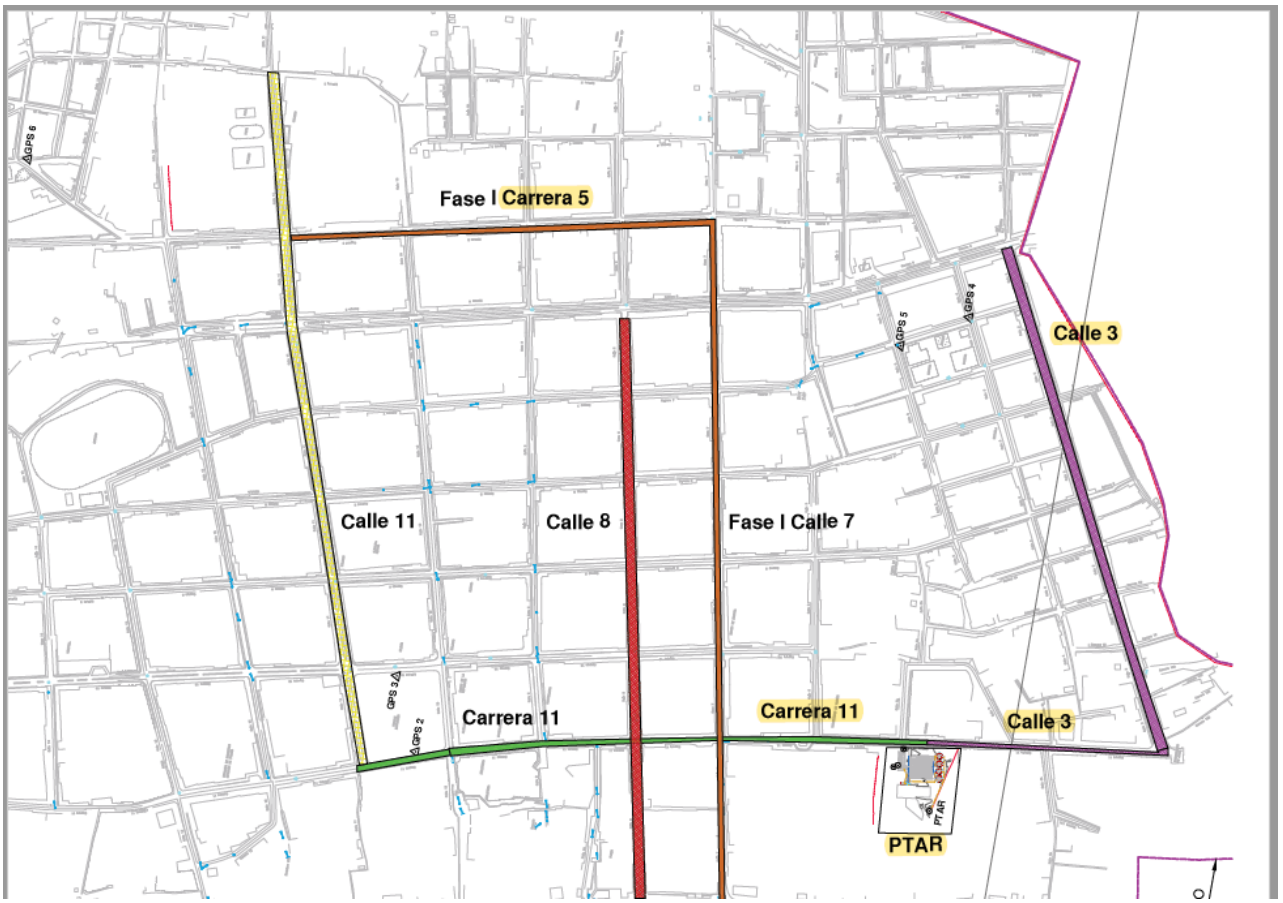

5. Dado lo anterior, el MVCT solicita que:

- La propuesta deberá estar dentro del marco del PMAA.
- Que este separado la red de aguas lluvias de la red de aguas residuales
- Que estas redes deben quedar conectados al nuevo sistema que se está construyendo para que lleguen así a la PETAR.
- Se deben atender las zonas de mayor impacto de manejo de aguas lluvias.
- Que se incluya la pavimentación del ancho de la tubería a construir.
- Que se debe realizar también inversión en agua potable, por lo que se deberá aclarar cuanto se invierte en saneamiento básico y cuanto en agua potable.
- Deberá tener un gran impacto y deberá ser funcional.
- Se debe definir si se va a realizar inversión en aseguramiento.

6. Se proyecta próxima mesa de trabajo donde para el próximo jueves 17 de septiembre de 2020, dependiendo de la confirmación de los asistentes.

Se da por terminada la mesa de trabajo. Compromisos *(Si aplica)*

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
Los compromisos pactados en cada uno de los puntos		

FIRMAS:

Elaboró:
Fecha:

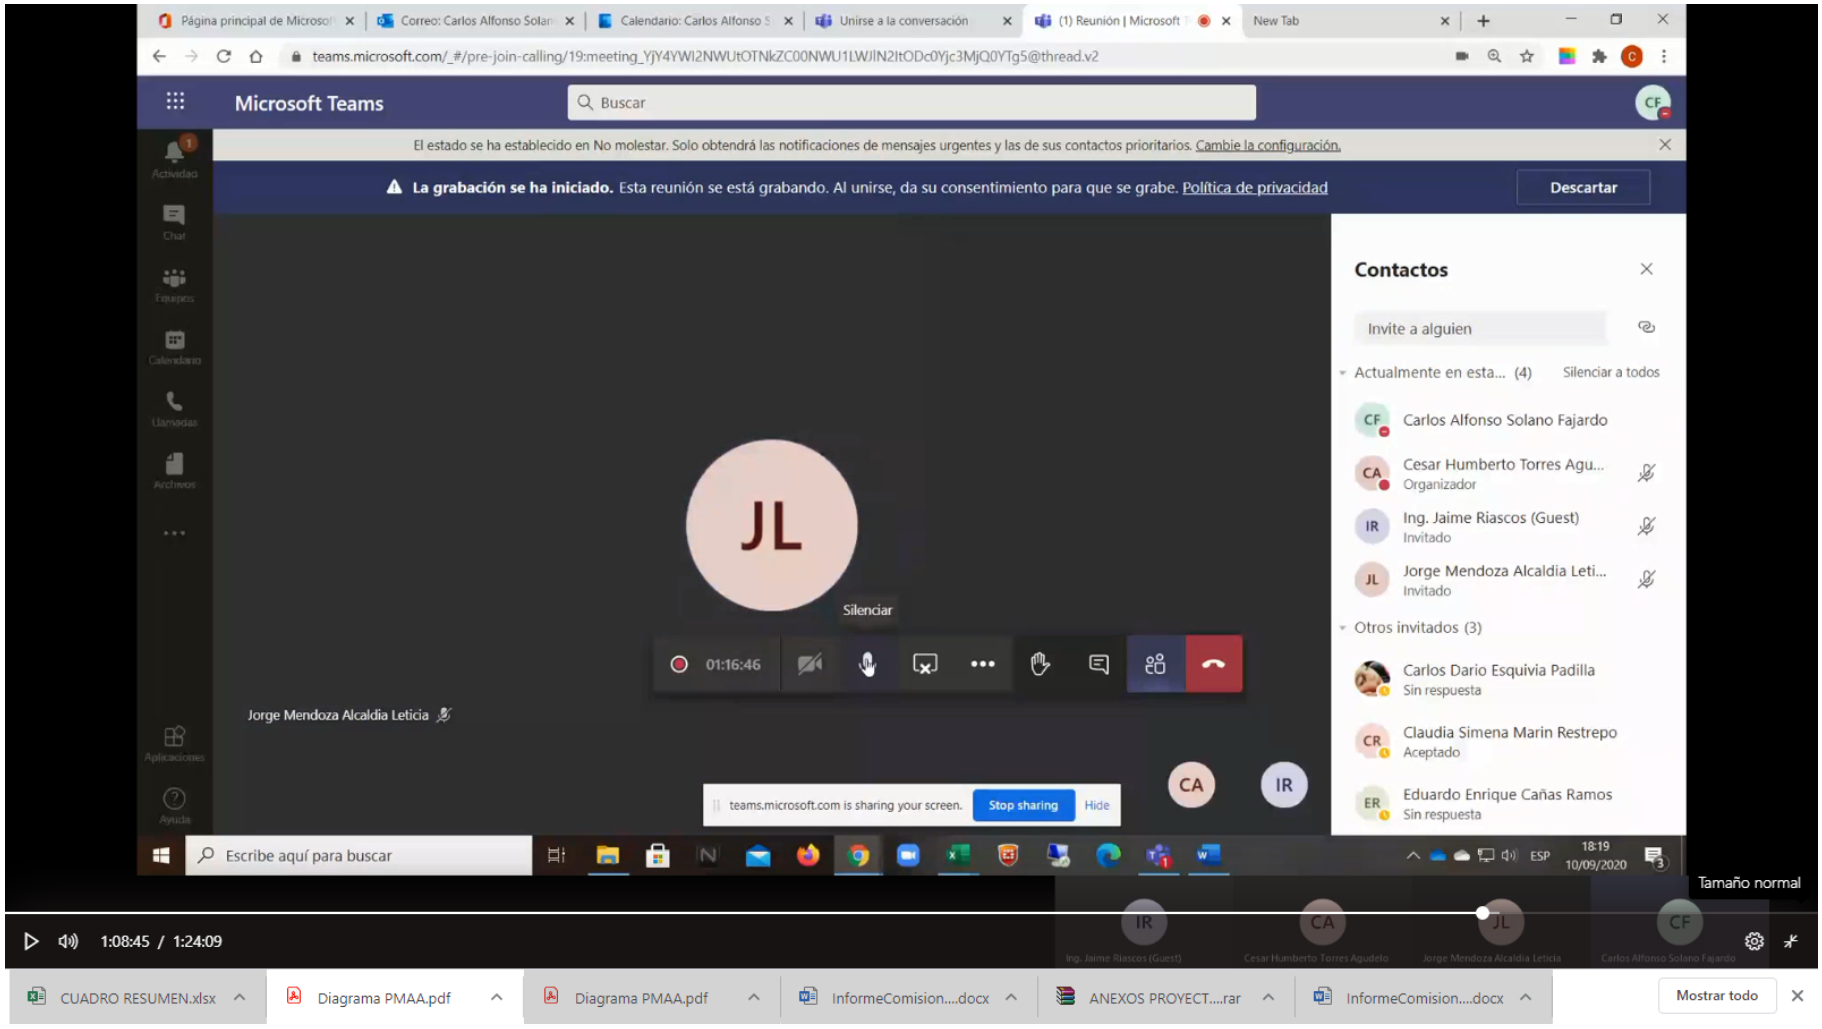
Microsoft Teams
Buscar
El estado se ha establecido en No molestar. Solo obtendrá las notificaciones de mensajes urgentes y las de sus contactos prioritarios. Cambie la configuración.
La grabación se ha iniciado. Esta reunión se está grabando. Al unirse, da su consentimiento para que se grabe. Política de privacidad
Descartar
Contactos
Invite a alguien
Actualmente en esta... (4)
Silenciar a todos
Carlos Alfonso Solano Fajardo
Cesar Humberto Torres Agu...
Organizador
Ing. Jaime Riascos (Guest)
Invitado
Jorge Mendoza Alcaldia Leti...
Invitado
Otros invitados (3)
Carlos Dario Esquivia Padilla
Sin respuesta
Claudia Simena Marin Restrepo
Aceptado
Eduardo Enrique Cañas Ramos
Sin respuesta
JL
Silenciar
01:16:46
Jorge Mendoza Alcaldia Leticia
teams.microsoft.com is sharing your screen.
Stop sharing
Hide
Escribe aquí para buscar
Tamaño normal
1:08:45 / 1:24:09
CUADRO RESUMEN.xlsx
Diagrama PMAA.pdf
Diagrama PMAA.pdf
InformeComision....docx
ANEXOS PROYECT....rar
InformeComision....docx
Mostrar todo
