ACTA No. 2

FECHA: Bogotá, 2 de octubre de 2020

HORA: De 9:00 a 10:00 A.M.

LUGAR: Mesa de trabajo Virtual – Aplicación TEAMS

ASISTENTES: Carlos Bernal Escobar – Evaluador grupo de evaluación MVCT
Aleida Hernández – Subgerente de Servicios Públicos
Sebastián Álzate – consultoría.

INVITADOS: Empresa Servicios Públicos de Rionegro - Antioquia.

ORDEN DEL DIA: Asistencia técnica para el proyecto de alcantarillado de los centros poblados de Rionegro - Antioquia.

Acta #2. 2 de octubre de 2020. SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DE LOS CENTROS POBLADOS DE RIONEGRO - ANTIOQUIA.

Se hace la verificación de la estructuración del proyecto para presentar por modalidad por requerimiento al MVCT

De acuerdo a la información entregada de los centros poblados de Rionegro, Antioquia, es necesario precisar sobre los siguientes aspectos:

- planos del planteamiento de alternativas de cada Ptar, deben plantear matriz multicriterio para las tecnologías propuestas para el tratamiento.
- memorias en Excel de los cálculos de cada módulo de la Ptar.
- planos en Autocad de los módulos de la Ptar en planta y perfil con sus respectivas cotas, nivel de terreno y cuadro de válvulas y accesorio.
- plano de localización general, plano predial y fichas de afectación predial con su respectiva información catastral.
- faltan todos los soportes del formato de diagnóstico de la entidad prestadora. (se envió ejemplo)
- faltan precios de referencia del presupuesto y cotizaciones
- falta el permiso de vertimientos de cada PTAR o el estado del tramite
- Falta metodología de obtención de los objetivos de calidad de las fuentes receptoras para las PTARs propuestas - aforos.
- Falta estudio de suelos de los lotes de las Ptars y EBARs.
- Falta estudio estructural con sus respectivos planos con cuadros de hierros en Dwg. De las EBAR y PTAR.
- Falta disponibilidad de servicio de energía para cada EBAR y PTAR.

- Falta estudio eléctrico para caseta de operaciones de las >EBAR y PTAR.
- Para centros poblados con poblaciones menores a 2500 hab. podemos utilizar 6" como diámetro mínimo.
- Revisar caudales de infiltración y de conexiones erras, den estar del orden de 0.2 L/s/ha.
- El presupuesto debe estar separado de suministros y mano de obra para valores mayores de 2000 salarios mínimos. (deben volver a enviar por separado algunos no abren).

Compromiso	Responsable
Se espera que después de subsanadas estas observaciones se radique el producto en la semana del 5 – 10 de octubre de 2020.	Evaluador MVCT CONSULTORIA GESTOR
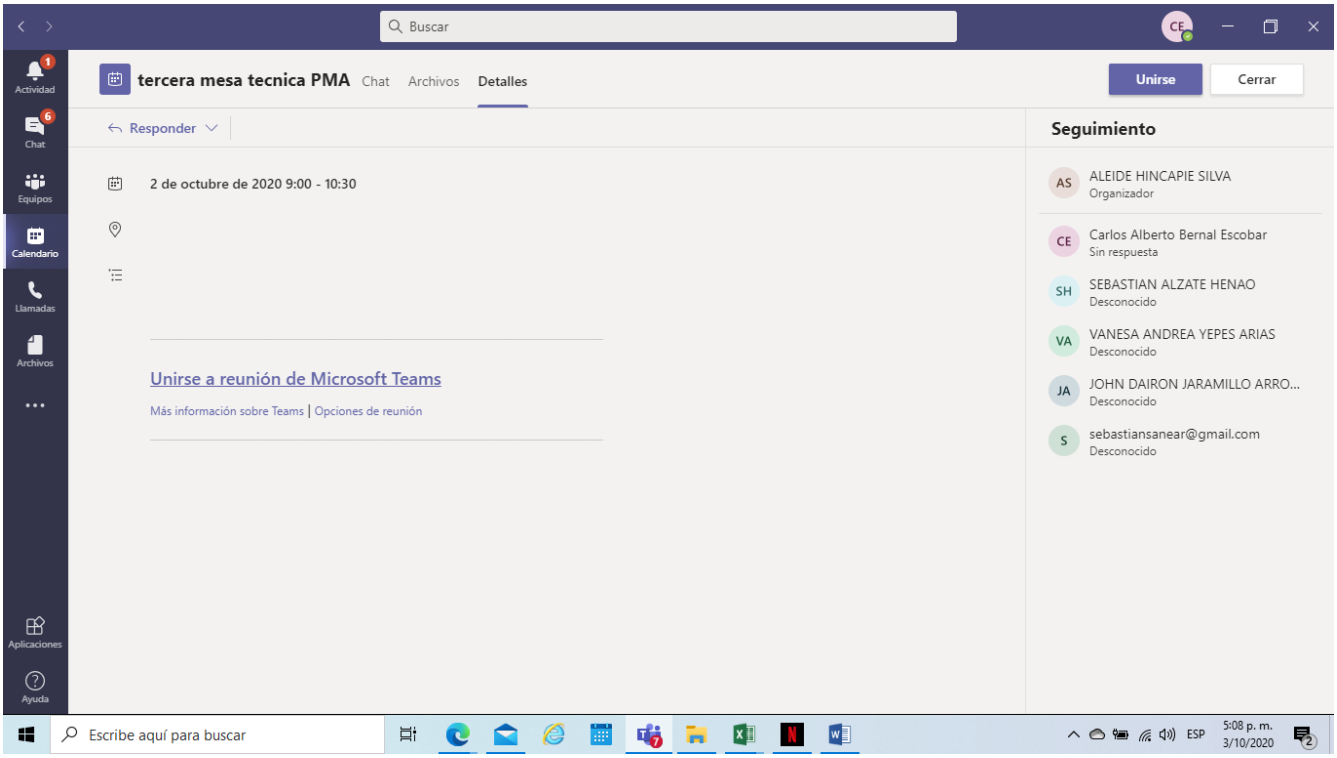
FIRMAS:
Asistencia virtual de todas las personas del numeral ASISTENTES. Se anexa captura de pantalla de la sesión.
Elaboró: Ing. Carlos Bernal Escobar – Contratista MVCT
Fecha: 2 de octubre de 2020.
