ACTA No. 02

FECHA: 11 de febrero de 2021

HORA: De 08:00 a.m. a 8:30 a.m. horas

LUGAR: **Virtual (Microsoft Teams) – Se anexa registra fotográfico.**

ASISTENTES:
1. Bernardo Gil / Equipo técnico Cumare
2. Nuria Leon / Gerente PDA
3. Johan Torres / Apoyo técnico Cumare
4. Bladimir Castro / Apoyo técnico Cumare
5. Luis Alberto Carvajal / Subgerente Técnico Cumare
6. Jan Carlos Consuegra / Apoyo técnico Cumare
6. Lucia Lombana Ortiz / Contratista DP-SDP VASB MVCT

INVITADOS: N.A.

ORDEN DEL DIA:

Mesa de trabajo del proyecto “CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR DEL TACHUELO DEL MUNICIPIO DE PUERTO RONDON, DEPARTAMENTO DE ARAUCA” con radicado 2020ER0101253, en evaluación por etapas.

1. Contextualización
2. Presentación por proyecto por parte del formulador
3. Conclusiones y compromisos

DESARROLLO:

La reunión se realiza a través de canales digitales.

Temas tratados

1. Contextualización

El proyecto “CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR DEL TACHUELO DEL MUNICIPIO DE PUERTO RONDON, DEPARTAMENTO DE ARAUCA”, inicialmente se encontraba asignado al evaluador líder Oscar Gómez. Debido a que el ingeniero salió del MVCT, cambio de evaluador líder a Lucia Lombana, por tal razón se realiza esta mesa técnica para realizar empalme y presentación del proyecto de parte del formulador.

2. Presentación del proyecto

El formulador realiza presentación del proyecto “CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR DEL TACHUELO DEL MUNICIPIO DE PUERTO RONDON, DEPARTAMENTO DE ARAUCA”, resultante de una consultoría.
Localización del proyecto: se ubica en la zona urbana del municipio de Puerto Rondón, la cual es un área de expansión y hace parte del perímetro urbano.
Estado de la zona: Se indica que son vías que están a nivel de afirmado, por tanto, no se contemplan en el proyecto actividades de pavimentación.
Para la proyección de las redes de este sector, se tuvo en cuenta el área de 70,47 Ha para el sector del tachuelo como zona de expansión.
Conexión: El colector se proyecta para conectarse a la red existente que va hacia la planta de tratamiento existente, por lo que se contempla la conexión al sistema de alcantarillado.
Población: La población actual beneficiada es de 160 habitantes.
Alcance del proyecto: se contempla un colector con diámetros en el diseño del sistema de alcantarillado de: 8”, 10” y 12”, 14 pozos de inspección, 32 acometidas y 32 cajas de inspección.
Costo del proyecto: 655.236.704,00
Se muestra plano de proyección del colector y ubicación de los pozos de inspección.

3. Conclusiones y compromisos

Se aclara que el alcance del proyecto solo es el área del Tachuelo, aunque la memoria hidráulica muestre el diseño del colector el paraíso.
Se indica que desde el PDA se cuenta con los recursos para el cierre financiero del proyecto.
Se aclara que el proyecto se encuentra en revisión por etapas, una vez realizada pasa a presentación a comité (Etapa 2) y después según las recomendaciones del comité se define si este pasa a etapa 3.

Compromiso	Responsable	Fecha limite de cumplimiento
Próxima mesa de trabajo	Lucia Lombana	24 de febrero de 2021

FIRMAS:
Se anexa registro fotográfico y lista de asistencia.

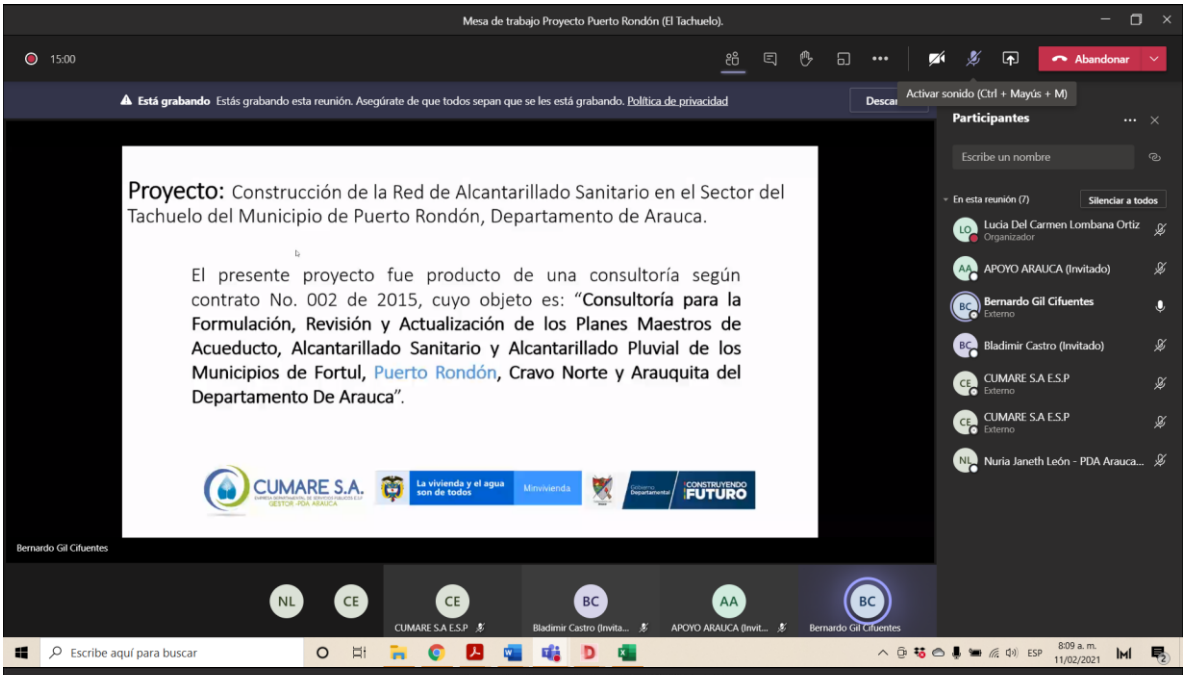

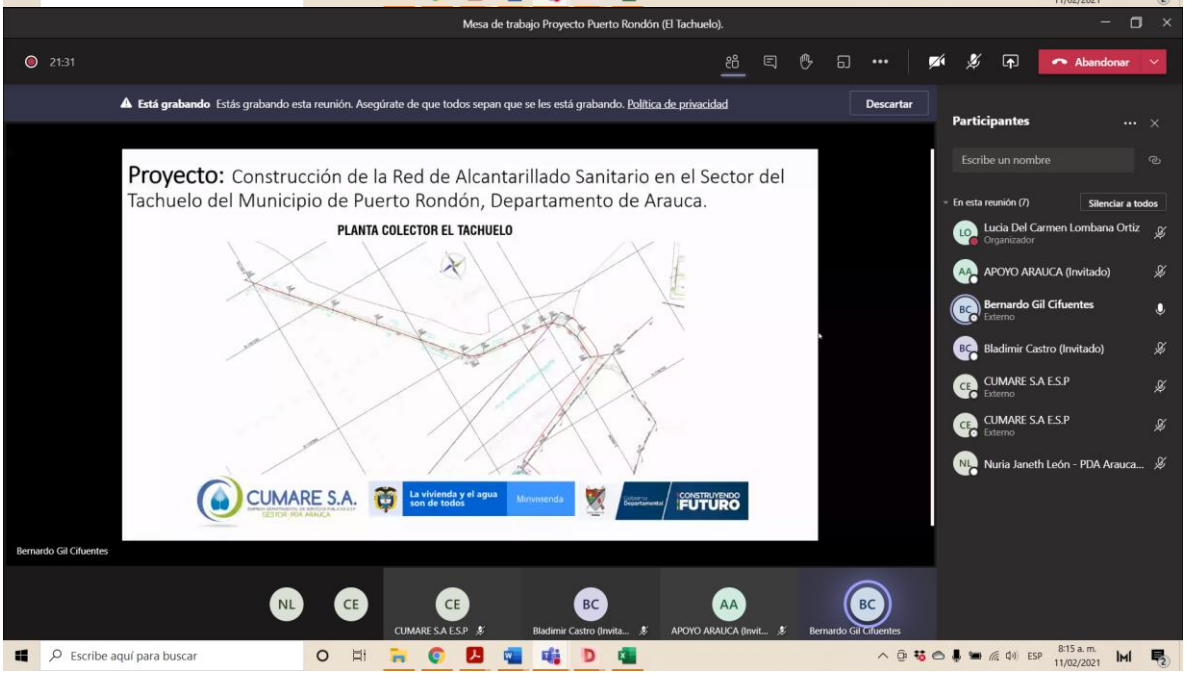

Elaboró: Lucia Lombana Ortiz / Contratista MVCT
Fecha: 11/02/2021
