ACTA No. 08

DATOS GENERALES

FECHA:	27 de julio de 2021
HORA:	De 04:00 a.m. a 04:40 a.m. horas
LUGAR:	**Sesión virtual**
ASISTENTES:	Ing. Clara Lucía Gutiérrez / PDA Caldas Ing. Ana María López / PDA Caldas Ing. Andrés Pimiento / PDA Caldas Einner Taborda /Topógrafo PDA Caldas Santiago Castaño / Topógrafo consultor Ing. Juan Garzón / VASB MVCT Ing. Lucia Lombana Ortiz / VASB MVCT
INVITADOS:	N/A.

ORDEN DEL DIA:

Mesa técnica solicitada por el formulador para hacer seguimiento al estudio topográfico del proyecto; “CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL NEIRA FASE I”.

1. Contextualización
2. Seguimiento estudio topográfico
3. Conclusiones y compromisos.

DESARROLLO:

1. Contextualización

El proyecto “CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL NEIRA FASE I”, que se encuentra en evaluación por requerimientos, en mesa de trabajo anterior la entidad formuladora quedó con el compromiso de entregar estudio topográfico y geotécnico como resultado de un contrato de mínima cuantía, el próximo 08 de agosto del 2021. Debido a lo anterior, en esta mesa de trabajo se hace seguimiento al avance que se ha venido realizando en la topografía del proyecto.

2. Seguimiento a estudio topográfico

El topógrafo Santiago Castaño indica que se hizo un recorrido inicial y se trazaron los mojones requeridos según las recomendaciones dadas por el MVTC. A partir de esto , se construyeron los mojones y se sacaron muestras de suelos y los resultados se encuentran el próximo lunes 02 de agosto del 2021.

Se indica que se construyeron 14 mojones entre la PTAP y el tanque el higuerón en concreto. El ing. Juan recomienda que se tenga en cuenta estas observaciones para estos tipos de levantamientos en futuros proyectos presentados ante el MVCT.

Luego de esto el topógrafo Santiago Castaño procede a presenta el adelanto del trabajo que vienen realizando para el proyecto de Neira Caldas y así poder realizar su revisión.

Con relación a las curas de nivel, se indica que todavía no se tienen y que una vez se tengan los mojones se procederá con estas.

Se revisa tabla de postprocesos y se indica de parte del ing. Juan que esos puntos ya se pueden usar para la topografía. El nivel de confianza que se presenta es de 95% y se indica que esta bien.

Se da aval a que se avance en el tema de la topografía para que se vaya avanzando en el proceso y se recomienda entregar un avance de la información para que el ingeniero Juan Garzón lo vaya revisando.

3. Conclusiones y compromisos

El próximo 30 de julio La ing. Clara del PDA se comunicará con la evaluadora líder con el objeto de revisar la fecha de compromiso de entrega del 8 de agosto del 2021.

Se hará una entrega del adelanto del trabajo del estudio topográfico.

Se resalta que se hará compañía al proceso de parte del MVCT con relación a todos los ajustes que se necesiten y dudas con respecto a la resolución vigente.

La mesa de trabajo se realizó por medio virtuales.

COMPROMISOS

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega de adelanto estudio topográfico	Formulador	30/07/21

FIRMAS:

Nombre completo	Acción del usuario
Lucia Del Carmen Lombana Ortiz	Unido
Clara Lucía Gutiérrez (Invitado)	Unido
Ana M López (Invitado)	Unido
Ing. Andrés Pimiento (Invitado)	Unido
Juan Alejandro Garzón Pitta	Unido
Einner Taborda (Invitado)	Unido
Santiago Castaño (Invitado)	Unido

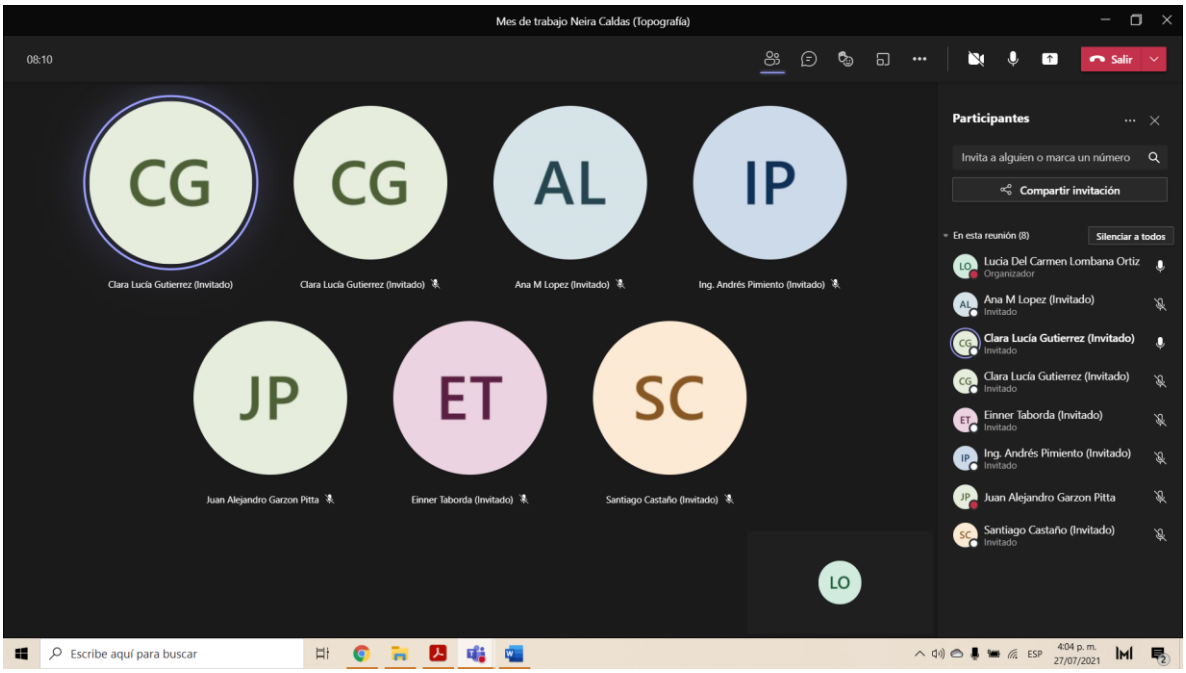

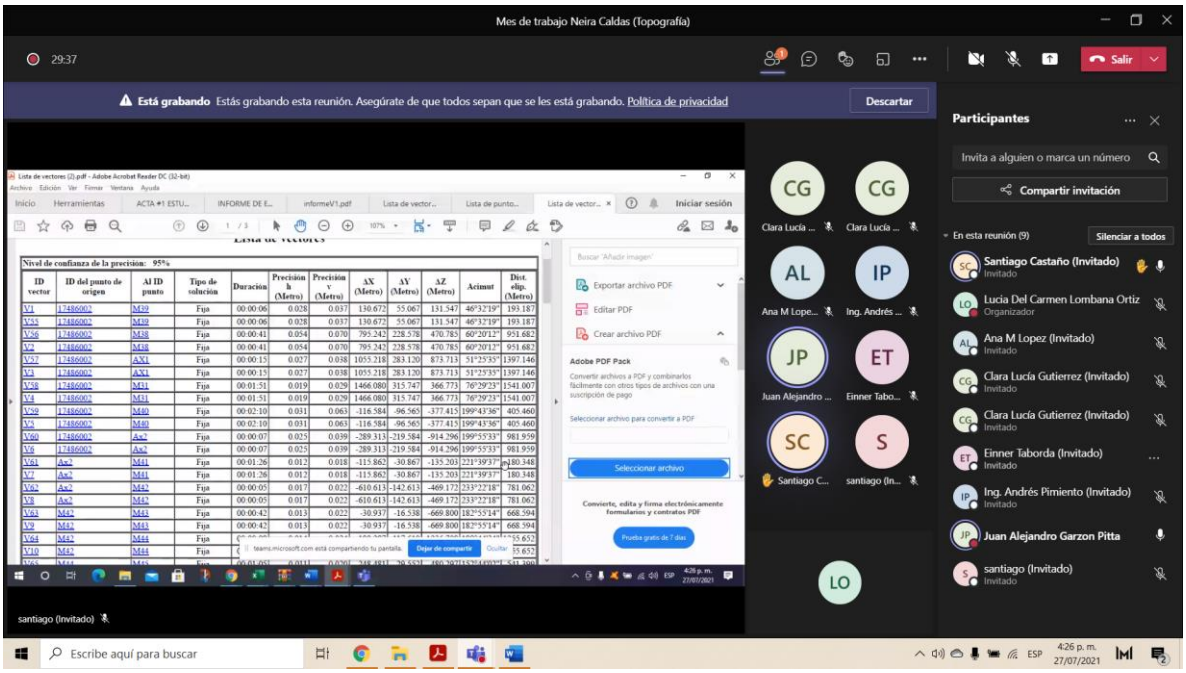

Elaboró: Lucia Lombana Ortiz / Contratista MVCT
Fecha: 27-07-2021
