ACTA No. 01

Proyecto: Optimización y construcción de las redes de aducción del sistema de acueducto del Municipio de Suaita, Santander

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 25 de mayo de 2022
HORA:	De 09:00 a 09:40 am
LUGAR:	**Plataforma Microsoft Teams**
ASISTENTES:	Naty Vanesa Rivero (Especialista geotecnia Minvivienda)
INVITADOS:	Juan Sebastián Ariza Marin – Especialista en Geotecnia ESANT Eder Nieto – Gestor líder ESANT Javier Caballero – Geotecnista Consorcio Interredes Suaita Diego Calderón – Director consultoría Consorcio Interredes Suaita Carlos Paez - Interventoría

ORDEN DEL DIA:

1. Los asistentes en la reunión se identifican y se presentan.
2. La Ing. Naty Rivero expone el estado actual del proyecto y se exponen las observaciones.
3. Se abre espacio de preguntas e inquietudes.
4. Se asignan compromisos y pasos a seguir. Se da fin a la reunión.

DESARROLLO:

1. Se presentan los asistentes de la reunión por parte del Ministerio y del Formulador.
2. Se inicia la reunión aclarando que fue realizada como seguimiento al proceso de evaluación del proyecto en el MVCT. La ing. Naty Rivero informa que las subsanaciones fueron recibidas el día 21 de mayo de 2022, se informa que de esas subsanaciones se tienen dudas y comentarios para aclarar y resolver.
3. La Ing. Naty Rivero comparte pantalla donde se encuentran cada una de las observaciones que quedan pendientes, se leen y se socializan con el geotecnista por parte del formulador y se da asistencia técnica para orientar al formulador a resolverlas. Al final se hace un resumen de los puntos mas importantes y se abre otro espacio de dudas, se aclara que, en el caso de subsanar las observaciones pendientes, se podría dar el visto bueno de geotecnia.
4. El Ing. Juan Sebastián Ariza manifiesta que la nueva versión del informe sería enviada el viernes 27 de mayo para ser revisada. La Ing Naty Rivero resalta que queda atenta a la documentación y precisa lo prioritario del proyecto.
5. Al no haber más dudas por parte de los asistentes, se da fin a la reunión.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Enviar la nueva versión del informe geotécnico	Geotecnista - Formulador	27 de mayo

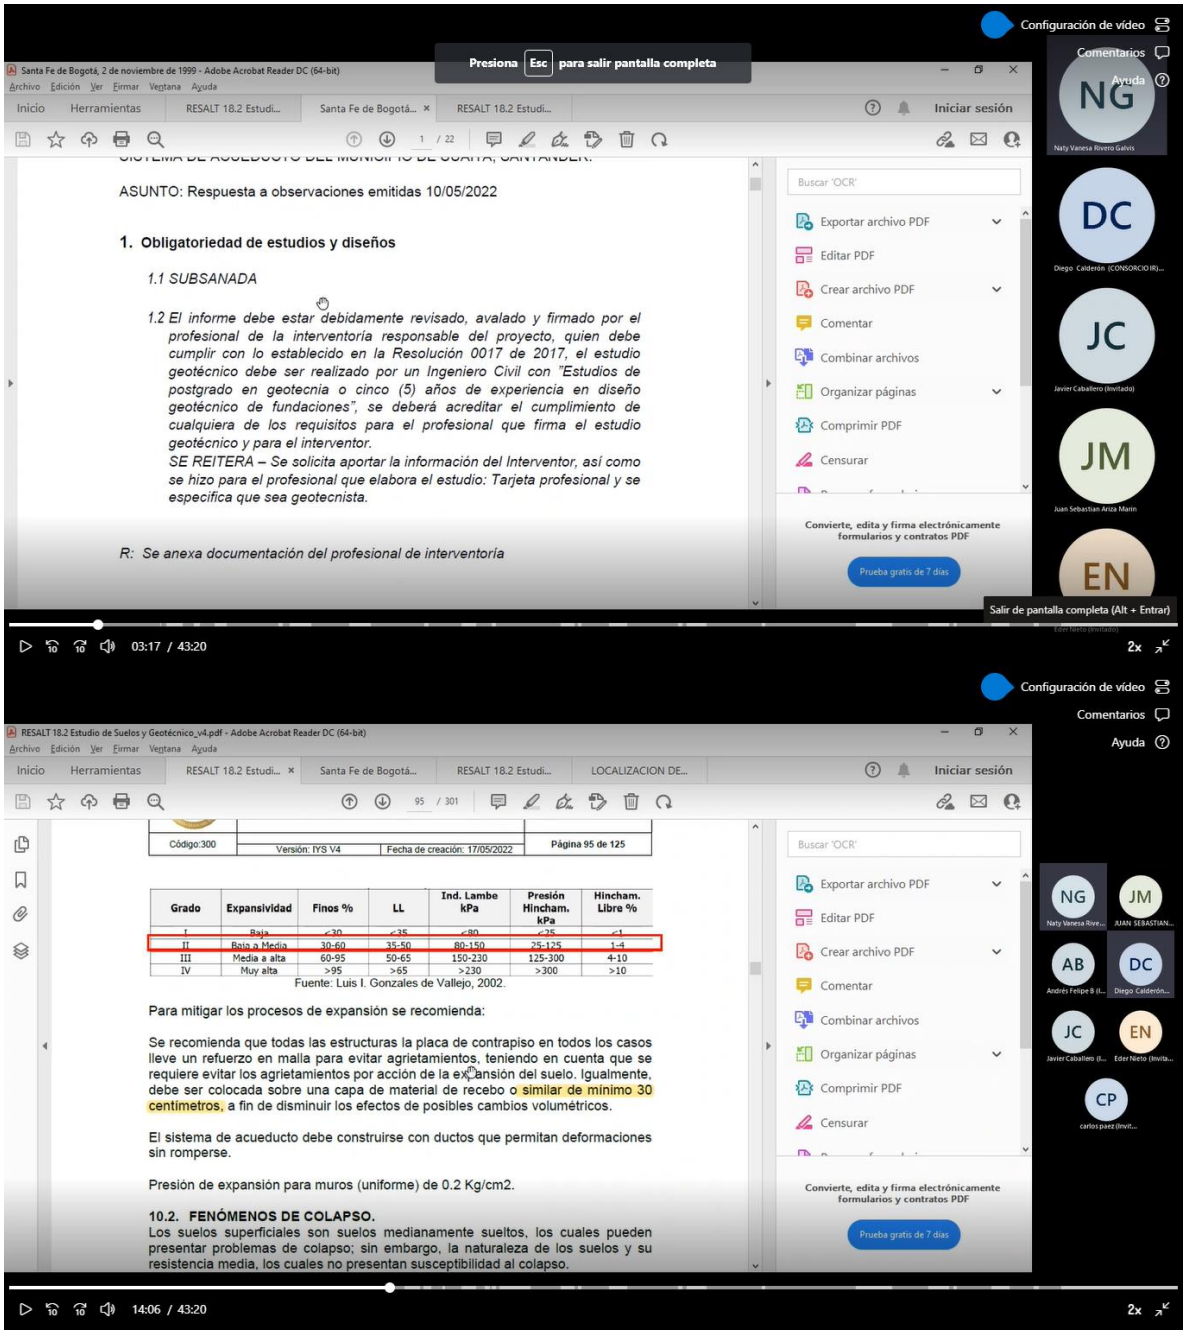

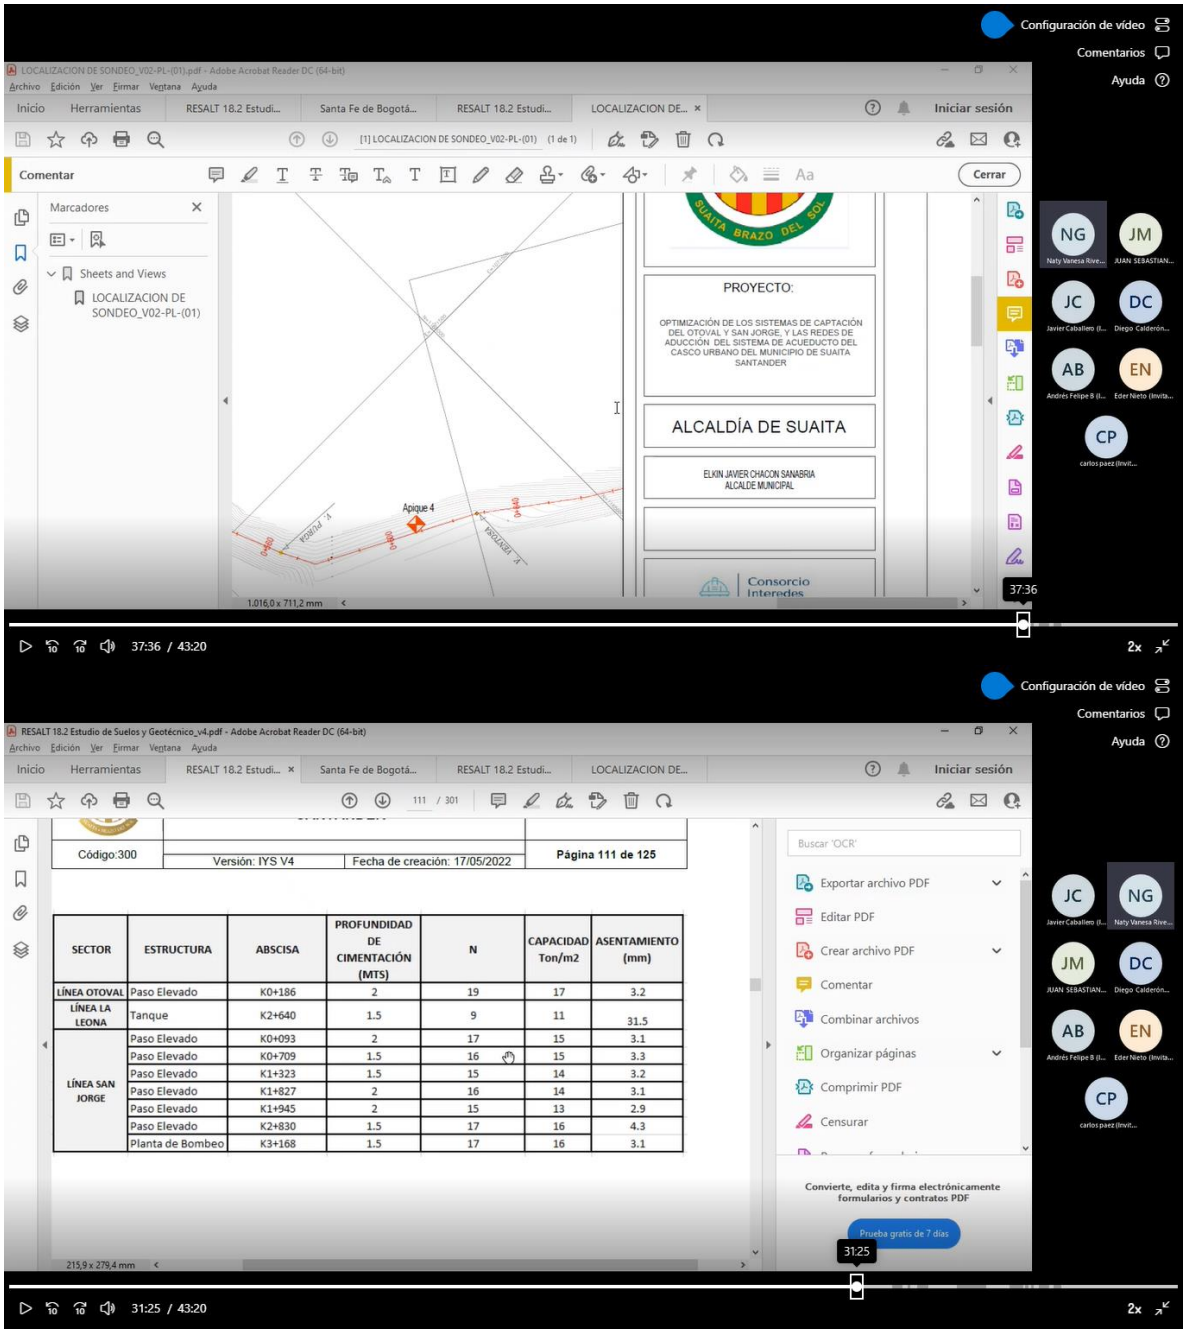

SECTOR	ESTRUCTURA	ABSCISA	PROFUNDIDAD DE CIMENTACIÓN (MTS)	N	CAPACIDAD Ton/m2	ASENTAMIENTO (mm)
LÍNEA OTOVAL	Paso Elevado	K0+186	2	19	17	3.2
LÍNEA LA LEONA	Tanque	K2+640	1.5	9	11	31.5
LÍNEA SAN JORGE	Paso Elevado	K0+093	2	17	15	3.1
	Paso Elevado	K0+709	1.5	16	15	3.3
	Paso Elevado	K1+323	1.5	15	14	3.2
	Paso Elevado	K1+827	2	16	14	3.1
	Paso Elevado	K1+945	2	15	13	2.9
	Paso Elevado	K2+830	1.5	17	16	4.3
	Planta de Bombeo	K3+168	1.5	17	16	3.1

FIRMAS:
Elaboró: Naty Vanesa Rivero Galvis
Fecha: 31-05-2022
