Comisión o Autorización: **Interior** [X] **Exterior** [ ]

Nombre del funcionario o Contratista:

KAREN JOHANA VERGARA PAZOS

Fechas de Comisión o Autorización:	**Inicio**			**Final**		
	10	3	2023	10	3	2023

Ruta de Desplazamiento aérea
Bogotá – Montería- Sincelejo-Montería – Bogotá

Objeto de la Comisión o Autorización de desplazamiento y permanencia:

VISITA TÉCNICA AL PDA SUCRE Y A OBRA " RELLENO SANITARIO REGIONAL SAN JORGE" PARA SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN Y ESTADO ACTUAL

Temas de la Agenda:

1. Visita al sitio de la obra relleno sanitario San Jorge – municipio de Caimito.
2. Estado de ejecución ajuste a diseños proyecto relleno sanitario Mojana.

Desarrollo y temas abordado:

1. Visita al sitio de la obra

Se realiza el desplazamiento hacia el sitio donde se ejecuta la obra, localizado específicamente sobre la vía que conduce desde el municipio de San Marcos a la vereda Las Tablitas, aproximadamente a 10 min del municipio de San Marcos en jurisdicción del municipio de Caimitos – Sucre.

En el sitio, se puedo evidenciar el inicio de las obras - movimientos de tierras con maquinaria pesada, se informó por parte de la interventoría de obra que el acta de inicio tuvo lugar el día 26 de octubre de 2022, tiempo en el cual se pudo realizar la socialización del proyecto con la comunidad aledaña al sitio quien manifestó rechazo a la ejecución del proyecto.

Posteriormente, dado el bloqueo presentado por la comunidad para acceder al sitio con la quema de la valla publicitaria, se procedió a suspender la ejecución de la obra el 1 de diciembre

de 2022 con fecha de reinicio del 10 de enero de 2023, sin embargo, la comunidad procedió con el desmonte del campamento instalado en la obra, razón por la cual se procedió con la ampliación a la suspensión hasta el 24 de enero de 2023, fecha en la cual se reiniciaron y pudo ingresar la maquinaria y los equipos para la ejecución de las actividades de localización y replanteo. Sin embargo, la comunidad continuó bloqueando el acceso al sitio para lo cual el PDA, municipio y Gobernación lograron concertar con estas obras de compensación (sistema de acueducto para el corregimiento Las tablitas), razón por la cual los movimientos de tierra y actividades de excavación en el sitio iniciaron el 21 de febrero de 2023.

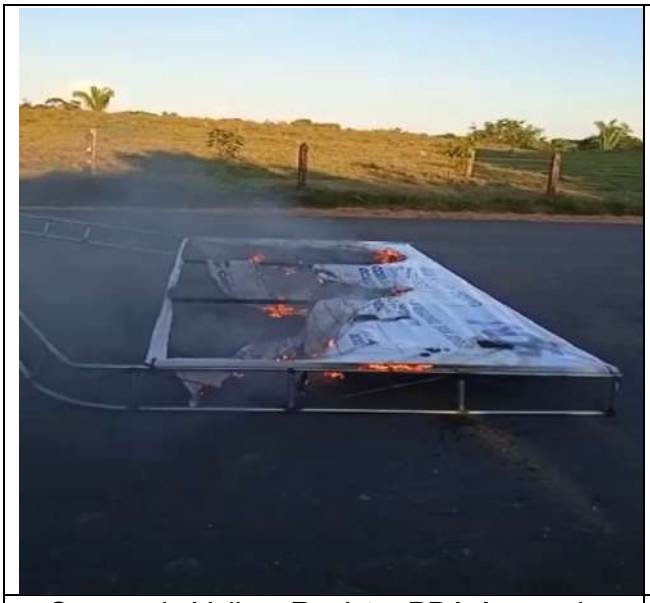	
Quema de Valla – Registro PDA Aguas de Sucre -25 de noviembre de 2022	Desmonte de campamento por parte de la comunidad el 15 de febrero de 2023

Durante la visita, se puedo evidenciar la realización de los movimientos de tierra en el sitio, llamando la atención la presencia de residuos sólidos dispuestos, lo que se presume que en el predio se realizaron actividades de disposición final, dicha información sin ser reportada en el proyecto inicialmente viabilizado.

Movimiento de tierra y presencia de residuos sólidos dispuestos en el sitio

Se informa por parte del contratista, que el área intervenida con la obra corresponde a la etapa N°1 del proyecto, la cual contará con una vida útil de 12 años, de igual forma, se ejecutarán obras relacionadas con el cierre perimetral, casetas administrativas y de bombeo, lagunas de tratamiento de lixiviados, pozo séptico para aguas residuales y suministro de agua potable, sistema fotovoltaico para energía en el sitio y suministro e instalación de báscula.

Se realizó recorrido por lo que sería la vía de acceso al sitio, sobre la cual se informó por parte del contratista que esta cuenta con un trazado por el lindero del predio, tal como se adquirió la servidumbre, sin embargo, se deben hacer adecuaciones con movimientos tierra e instalación de box coulver para el drenaje de aguas lluvias de escorrentía.

Vía interna al relleno sanitario

Tramo para adecuación de vía de acceso

Con los retrasos en ejecución, a la fecha de la visita aún no se cuenta con informe de interventoría que reporte el avance. Dicho informe se espera sea entregado al PDA el 15 de marzo de 2023. El plazo de ejecución de la obra es de 6 meses, los cuales conforme al acta de reinicio sería hasta el 20 de junio de 2023.

Plano de localización de excavaciones Etapa N°1 del relleno sanitario.

Con relación al componente de aseguramiento, se consultó vía telefónica con el profesional encargado del PDA de Sucre, quien informó que se estaba a la espera de dar solución a los inconvenientes presentados con la comunidad para proceder con la ejecución de la obra y posterior contratación del componente de aseguramiento, es por esto se espera que el lunes 13 de marzo de 2023 se proceda con la publicación de los pliegos para su contratación.

2. Estado de ejecución ajuste a diseños proyecto relleno sanitario Mojana.

Como parte del proceso que este Ministerio realiza en el marco de las asistencias técnicas al PDA de Sucre, y adquirido el compromiso de financiación del proyecto Relleno Sanitario Regional Mojana, el cual beneficiaría a los municipios de Majagual, Guaranda y Achí del departamento de Bolívar, se le informó al PDA de Sucre las nuevas directrices del gobierno nacional frente a la cofinanciación de proyecto para la gestión de residuos sólidos, los cuales deben estar acompañados de alternativas de tratamiento y/o aprovechamiento en el marco de la prestación del servicio público de aseo.

Por parte del PDA, se informa que dicho proyecto de relleno sanitario regional no cuenta con estas alternativas, toda vez que el proyecto fue concebido para eliminar la disposición final inadecuada en estos 3 municipios, quienes actualmente cuenta con botadero a cielo abierto; sin

embargo, actualmente se adelanta por parte del PDA la actualización del PGIRS del municipio de Majagual, municipio que se considera sería el mayor generador de residuos del regional.

El proyecto, se encuentra en proceso de estudio de impacto ambiental y de adquisición del predio donde se implantará. Es así que, con la actualización del PGIRS, se evaluará la alternativa de la viabilidad de las actividades de aprovechamiento y tratamiento de los residuos sólidos.

Para el caso específico de Majagual, se realizó recorrido al botadero a cielo abierto y se puedo evidencia que en este hay presencia de recicladores y se realiza la quema de los residuos.

Llama la atención además que los recicladores solo recuperan en el sitio chatarra y metales, razón por la cual se consultó con este quien informó que en el municipio solo existe una chatarrería que compra este tipo de materiales y que en el municipio no se realiza el reciclaje de botella pet, papel, cartón porque no hay quien lo compre.

Durante el recorrido, se llegó a la chatarrería del Señor Raúl, quien informó que el no realiza compra de otros materiales porque no cuenta con la infraestructura para ellos, como tampoco de equipos de prensa y compactadora, maquinas que facilitan el aprovechamiento y comercialización de estos materiales.

Se informó además por parte del señor Raúl que compra chatarra proveniente de los municipio de Guaranda y Achi, dada la cercanía a estos municipios.

Como resultado de la visita, este Ministerio solicitó al PDA evaluar la alternativa de incluir o no las actividades de aprovechamiento y/o tratamiento en el proyecto, recordando lo establecido en los Decretos 596 de 2016 y 1784 de 2017.

Compromisos:

1. Remitir por parte de PDA las actas de socialización del proyecto y de concertación con la comunidad. Semana del 13 de marzo.
2. Remitir informe de interventoría de obra y/o de supervisión de obra. 15 de marzo.
3. Realizar la sustitución de la valla en el sitio y proceder a su pronta instalación toda vez que fueron solucionados por inconvenientes con la comunidad.
4. Instalación del campamento en el sitio de la obra.

Karen J. Vergara Pazos
C.C. 1.067.838.107

Lista de asistencia.

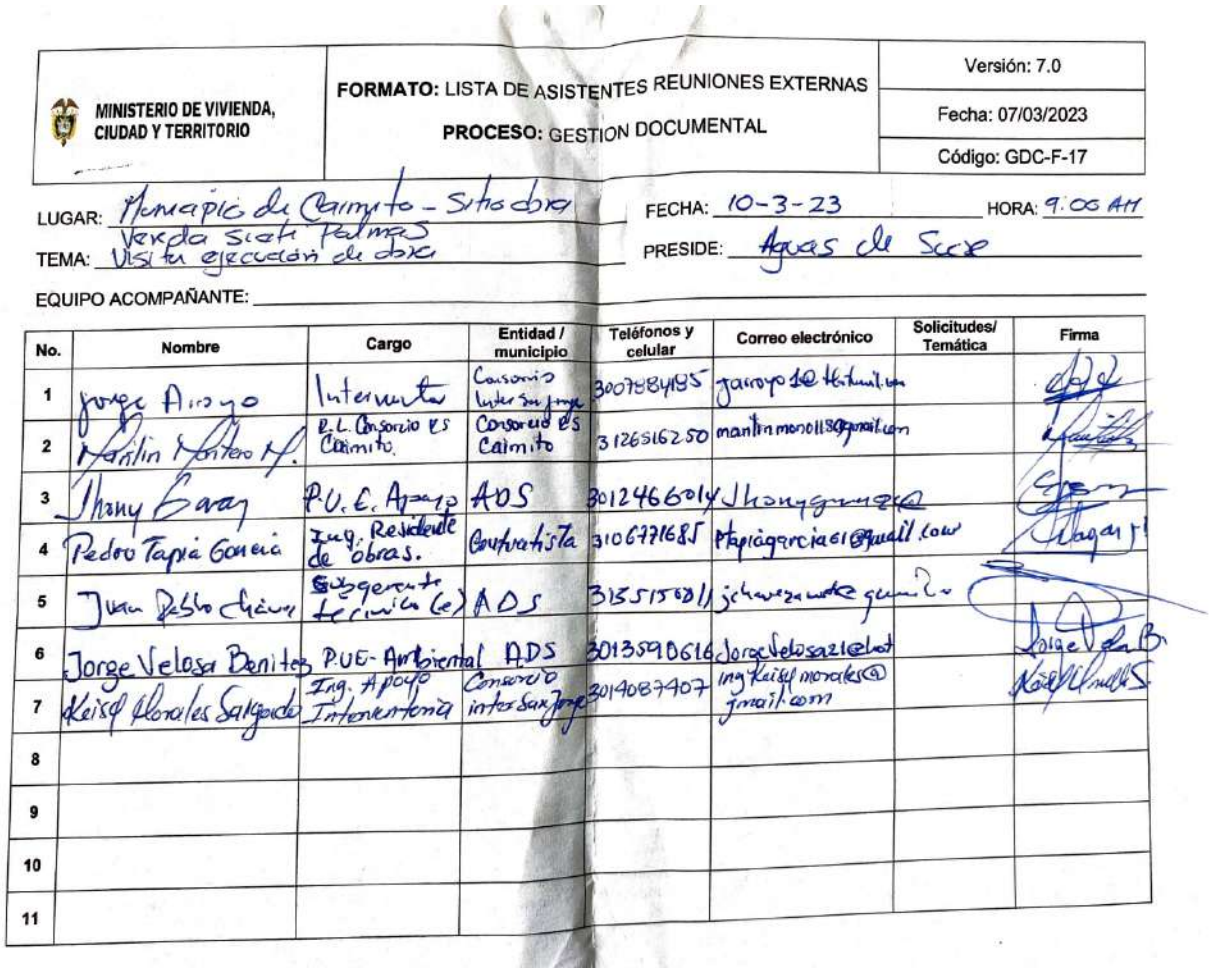

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	**FORMATO:** LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS **PROCESO:** GESTION DOCUMENTAL	Versión: 7.0 Fecha: 07/03/2023 Código: GDC-F-17

LUGAR: Municipio de Caimito - Sitio obra Verda Sitio Palmas — FECHA: 10-3-23 — HORA: 9:00 AM

TEMA: Visita ejecución de obra — PRESIDE: Aguas de Sucre

EQUIPO ACOMPAÑANTE:

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Jorge Arroyo	Interventor	Consorcio Interventoría Jorge	3007884185	jarroyo10@hotmail.com		
2	Martin Montero M.	P.L. Consorcio ES Caimito	Consorcio ES Caimito	3126516250	martinmonoll30@gmail.com		
3	Jhany Garay	P.U.E. Ambiental	ADS	3012466014	Jhanygarnero@		
4	Pedro Tapia Garcia	Ing. Residente de obras.	Contratista	3106771685	Ptapiagarcia61@gmail.com		
5	Juan Pablo Chávez	Subgerente técnica (e)	ADS	3135156011	jchavezamaka@gmail.com		
6	Jorge Velosa Benitez	P.U.E- Ambiental	ADS	3013590616	JorgeVelosaz1@hot		
7	Keisy Morales Salgado	Ing. Apoyo Interventoría	Consorcio interSanJorge	3014087407	ingkeisymorales@gmail.com		
8							
9							
10							
11							
