La vivienda y el agua son de todos · Minvivienda	FORMATO DE CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO **PROCESO:** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Versión: 1.0 Fecha: 14/03/2022 Código: GRF-F-59

FECHA		**N° DE COMISIÓN**		**N° DE COMISIÓN SIIF**	

NOMBRE DEL FUNCIONARIO O CONTRATISTA:	Braulio Cano Burgos
TIPO DE VINCULACIÓN:	Contratista
DEPENDENCIA:	Dirección de Política y Regulación

DE MANERA ATENTA INFORMO QUE CUMPLÍ CON LA COMISIÓN O DESPLAZAMIENTO ASIGNADA EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

COMISIÓN/ AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO	**INTERIOR**	**X**	**EXTERIOR**	

RUTA Y FECHAS DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO:

DESDE			**HASTA**			**RUTA**
DD	**MM**	**AA**	**DD**	**MM**	**AA**	
24	04	2023	25	04	2023	Bogotá D.C.- Bogotá – Córdoba – Montería – Sucre – San Benito Abad – Córdoba – Montería – Bogotá D.C. – Bogotá

OBJETO DE LA COMISIÓN Y/O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO

Asesoría técnica para la reformulación y optimización de proyectos de agua y saneamiento básico, emergencia ola invernal 2023

INFORME DE COMISIÓN Y/O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO

Desarrollo o reseña de los principales temas abordados:
Asistentes

Nombre	**Entidad**
Jhon Sánchez	Secretario de planeación San Benito Adab
Carlos Hugo Montoya	Gerente técnico ADS
Hernando Montes,	Profesional tecnico de ADS
José Urzola	Consultor
Jineth Rodriguez	Secretaría de planeación departamental
Pedro Pablo Villegas	Profesional Técnico MVCT
Aníbal Olmos	Consultor
Braulio Cano Burgos	Profesional Técnico MVCT

Dia 1: 24 de abril de 2023

Se realiza desplazamiento desde el municipio de San Benito Ada hasta el corregimiento de Santiago Apóstol, ingresamos por el costamos Suroeste donde se revisa la estructura de almacenamiento del tanque de 700 litros, de ahí nos dirigimos al pozo que actualmente abastece al corregimiento. Se escuchó a los líderes, quienes manifestaron que necesitan de manera urgente un nuevo pozo para satisfacer la demanda de agua. El pozo actual es insuficiente y el servicio se presta cada 6 días a los diferentes sectores en que se encuentra dividido el centro poblado Santiago Aposto el caudal de abastecimiento es de 3.5 l/s, el cual es intermitente dada las condiciones de falta de mantenimiento y en momentos por problemas de inundación por la ciénaga de Santiago, A continuación, se muestran el registro fotográfico del pozo que actualmente abastece el corregimiento.

Latitud 9° 0'11.99"N Longitud 74°55'1.11"O

Latitud 9° 0'12.52"NLongitud 74°55'1.05"O

Fotografía 1. Pozo de abastecimiento – cercanías con la ciénaga de Santiago.

Se visitó el pozo profundo construido INGEOMINAS en el año 1998, con el fin de establecer el abastecimiento para un sector del corregimiento cuyo caudal es de 3.5 l/s, insuficientes para satisfacer la demanda del corregimiento y el pozo No 3, perforado en el año 1998 y que hoy está abandonado por su baja producción (este pozo tiene una profundidad aproximada de 120 m).

Latitud 9° 0'21.25"N Longitud 74°54'47.52"O
Fotografía 2. Pozo de exploración por el ingeominas año 1998

Igualmente se realizó un recorrido por algunas viviendas del corregimiento donde se identificó la construcción de pozos de entre 20 y 30 metros de profundidad y 2 pulgadas de diámetros. Estos pozos son construidos con taladro mecánico, sin el correspondiente empaque de grava y sello sanitario, por lo que son susceptible de contaminación proveniente de la superficie y por aguas residuales domésticas provenientes de los pozos sépticos con los que cuentan las viviendas. De acuerdo a cifras de la comunidad en el corregimiento existen alrededor de 200 pozos de este tipo, cuyo valor oscila entre los $ 800.000 y $ 1.000.000.

Fotografía 3. Pozo 3. Pozos utilizados por la comunidad para satisfacer la demanda de agua

Por último, se realizó visita al sitio donde fueron realizados los Sondeos Eléctricos Verticales, esperando encontrar pozos profundo (entre los 80 y 120 metros de profundidad) que permitieran esclarecer las dudas sobre la capacidad del acuífero en el punto establecido para perforar el nuevo pozo, sin embargo los pozos encontrados no superan los 30 metros.

Dia 2: 25 de abril de 2023

Se realizó reunión técnica en las instalaciones de Aguas de Sucre, con la participación del secretario de: Jhon Sánchez, planeación del municipio de San Benito Abad; Carlos Hugo Montoya, gerente técnico de ADS; Hernando Montes, ADS; José Urzola, Consultor; Jineth Rodriguez, Secretaría de planeación departamental y el ingeniero Aníbal Olmos, constructor de pozos.

Durante el desarrollo de la reunión, el ingeniero Aníbal Olmos realizó un recuento del contexto histórico del abastecimiento de agua del corregimiento de Santiago Apóstol y finalmente concluye que el sitio donde recomienda construir el nuevo pozo no es el mejor y la mesa de trabajo concluye la necesidad de realizar dos SEV adicionales y reinterpretar la información existente con la finalidad determinar el mejor sitio para perforar.

ADS se compromete con los recursos realizar la contratación lo más pronto posible.

Oficinas del ADS

Conclusiones y recomendaciones:

Realización de dos SEV adicionales y reinterpretación de la información existente con la finalidad de establecer el mejor sitio para construir el nuevo pozo

ADS se compromete a aportar los recursos y contratación el complemento de la información hidrogeológica.

EL PRESENTE DOCUMENTO SE FIRMA POR LAS PARTES EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD			
JEFE INMEDIATO / SUPERVISOR DEL CONTRATO		**FUNCIONARIO O CONTRATISTA**	
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	Natalia Duarte Cáceres	**NOMBRE**	Braulio Cano Burgos

ANEXOS	
PASABORDOS	X
SOPORTES DE GASTOS DE VIAJE (SI APLICA)	X
OTROS ANEXOS (SI APLICA)	

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link:https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/gti-plt-01-politica-de-tratamiento-y-proteccion-de-datos-personales-2.0.pdf

Listados de asistencia

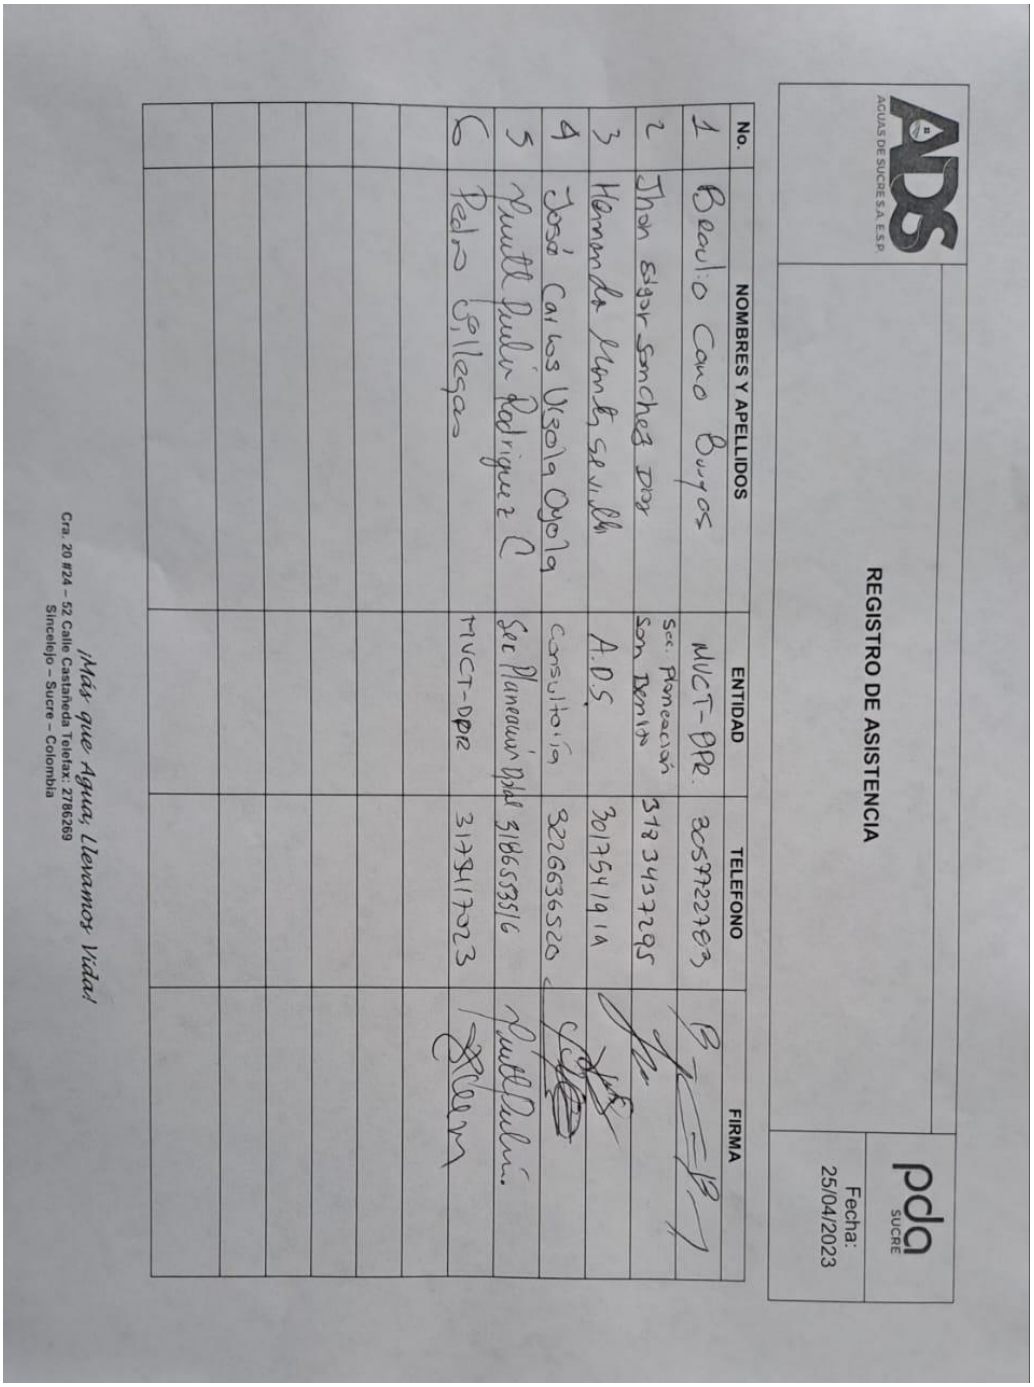

ADS AGUAS DE SUCRE S.A. E.S.P.

REGISTRO DE ASISTENCIA

pda SUCRE

Fecha: 25/04/2023

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD	TELEFONO	FIRMA
1	Paulo Cano Burgos	MVCT-DPR.	3057722463	
2	Jhon Edgar Sanchez Paz	Sec. Planeación San Benito	318 3437295	
3	Hernando Pinto Segura	A.D.S.	3017541918	
4	José Carlos Urzola Oyola	Consultoría	3226636520	
5	Paula Julia Rodriguez C	Sec Planeación Dpto	3186533516	
6	Pedro Grillesas	MVCT-DPR	3129417023	

¡Más que Agua, Llevamos Vida!

Cra. 20 #24 – 52 Calle Castañeda Telefax: 2786269
Sincelejo – Sucre – Colombia
