La vivienda y el agua son de todos · Minvivienda	FORMATO DE CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO **PROCESO:** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Versión: 1.0 Fecha: 14/03/2022 Código: GRF-F-59

FECHA	17/05/2023	**N° DE COMISIÓN**	845	**N° DE COMISIÓN SIIF**	

NOMBRE DEL FUNCIONARIO O CONTRATISTA:	SANDRA PAOLA JAVELA JAVELA
TIPO DE VINCULACIÓN:	Funcionario
DEPENDENCIA:	Subdirección de Programas

DE MANERA ATENTA INFORMO QUE CUMPLÍ CON LA COMISIÓN O DESPLAZAMIENTO ASIGNADA EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

COMISIÓN/ AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO	**INTERIOR**	**X**	**EXTERIOR**	

RUTA Y FECHAS DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO:

DESDE			**HASTA**			**RUTA**
DD	**MM**	**AA**	**DD**	**MM**	**AA**	
12	05	2023	12	05	2023	Bogotá – Cartagena – Bogotá

OBJETO DE LA COMISIÓN Y/O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO

BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA AL EQUIPO GESTOR DEL PDA BOLÍVAR PARA EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PEI CAPÍTULO 2023, EN CADA UNO DE SUS COMPONENTES.

INFORME DE COMISIÓN Y/O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO

Desarrollo o reseña de los principales temas abordados:

1. Presentación del Grupo Gestor a la Líder PDA MVCT

Se inicia la reunión con la presentación de la nueva líder PDA por parte del MVCT, Ing. Paola Javela. Por parte del Gestor, se presenta el equipo de profesionales, indicando el enlace de cada uno de los componentes o áreas que se manejan dentro de Aguas de Bolívar.

Eduardo Pombo – Subgerente administrativo y financiero
Gonzalo Posada – Jefe Comunicaciones y gestión social
Lucia Bray Bohórquez – Subgerente de aseguramiento.
Aura Coneo – Área técnica

Diana Oviedo – Área técnica
Anastacio Marrugo García – Asesor Gerencia
Roberto Guardela – Jefe área Planeación
Aura Garcia – Líder componente ambiental

2. Estado actual del PEI 2020-2023

2.1. Componente social

El Plan de gestión social tiene concepto favorable de fecha 10 de marzo de 2023 emitido por la Subdirección de Desarrollo Empresarial y se asignaron los recursos para este componente en Comité Directivo No.55 de 31 de marzo de 2023. A la fecha el avance de ejecución de este Plan es del del 4%.

En el acta de asistencia técnica se listan las actividades de cada línea y su avance de ejecución a la fecha.

2.2. Componente de inversión

- Procesos contractuales

El Gestor realiza la presentación de los procesos de contratación que tiene en curso, de la vigencia 2022, tienen 4 procesos licitatorios, 5 procesos para interventoría, 2 consultorías, 1 proceso de mínima cuantía. De los proyectos de vigencia 2023, están adelantando un proceso de licitación pública.

- Proyectos en ejecución

ALCANTARILLADOS							
MUNICIPIO	**VALOR millones de $**	**FUENTE DE RECURSOS**	**AVANCE FÍSICO**	**AVANCE FINANCIERO**	**ESTADO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**POB. BENEFICIADA**
EL CARMEN	81.307	• CONTRATO PLAN MONTES DE MARIA	99,65%	95,00%	En ejecución	31-08-2023	56.209
MOMPOX	65.751	• CREDT. SGP DPTO. • NACIÓN.	98,96%	98,12% ADB 90,20%	En ejecución	24-05-2023	26.137
SAN JUAN	25.172	• NACIÓN (Prog. Reac. Económica) • SGP DPTO.	7,99%	5,44%	Suspendido	28-08-2023	12.546
SAN ESTANISLAO	27.659		11,52%	9,01%	En ejecución	08-09-2024	12.791
CALAMAR	22.486		11,58%	5,26%	En ejecución	29-03-2024	16.256
SAN CRISTÓBAL	1.033	• SGP DPTO.	42,74%	27,92%	En ejecución	09-08-2023	3.700
CLEMENCIA Sector La Candelaria	971	• SGP DPTO.	0,00%	0,00%	CONTRATADO-POR INICIAR	CONTRATADO-POR INICIAR	575
EL CARMEN INTRADOMICILIARIA	6.882	•NACION (PGN 2021)	72,53%	N/A	En ejecución	31-07-2023	784 viviendas iniciales

ACUEDUCTOS RURALES								
MUNICIPIO	**VALOR millones de $**	**PROYECTO**	**FUENTE DE RECURSOS**	**AVANCE FÍSICO**	**AVANCE FINANCIERO**	**ESTADO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**POB. BENEFICIADA**
MAGANGUÉ	$ 1.607	Construcción sistema abastecimiento de agua en **Isla Grande**	SGP DPTO. AP SB	13,27%	12,45%	En ejecución	7-12-2023	1.715
	$ 2.242	Construcción sistema abastecimiento de agua en **Tacasaluma**						1.164
	$ 2.290	Construcción sistema abastecimiento de agua en **San Sebastián de Buenavista.**						813
EL GUAMO	$ 7.153	Acueducto Regional **Nervití - Tasajera**		0,00%	0,00%	En ejecución	12-01-2024	2.196

- Estado CDR´s recursos nación – audiencias públicas

NUMERO DE CDR	ACTA	FECHA EXPEDICION CDR	VALOR POR FUENTE	DESCRIPCION DEL CDR	ESTADO ACTUAL
1	6	5-nov-09	$ 17.037.487.742	Construcción y ampliación de la conducción en el tramo Gambote - Corralito (Arjona), optimización de la línea de conducción del acueducto del municipio de San Juan Nepomuceno, optimización del sistema de acueducto del municipio de San Pablo. (sin incluir sistema de tratamiento).	Proyectos terminados y entregados.
5	6	1-ene-10	$ 5.348.122.083	CDR Gerencia asesora e interventoría.	El contrato de la Gerencia Asesora tuvo un plazo final 34 meses Contrato finalizado y liquidado. La interventoría está en proceso de liquidación.
31	14	17-nov-11	$ 4.486.094.087	Construcción, ampliación, optimización y rehabilitación del sistema de acueducto de la cabecera municipal de Santa Rosa del Sur, etapa No 1.	Ejecución: 100% y liquidado. No entregado al municipio.
37	16	26-abr-12	$ 7.284.584.553	Ampliación, optimización, y o rehabilitación del sistema de acueducto de la cabecera municipal de Arenal del Sur.	Proyecto Entregado: 23-06-2015
39	17	9-oct-12	$ 383.821.767	Formulación del plan maestro de alcantarillado de los municipios de Achí, Montecristo y Tiquisio.	Ejecución: 100%
44	18	23-nov-12	$ 5.068.662.487	Construcción, ampliación y/o rehabilitación del sistema de acueducto de la cabecera municipal de rio Viejo.	Entregado en fecha: 10-12-2014
45	18	23-nov-12	$ 906.595.739	Construcción, ampliación y/o rehabilitación del sistema de acueducto de la cabecera municipal del municipio de Cicuco.	Entregado en fecha: 30-10-2014
57	7320-2-64883	2-sep-13	$ 1.396.702.315	Construcción, ampliación, optimización y/o rehabilitación del sistema de acueducto de la cabecera municipal de santa cruz de Mompox, Bolívar, fase I.	Proyecto liquidado y entregado al municipio.

59	7323-2-78256	2-sep-13	$ 2.196.550.525	Construcción, ampliación, optimización y/o rehabilitación del sistema de acueducto de la cabecera municipal del municipio de Achi.	Proyecto entregado en fecha: 03-06-2015
58	7323-2-76811	3-sep-13	$ 1.584.988.299	Construcción, ampliación y/o rehabilitación del sistema de acueducto de la cabecera municipal del municipio de Pinillos.	Proyecto Ejecutado
68	22	8-sep-14	$ 180.000.000	Complementación de estudios y diseños del proyecto de construcción de la PTAP de 400 lps y suministro e instalación de bomba de reserva en la estación Gambote (FINDETER).	Ejecutado por Findeter.
74	2014EE0067559	9-sep-14	$ 1.584.412.056	Construcción, ampliación, optimización y/o rehabilitación del sistema de acueducto de la cabecera municipal de Norosi.	Liquidado y entregado
77	2014EE0076245	8-oct-14	$ 49.935.972	Interventoría a la reformulación proyecto optimización, construcción y/o ampliación sistemas de acueducto municipio de Magangué.	El Proyecto de Obra fue contratado por FINDETER (PAF-ATF-051-2013). Terminado
. 78	2014EE0076245	8-oct-14	$ 624.188.404	Reformulación proyecto optimización, construcción y/o ampliación sistemas de acueducto municipio de Magangué.	El Proyecto de Obra fue contratado por FINDETER (PAF-ATF-051-2013). Terminado
80	2014EE0103082	22-dic-14	$ 4.330.000.000	Construcción, optimización y ampliación del sistema de acueducto del municipio de Montecristo.	Liquidado y entregado
86	2015EE0049177	23-jun-15	$ 3.780.000.000	Construcción del sistema de alcantarillado de la cabecera municipal de Córdoba.	Liquidado y entregado
120	2016EE0066186	12-sep-16	$ 191.263.603	Optimización sistema de acueducto regional la línea - fase 1.	Liquidado y entregado al municipio.
121	2016EE0086948	5-oct-16	$ 150.000.000	Reformulación No 1 del proyecto el cual tiene como objeto construcción, ampliación y/o rehabilitación del sistema de acueducto de la cabecera municipal de Mompox.	Proyecto liquidado y entregado al municipio.
3787	2017EE0075290	14-sep-17	$ 499.935.884	Asignación de recursos adicionales-reformulación del proyecto de construcción, ampliación, optimización y/o rehabilitación del sistema de acueducto de la cabecera municipal de Norosí.	Proyecto Ejecutado
.8040	2019EE0053148	25-jul-19	$ 230.524.313	Reformulación No.3 del proyecto sistema de alcantarillado de la cabecera municipal de Arroyohondo segunda etapa.	Liquidado y entregado
9293	2020EE0045551	22-jul-20	$ 248.764.188	Reformulación de la construcción, optimización y ampliación del sistema de acueducto de la cabecera municipal de Montecristo. (recursos faltantes).	Liquidado y entregado
TOTAL			**$ 57.562.634.017**	**Observación se expidieron 21 CDRs**	

- Estado de CDR de todas las fuentes sin contrato asociado

Se realiza una verificación del estado actual de los CDR´s sin contrato asociado que aparecen en el reporte del FIA con corte 31 de marzo de 2023, se indica por parte del Gestor que la mayoría de ellos ya tienen contrato y están en ejecución, sin embargo, a la fecha de corte no han

realizado ningún pago. Algunos de los registros no cuentan con contrato por lo que deben solicitor la liberación de los recursos. En el acta de asistencia técnica se relaciona el listado de CDR´s y su estado.

- Estado de contratos sin ejecución

De acuerdo con el reporte que realiza el FIA, aparecen 111 registros de CDR´s con contratos sin ejecución por más de 6 meses. Se verifica con el Gestor que varios de los indicados en este listado corresponden a saldos de contratos ya liquidados, por lo que se solicita realizar la revisión de cada caso, depurar la información financiera y donde aplique solicitar liberación de los CDR´s al FIA.

2.3. Componente Ambiental

El Plan ambiental PDA Bolívar 2020 – 2023, tiene 4 líneas estratégicas: Planeación ambiental territorial, planeación ambiental sectorial, conservación y saneamiento básico.

En la vigencia 2022 se desarrollaron los siguientes proyectos:

- Cumplimiento de los mínimos ambientales sectoriales para los municipios del departamento de Bolívar". Productos ejecutados:
    - Formulación de 7 planes de gestión integral de residuos sólidos en los municipios de Turbaco, Córdoba, San Jacinto, Morales, San Pablo, Mahates, Montecristo.
    - Elaboración de estudios soportes para permisos de vertimiento de sistemas de alcantarillado en los municipios de María la baja y Pinillos.
    - Elaboración de estudios soportes para 16 concesione de agua para acueductos rurales de los municipios de Carmen de Bolívar, María La Baja, Talaigua Nuevo, Turbana, Magangué y Calamar.

- Erradicación y recuperación de puntos críticos de disposición inadecuada de residuos sólidos en algunos municipios del departamento de Bolívar. Este proyecto se desarrolló en los municipios de Córdoba, San Estanislao, El Guamo, Clemencia, Santa Catalina, Mahates y Santa Rosa.

Para la vigencia 2023, se ha planeado la ejecución de 5 proyectos, así:

- Proyectos ejecutados PDA Bolívar - Jurisdicción de CARDIQUE

    a. Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) de acuerdo con la resolución 1433 de 2004, para los municipios de Arroyohondo, San Juan Nepomuceno, El Guamo, San Jacinto Norte y María la Baja.
    b. Estudios Soportes para Permisos de Vertimiento de Sistemas de Alcantarillado Municipal en los municipios de El guamo, San Juan Nepomuceno, Carmen de Bolívar, Ahorroyohodo y Calamar.
    c. Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) según la resolución 0754 de 2014" para el Municipio de Turbana.

- Proyectos ejecutados PDA Bolívar -Jurisdicción de CSB

    d. Estudios soportes para tramite de Ocupación de cauce para los municipios Mompox, Rio Viejo, Cicuco y San Pablo.

    e. Estudios soportes para Concesión de Aguas Subterráneas, Superficial en el Departamento de Bolívar, se proyecta su realización en los municipios de Pinillo, Achí, San Pablo, Rio Viejo y Cicuco.

2.4. Componente de aseguramiento de la prestación.

El Gestor actualmente se encuentra ejecutando el Plan de aseguramiento 2022, está pendiente el cierre esta vigencia. La ejecución física a la fecha es del 70%, por lo que se solicitó a la subgerencia de Desarrollo Empresarial prórroga para el cierre del programa hasta el 01 junio de 2023. El avance en la gestión de la prestación del servicio, se relaciona en la siguiente tabla.

No.	Actividades	Avance
1	Plan de aseguramiento PDA Bolívar – Vigencia 2022.	65%
2	Diagnósticos integrales de los servicios públicos.	100%
3	Planes de acción para cada prestador o población objetivo.	100%
4	Concertaciones con prestadores.	100%
5	Información requerida para estudios de costos y tarifas.	50%
6	Clasificación de municipios y prestadores por línea estratégica.	100%
7	Concertación con municipios respecto de las alternativas de transformación empresarial (Realizadas: Río Viejo, Arroyohondo, Montecristo y Santa Catalina).	60%
8	Adelantos en municipios en proceso de fortalecimiento institucional (INTEGRIN, RUPS, manuales, asistencia técnica, seguimiento a indicadores)	50%

La propuesta de fortalecimiento, transformación empresarial y apoyo al mejoramiento de la calidad de agua para la vigencia 2023, está dirigida al sector rural, ya tienen definidos los municipios. Adicionalmente, se informa que Aguas de Bolívar está haciendo seguimiento sobre los reportes de tomas de muestras en los municipios.

2.5. Componente de Gestión del Riesgo Sectorial

No hay avances en este componente.

3. Revisión y avance PEI capítulo 2023

Metas y proyectos

Se informa por parte del Gestor que el proyecto vigencia 2023, denominado “Construcción del sistema de acueducto de la cabecera del municipio de Altos del Rosario, departamento de Bolívar”, se encuentra en contratación, en estado de borrador de pliego.

Se recomienda incluir dentro del cuadro de metas y proyectos, las fuentes de recursos, según el formato. Así mismo, asignar los recursos según fuentes para evitar asignar recursos que no corresponden. Por ejemplo, los municipios de Achí y Córdoba cuentan con recursos disponibles en el FIA, que se supone hacen parte del cierre financiero 2023. Dentro de metas y proyectos no se encuentran proyectos para estos municipios o no es claro que sean beneficiarios, por lo que los recursos de estos municipios no deben ni pueden ser asignados a proyectos diferentes a estos municipios.

4. Proposiciones y varios

- Estado de vinculación de municipios al PDA Bolívar.

Se informa que a la fecha se encuentran 43 municipio vinculados al PDA. Los municipios que no están vinculados son Cantagallo, Zambrano y Cartagena. No se han renovado acuerdos para aportes de recursos para los municipios que ya se vencieron.

- Programa de conexiones Cambia mi Casa

El Gestor informa para el programa de conexiones, en la presente vigencia, tienen como candidatos los municipios de Mompox, San Juan Nepomuceno y posiblemente Arroyohondo. Dentro de las fuentes programadas para este año en el PEI, se incluyeron recursos para este programa. Sobre el tema del proyecto de Carmen de Bolívar a más tardar el lunes 15 de mayo de 2023 emiten certificación del tramo N2.

- Banco de proyectos

El PDA Bolívar manifiesta que ha fortalecido el equipo encargado de viabilizar proyectos en el banco de proyectos del departamento. Se presenta el listado de los proyectos que se encuentran en proceso de diseño o en formulación. Manifiestan que algunos proyectos requieren actualización. Solicitan apoyo específicamente con dos proyectos de residuos sólidos, que son:

- Elaboración de estudios y diseños del relleno sanitario regional para los municipios de Arenal del Sur, Norosi, Morales, Río Viejo, Regidor y Tiquisio.
- Elaboración de estudios y diseños del relleno sanitario regional Barranco Loba, Hatillo de Loba, San Martín de Loba y Altos de Rosario.

Registro Fotográfico

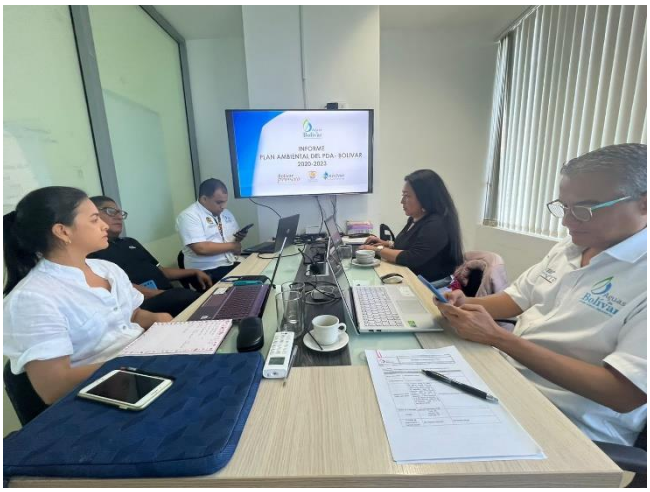

Conclusiones y recomendaciones:

- Todos los proyectos ejecutados con recursos nación - audiencias públicas, se encuentran terminados.
- El valor proyectado para el PEI capítulo 2023 es de $141.728.937.293,00. El PDA Bolívar está iniciando la ejecución de los proyectos planeados para esta vigencia, tanto en el componente de infraestructura como en el social y ambiental. El componente con mayor avance a la fecha es el social.
- En cuanto al componente de aseguramiento, se encuentran finalizando el Plan de la vigencia 2022 y tienen ya proyectadas las actividades que se van a proponer para la vigencia 2023.
- No se han realizado acciones dentro del componente de gestión del riesgo, por lo que el Gestor debe evaluar las necesidades del departamento en este aspecto y fortalecer el componente.
- Se realiza la verificación de los municipios con vinculación vigente al PDA Bolívar. Se indica por parte del Gestor que a la fecha 43 municipios están vinculados al PDA, los únicos municipios que no están vinculados son Cantagallo, Zambrano y Cartagena. No se han renovado acuerdos de aportes de recursos para los municipios que ya tienen el acuerdo de aporte de recursos vencido.

- Sobre el reporte de CDR´s sin contrato asociado o sin pagos durante un periodo mayor a 6 meses, se le recomienda al Gestor realizar la verificación de los mismos, depurar la información y solicitar la liberación de recursos para los que aplique.

Nota: Se ha socializado frente a las entidades territoriales, beneficiarios o partes interesadas los canales habilitados para acceder a los planes, programas y/o proyectos del MVCT y la no existencia de tramitadores y se exhorta a denunciar a las entidades pertinentes en caso de ocurrencia.

EL PRESENTE DOCUMENTO SE FIRMA POR LAS PARTES EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD			
JEFE INMEDIATO / SUPERVISOR DEL CONTRATO		**FUNCIONARIO O CONTRATISTA**	
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE	**JUAN PABLO SERRANO CASTILLA**	**NOMBRE**	**SANDRA PAOLA JAVELA JAVELA**

ANEXOS	
PASABORDOS	Soporte Pasabordo Bogotá - Cartagena 12 de mayo de 2023 Soporte Pasabordo Cartagena - Bogotá 12 de mayo de 2023
SOPORTES DE GASTOS DE VIAJE (SI APLICA)	No aplica
OTROS ANEXOS (SI APLICA)	Acta de asistencia técnica, lista de asistencia y Certificado de permanencia.

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link:https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/gti-plt-01-politica-de-tratamiento-y-proteccion-de-datos-personales-2.0.pdf
