ACTA DEL 26 DE FEBERERO DE 2024
DATOS GENERALES

FECHA:	**26 de febrero de 2024**
HORA:	2:00 p.m. a 2:45 p.m.
LUGAR:	**Virtual**
ASISTENTES:	Nayda Romero - Supervisora CUR 904 de 2020 Angélica Panesso – Municipio Palmira Holmes Zúñiga - Supervisor apoyo Vallecaucana de Aguas Martha La Verde- contratista de obra Sandra Ospina contratista de obra Sandra Duque RL interventoría Fabián Martínez- Interventoría Sara Lozano –MVCT – Apoyo a la supervisión – MVCT
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de participan
2. Estado de acta de reinicio del proyecto
3. Cronograma de actividades
4. Presentación de informes de supervisión
5. Cierre

1. DESARROLLO

Presentación de los participantes (ver datos generales) (vía virtual)

Siendo las 2: 00 p.m. del día 26 de febrero de 2024, se inicia acta de comité con el fin de conocer el avance del proyecto de acuerdo con el reinicio de los contratos de obra e interventoría, del proyecto **Abastecimiento de agua potable para los corregimientos de la Herradura, Obando y Matapalo municipio de Palmira - Valle del Cauca.**

Estado de avance reinicio de actividades del proyecto

Vallecaucana de Aguas SA ESP informa que las obras se reiniciaron el 21 de febrero de 2024, se están adelantando actividades de instalación de tubería sobre la vía Nacional Autorizado por la ANI, que hay posibilidad de terminar las actividades pendientes del proyecto antes de los dos meses programados

A mas tardar se están terminado el primer tramo sobre la Vía autorizada por la ANI el jueves 29 de febrero de 2024, toda vez que en visita en obra pudo evidenciar que hay un gran rendimiento de ejecución de actividades, además las condiciones climatológicas que ha permitido que se realice rápidamente las excavaciones
Reafirma Vallecaucana de Aguas SA ESP ejecutor del proyecto que terminada las actividades pendientes sobre la vía, se estaría dando agua a 3 corregimientos, que son la Herradura, Obando y Matapalos del Municipio de Palmira.
Los corregimientos de Matapalos, Herradura y Obando se debe hacer conexión por el municipio de Palmira, por el área urbana y Matapalo se debe hacer conexión por el área rural de Palmira en el corregimiento de la Torre.

Con el permiso obtenido con la ANI se suscribió acta de reinicio con el concesionario Rutas del Valle la cual se ha estado trabajando sin ningún problema.
Si se continua con el mismo ritmo de trabajo señala el ejecutor que a más tardar en un mes ya está terminado las obra alcance del proyecto, pero se dejan los dos meses como seguridad.
Si lo terminan antes el ejecutor informará al MVCT. Y se hará entrega al municipio de Palmira para que de inicio en las actividades de instalaciones domiciliarias.

El ejecutor señala programar entrega de la obra alcance del proyecto en 15 días.
Se cuenta con todos los accesorios equipos y señalización requerida por el concesionario Rutas del Valle.

MVCT pregunta si el concesionario ruta del Valle lo ha estado acompañando.
El ejecutor indica que no, ellos nos dieron el permiso y conocen a ellos ya conocen a la ingeniera en otros proyectos.
Actividad pendientes:
queda el paso en el corregimiento de la Torre, que son 10 a 12 metros, pero eso lo vamos a hacer con un teledirigido que no hay problema.

La actividad del paso del Corregimiento de la torre, de acuerdo al cronograma se inicia la otra semana, toda vez que con esa actividad se realiza el empate.

El ejecutor señala que el único problema que se tiene en estos momentos en la obra es para hacer el empate ya en el municipio de Palmira, como se demoraron

con el propietario, un urbanizador, pavimentó su entrada, entonces estamos tratando de identificar por dónde va la red para tratar de no dañar tanto el pavimento.
Es posible que se presente un poco de demora por eso.

MVCT: recomienda un avez terminado la totalidad de instalación de tuberia para dar alcance al proyecto , se puede programar visita de verificación en su entrega y que el Operador de los servicios publicos del municipio pueda recibor la obra a satisfacción.

MVCT solicita infromación respecto al permiso del predio del Ingenio Anteriormente llamado Ingenio Tumaco?

Valle Caucana de Aguas señala que ese permiso ya estaba hace tiempo
Los señores del ingenio ya fueron allá, vieron, miraron por dónde iba a hacer la obra y ellos dieron el visto bueno.

Ya se intervinieron el costado norte del paso elevado y costado sur el costado norte ya se hizo, quedó 100%. Quedo todo en buen estado de acuerdo con el recorrido realizado por el ejecutor.
El ingenio fueron a mirar por dónde iban hacerse la instalación de la tubería pero no se firmó ningún documento.
Ya se había firmado meses atrás esa socialización con ellos.

Cronograma:
MVCT pregunta si el cronograma es el mismo general que presentaron a la hora de la solicitud de la prórroga del Convenio?
Ejecutor señala que sí. No tienen más detalles ni modificaciones.
Presentación de informes:
De acuerdo con el reinicio de actividades el ejecutor señala presentar de nuevo informes de supervisión para la primera semana de marzo la cual corresponderia al periodo de febrero de 2024.
La cual se presentará con el informe de la interventoria

MVCT: señala que se debe tener siempre que son 5 días hábiles después de la terminación de cada mes, para la cual se espera la presentación de informe de

supervisión correspondiente al mes de febrero de 2024, la primera semana de marzo de 2024.

El ejecutor señala que si se tiene el informe antes lo presentan antes de la fecha establecida.
Para dar cierre al comité el MVCT solicita que se informe si se realizá algun cambio del cronograma de las actividades pendientes por ejecutar.

4. **COMPROMISOS**

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Presentar informes de supervisión delmes de febrero de 2024 rimera semana de marzo la cual corresponderia al periodo de febrero de 2024	Ejecutor - Municipio de Palmira.	Antes de 7/03/2024
2	Informar al MVCT si se realiza alguna modificación al cronograma	Ejecutor Municipio de Palmira	Previo a la terminación de actividades.

FIRMAS:

Ingeniera Nayda Romero – Supervisora CUR 904 de 2020.
Ingeniera Angélica Panesso – Municipio Palmira
Ingeniero Holmes Zúñiga - Supervisor apoyo Vallecaucana de Aguas
Ingeniera Martha La Verde- contratista de obra
Ingeniera Sandra Ospina contratista de obra
Ingeniera Sara Lozano –MVCT – Apoyo a la supervisión – MVCT

Nota desde el audio de la interventoria se conectan el ejecutor, tod avez que se encontraban juntos en el momento del comité.

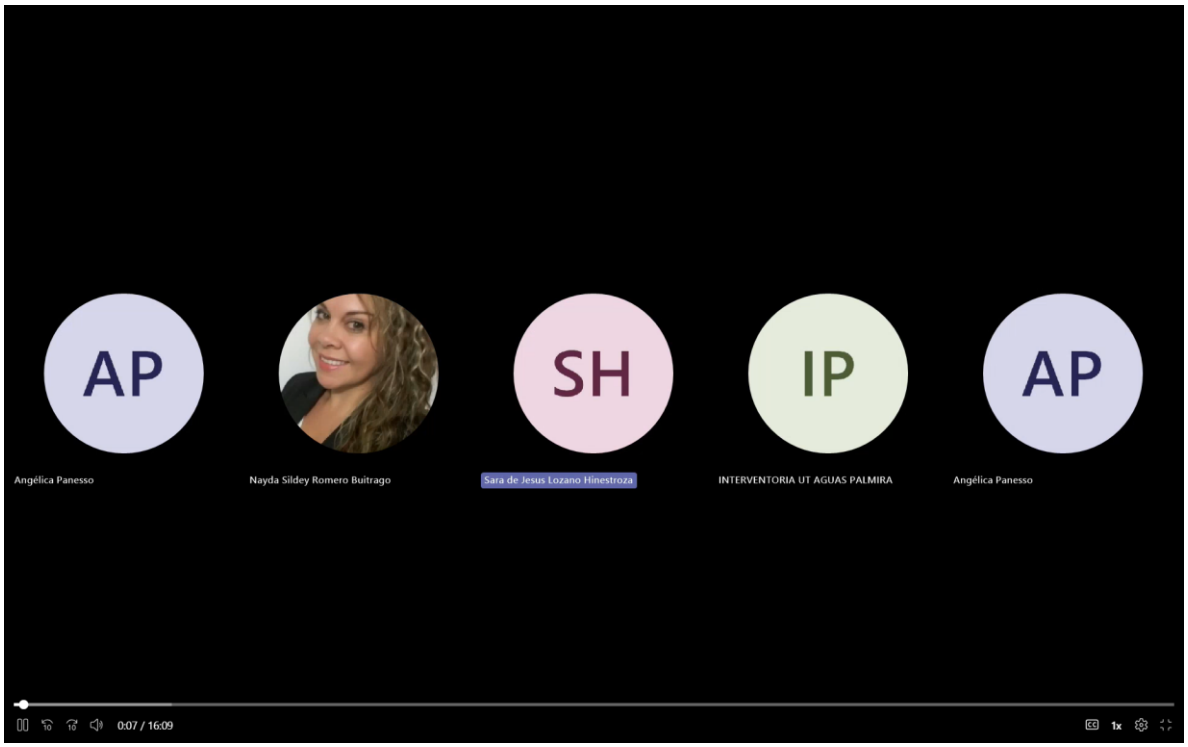

Elaboró: Sara Lozano

Fecha: 26/02/2023
