ACTA No. 04

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 10 de mayo 2024
HORA:	De 8:30 a 9:40 horas
LUGAR:	Virtual – Aplicativo de MEET
ASISTENTES:	Leonardo Avalo – Ingeniero - Consultoría – J.M.A. Ingeniería. Santiago Hernández – Ingeniero – Especialista componente ambiental. Mauricio Gutiérrez – Ingeniero Ambiental – Apoyo Consultoría. Jhon Carmona – Ingeniero – especialista hidráulico – Consultoría. Isabel y Luisa – Ingenieras de Apoyo de la Secretaría de vías e infraestructura del municipio de Sevilla. Wisner Genaro Suárez Guzmán – Contratista – Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial (DIDE). Alvaro Andrés Corcho – Ingeniero Especialista – Evaluador Líder – Grupo de Evaluación de Proyectos – MVCT - aacorcho@minvivienda.gov.co
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los participantes.
2. Aclaración del plan de trabajo.
3. Compromisos.

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext:
www.minvivienda.gov.co

DESARROLLO:

1. Se presenta a la mesa técnica del 10 de mayo del 2024 por parte del municipio, y formuladores del proyecto **1-2023-91 OBRAS DE REPOSICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO SAN JOSE Y ZONA DE INFLUENCIA EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SEVILLA VALLE DEL CAUCA** Las ingenieras Isabel y Luisa, ingenieras de apoyo a la secretaría de Vías e Infraestructura del municipio de Sevilla. Por parte del equipo de consultoría, se encuentra el Ingeniero Leonardo Avalo, junto con el Ingeniero Santiago Hernández, quien maneja el tema ambiental. También se encuentran los Ingeniero Mauricio Gutiérrez y Jhon Carmona, encargados del componente hidráulico del proyecto. Por parte del MVCT se encuentra Genaro Suárez contratista y asesor de la DIDE y el Ingeniero Alvaro Corcho, evaluador líder del grupo de evaluación de la subdirección de proyectos.
2. Se inicia la mesa por parte del ingeniero Alvaro Corcho, quien indica el propósito de la reunión el cual es revisar el plan de trabajo establecido en la mesa No.3, llevada a cabo el 10 de abril del presente año, en la cual la consultoría se comprometió a radicar la totalidad de los requerimientos pendientes establecidas en la lista de chequeo, y la cual fue enviada en el mes de octubre del año 2023.
3. A esto Genaro Suárez menciona que la idea es que el plan de trabajo se entregue por componentes y no de manera general como se estableció en la mesa No.3, indicando además la disposición por parte de la Dirección de Infraestructura y Desarrollo Empresarial, para sacar adelante este proyecto. Se menciona que de acuerdo con la disposición de la Resolución 0661 del 2019, se podría estar haciendo la devolución del proyecto en el caso que no se reciba ningún tipo de respuesta por parte del formulador del proyecto, tema que en este momento no aplica para el proyecto en cuestión, ya que el municipio, en cabeza del alcalde, ha mostrado disposición en continuar con la evaluación del proyecto, y que es de importancia para la DIDE que este llegue a buen término.
4. Una vez finalizada la intervención de Genaro Suárez, el Ingeniero Alvaro Corcho menciona que dentro de los requerimientos "urgentes" del proyecto se encuentra el tema técnico, ya que este sería el punto de partida para los demás componentes del proyecto. De los componentes técnicos pendientes, se encuentra los componentes de topografía, hidráulica y geotecnia, los cuales van de la mano con el componente ambiental, ya que, en el AUTO, entregado por la CVC, se indica un problema de estabilidad en la zona de la

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext:
www.minvivienda.gov.co

descarga. El Ingeniero Alvaro Corcho le solicita al Ingeniero Jhon Carmona información sobre el avance de los requerimientos pendientes.

5. El Ingeniero Mauricio Gutiérrez interviene sobre esto e indica que, en el caso de topografía se ha presentado un avance significativo, de cerca del 40% de los requerimientos, en el caso de hidráulica, este presenta un avance del 50%. De los demás componentes como lo es geotecnia, menciona que no se ha podido adelantar la subsanación del producto, debido a que el ingeniero responsable, se encuentra fuera del país y que regresaría en dos semanas.
6. El ingeniero Alvaro Corcho pregunta de acuerdo con esto una estimación de fechas para la radicación de los diferentes productos, teniendo en cuenta el compromiso establecido en la mesa anterior.
7. El Ingeniero Mauricio Gutiérrez menciona que en efecto no se logra cumplir la meta establecida en la mesa anterior, e indica que los productos de topografía e hidráulica serían radicados el 24 de mayo. Del componente ambiental y geotecnia, los cuales se encuentran relacionados, indica que para el 7 de junio se tendría una fecha estimada para la radicación de estos componentes.
8. El Ingeniero Alvaro Corcho pregunta por los temas que son competencia del municipio, como certificaciones y tema predial.
9. El Ingeniero Mauricio Gutiérrez menciona que requieren de un poco más de tiempo para estos componentes, ya que la consultoría está siendo un apoyo para alistar esta documentación. Al respecto establece que para el 31 de mayo se tendía el tema predial junto con las certificaciones del municipio. También se indica que se ha venido actualizando el presupuesto del proyecto.
10. El Ingeniero Alvaro Corcho menciona que, para que no haya reprocesos, propone que esto sea actualizado una vez se tengan los conceptos de los demás componentes técnicos.
11. Se establece que la reunió programada para el 15 de mayo no se llevaría a cabo, ya que esta tendría como propósito revisar los documentos radicados y establecer temas pendientes. Por lo que se propone realizar una nueva mesa el 30 de mayo, teniendo tiempo por parte del equipo de evaluación para revisar los componentes de topografía e hidráulica que serían radicados el 24 de mayo, y revisar si se cumple con la meta de la radicación del componente documental y predial para el 31 de mayo.
12. Los asistentes a la mesa indican que no hay problema de realizar la mesa de trabajo el 30 de mayo a las 8:30 a.m.
13. La mesa finaliza a las 9:40 a.m.

COMPROMISOS

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext:
www.minvivienda.gov.co

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Envío de los componentes de topografía e hidráulica	Consultor	24/05/2024
2	Envío del componentes documental y predial	Consultor	31/05/2024
3	Componentes geotecnia y ambiental	Consultor	Se indicará el 7 de junio con la llegada del especialista.
4	Mesa de trabajo	Consultoría - MVCT	30/05/2024

FIRMAS:

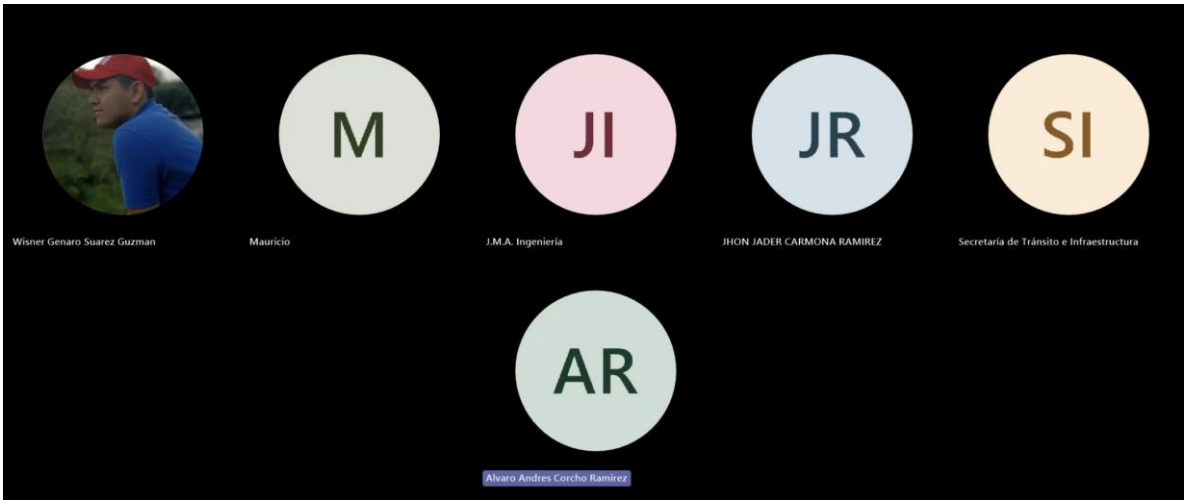

Elaboró: Alvaro Andrés Corcho Ramírez
Fecha: 10/05/2024

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext:
www.minvivienda.gov.co
