# ACTA

## DATOS GENERALES

| | |
|---|---|
| FECHA: | Bogotá, Colombia, 22 de julio de 2024 |
| HORA: | De 10:00 a 10:23 horas |
| LUGAR: | Virtual |
| ASISTENTES: | **De parte de ECAAS S.A. E.S.P.**<br>- Alejandro Jiménez, profesional técnico y planeación<br><br>**De parte de CUMARE S.A. E.S.P. (PDA)**<br>- Shirley García, Profesional de apoyo<br><br>**De parte del MVCT**<br>- Rodrigo Torrejano Jiménez, Contratista Equipo de Diálogo Social Despacho de la Ministra<br>- Diego Alejandro Sorza, Contratista Evaluador Componente Geotecnia<br>- Jairo Arley Urbina, Contratista Evaluador Componente Estructuras<br>- Néstor Fabián Romero, Contratista Evaluador Líder Grupo de Evaluación de Proyectos SDP DIDE MVCT VASB<br>- Sergio Andrés Rodríguez Olaya, Contratista Evaluador Líder Grupo de Evaluación de Proyectos SDP DIDE MVCT VASB |
| INVITADOS: | No aplica |

**ORDEN DEL DIA:**

1. Presentación de los asistentes.
2. Objetivo de la reunión.
3. Desarrollo de la reunión.
4. Compromisos, conclusiones y cierre de la reunión.

**DESARROLLO:**

1. Presentación de los asistentes.

Se realiza presentación de los asistentes. Se cuenta con participación de la empresa ECAAS S.A. E.S.P., de la empresa CUMARE S.A. E.S.P. (PDA), y profesionales del MVCT.

No asistieron de parte de la alcaldía municipal de Saravena.

2. Objetivo de la reunión.

Mesa de trabajo para realizar seguimiento a los pendientes correspondientes al proyecto "**RECONSTRUCCION DE LOS MUROS LATERALES, TRANVERSALES DE PRESA, CAMARA DE CAPTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE PROTECCION DEL SISTEMA DE CAPTACION DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA**" (antes denominado "CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA") radicado bajo la modalidad de inversión en rehabilitación, reconstrucción, prevención y/o mitigación de riesgos de los sistemas de acueducto, alcantarillado y/o aseo.

3. Desarrollo de la reunión.

- Antecedentes: el proyecto "CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE SARAVENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA", actualmente se encuentra en revisión documental, razón por la cual no ha ingresado al mecanismo de viabilización hasta que se complementen los pendientes solicitados por el profesional a cargo (Marlon David Olarte). No obstante, por solicitud del formulador, se pidió apoyo al MVCT que de manera paralela se realizará la revisión detallada del mismo, lo cual fue realizado y socializado a través de mesa de trabajo del 12

de marzo de 2024. Las observaciones fueron compartidas a través de correo electrónico del 13 de marzo de 2024.
En consecuencia, representantes del formulador solicitaron al MVCT el acompañamiento para atender inquietudes sobre las observaciones formuladas las cuales se realizarán por componentes y/o requisitos.

El 18 de marzo de 2024 se realizó la primera sesión, con el acompañamiento de la especialista del MVCT de topografía y el par de la consultoría, por medio de la cual se atendieron inquietudes.

El 19 de marzo de 2024, se realizó la segunda sesión, con el acompañamiento de especialista del MVCT en gestión del riesgo y geotecnia y los profesional en representación del formulador (ECAAS, Municipio de Saravena, CUMARE, y consultoría), por medio de la cual se atendieron inquietudes sobre los requisitos y observaciones realizadas al Acta CMGRD y al estudio de geotécnica.

El 22 de abril de 2024, se realizó mesa de trabajo, por medio de la cual se realizó seguimiento a las observaciones y ajustes, y los profesionales del MVCT atendieron inquietudes sobre las mismas. El formulador se comprometido a entregar ajustes el 4 de mayo de 2024.

El 6 de mayo de 2024, se realizó el seguimiento a los compromisos sobre subsanaciones del proyecto, se tenía previsto la entrega de estos para el 4 de mayo de 2024, sin embargo el representantes del formulador plantean nueva fecha para el 17 de junio de 2024.

A través de correo electrónico del 10 de mayo de 2024, representantes del formulador compartieron con los evaluadores del MVCT ajustes parciales: estudio de topografía, estudios de hidrología e hidráulica, componente predial y actas del CMGRD.

El 17 de mayo de 2024, a través de la mesa de trabajo, se realizó la socialización de avances en los ajustes sobre el componente de geotécnica y gestión de riesgo por parte del formulador del proyecto. Se realizó el seguimiento a los compromisos sobre subsanaciones del proyecto, en la sesión se presentó avances parciales sobre el estudio de suelos. Se comentó por parte del MVCT que las actas CMGRD aportadas con el proyecto se encuentran en cumplimiento.

El 23 de mayo de 2024, a través de correo electrónico, se informó a representantes del formulador, que fueron revisados los estudio de topografía, y los mismos se encontraron de conformidad respecto de lo solicitado por la Resolución 0661 de 2019, y que con la radicación de los ajustes, los documentos y planos deben presentarse firmados por parte de la consultoría e interventoría.

El 28 de mayo de 2024, a través de mesa de trabajo, se socializó por parte del formulador ajustes sobre el componente predial y por parte de los profesionales del MVCT se realizaron observaciones sobre el plano predial. Posteriormente, el 30 de mayo de 2024 a través de correo electrónico se remitieron ajustes sobre el componente predial, y por ese mismo medio, el 5 de junio de 2024 se enviaron observaciones y pendientes para los respectivos ajustes.

Por medio de correo electrónico del 5 de junio de 2024, se remiten observaciones pendientes del proyecto a esa fecha sobre los requisitos de presentación y solicitadas por la Resolución 0661 de 2019.

A través del correo del 6 de junio de 2024, se remiten al formulador las observaciones y pendientes a esa fecha sobre el componente predial

El día 7 de junio de 2024, se realizó mesa de trabajo por medio de la cual el formulador realizó socialización de avances del componente técnico de gestión del riesgo, y los evaluadores del MVCT realizaron observaciones sobre lo presentado, principalmente, lo referente a la precisión de las informaciones sobre las recomendaciones y definiciones respecto de las amenazas y soluciones a estas incluidas con el alcance del proyecto.

El 11 de junio de 2024, se realizó mesa de trabajo, por medio de la cual
Se realizó el seguimiento a los compromisos sobre subsanaciones del proyecto, en la sesión se presentó avances parciales el documento técnico de Gestión del Riesgo y diseño estructural, los cuales cuenta con observaciones por subsanar.

EL 12 de junio de 2024, a través de mensaje de texto, profesional de ECAAS remite compromiso actualizado por el cual se proyecta presentar los ajustes definitivos para el 24 de junio de 2024.

El 14 de junio de 2024, a través de correo electrónico, el formulador remite ajustes parciales correspondientes a los componentes predial, informe técnico de gestión del riesgo, estudio de suelos y permiso ambiental

El 19 de junio de 2024, se realiza mesa de trabajo de seguimiento a los pendientes a esa fecha. Se realizó el seguimiento a los compromisos sobre subsanaciones del proyecto, en la sesión se presentó avances parciales el documento técnico de Gestión del Riesgo, estudio de suelos y plano predial, con observaciones por subsanar.

El 5 de julio de 2024, se remite al formulador correo electrónico con la lista de chequeo actualizada, la cual contiene las observaciones y pendientes a esa fecha. Ese mismo día se realizó mesa de trabajo, donde las observaciones fueron comentadas: en el menciona espacio, el formulador proyectó entrega de ajustes parciales, correspondientes al estudio de suelos y diseño estructural.

- El Ing. Rodríguez (MVCT) menciona que en la presente sesión se realizará seguimiento a los pendientes del proyecto. De acuerdo a los compromisos establecidos en la pasada mesa de trabajo (19 de junio de 2024),se esperaban ajustes del componente técnico correspondientes al estudio de sueños y diseño estructural para el 15 de julio de 2024, sin embargo, a la fecha estos no se han reportado para la revisiones del profesionales del grupo de evaluación del ministerio. Por lo anterior, el profesional del MVCT solicita a los representantes del formulador información sobre el estado y avance de los ajustes y/o subsanaciones solicitadas.

- Sobre lo anterior, el Ing. Alejandro Martínez (ECAAS), menciona que se vienen adelantando los respectivos ajustes y se han presentado retrasos e imprevistos que han postergado las fechas, la cual se esperaba para el 15 de julio de 2024. Los retrasos, menciona, corresponden a la disponibilidad del profesional responsable del diseño estructural, lo cual, de igual forma, ha repercutido en los demás componentes que son dependientes de dicho diseño, como lo son el estudio de suelos y presupuesto.

  Al ser preguntando por la fechas de entrega por parte del Ing. Rodríguez, el profesionales de ECAAS, menciona que, de acuerdo con la última información, esperan contar con las subsanaciones del diseño estructural para el 2 de

agosto de 2024, sin embargo, esta información deberá ser suministrada al especialista de geotecnia para las subsanaciones correspondientes. A la vez, se menciona que las mencionadas fechas, deberá contemplarse los requeridos por parte de la interventoría para las respectivas revisiones y aprobaciones sobre productos.

Por lo mencionado anteriormente, no se precisa fecha de entrega al MVCT, sino que se acuerda que el día 2 de agosto de 2024, se realizará seguimiento a los avances con el fin de validar cumplimiento a los procesos en curso

- Subsanados los componentes técnicos procederán a ajustar el presupuesto.
- Recuerda el Ing. Rodríguez (MVCT), que hay otros pendientes remitidos a los representantes del formulador, remitidos a través del correo electrónico del 5 de julio de 2024, para que sean tenidos en cuenta igualmente para las subsanaciones correspondientes.

4. Compromisos, conclusiones y cierre de la reunión.

El proyecto cuenta con observaciones y pendientes de tipo documental, legal, técnico, y financiero; los componente predial y ambiental se encuentran en cumplimiento.

Se esperaban entrega de ajustes parciales, correspondientes al estudio de suelos y diseño estructural para el 15 de julio de 2024, son embargo, representantes del formulador reportan retrasos. No se reporta fecha de entrega de lo anterior, para la revisión de los profesionales del MVCT, no obstante, se realizará seguimiento para el 2 de agosto de 2024 sobre los avances.

Sobre los demás pendientes, se le recuerda a los representantes del formulador, que la lista de chequeo actualizada fue remitida a través del correo electrónico del 5 de julio de 2024.

## **COMPROMISOS** (Si aplica)

| No. | Compromiso | Responsable | Fecha límite de cumplimiento |
|---|---|---|---|
| 1 | Entrega y radicación de los ajustes estudio de suelos y diseños estructurales<br><br>*Nota: En el intermedio, se podrán realizar mesas de trabajo de seguimiento y/o aclaración de inquietudes frente a las observaciones.* | ECAAS<br><br>Municipio de Saravena<br><br>Cumare | 02/08/2024<br><br>*Nota: se esperaba antes, sin embargo, debido a retrasos, se han corrido las fechas de entrega. La fecha proyectada en este compromiso corresponde al día por el cual se realizará seguimiento a los avances, sin embargo, la entrega definitiva se prevé posterior a la revisión de la interventoría de estudios u diseños.* |
| | | | |
| | | | |

## **FIRMAS (reunión virtual):**

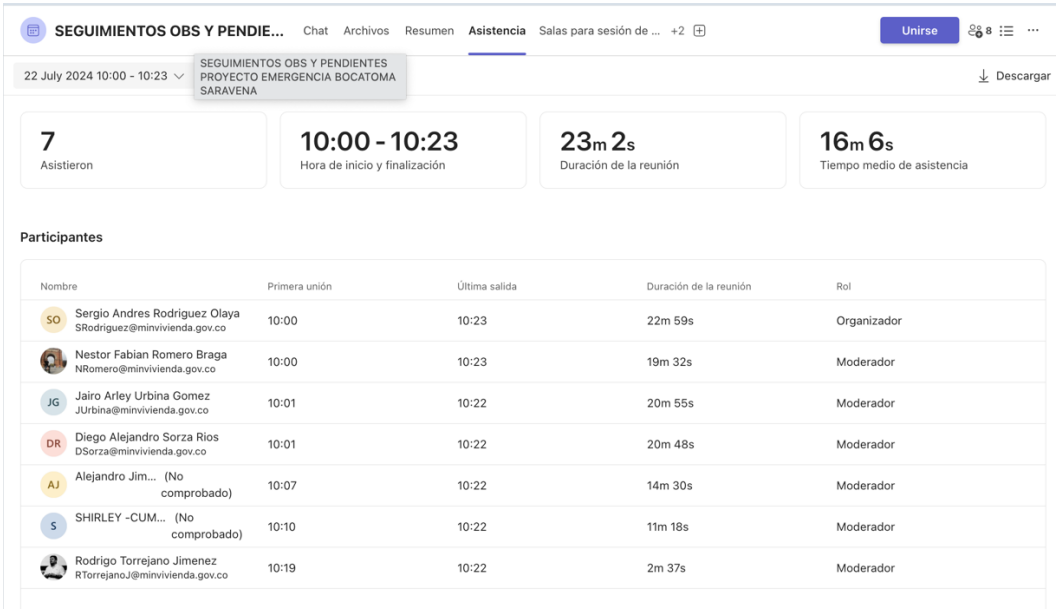

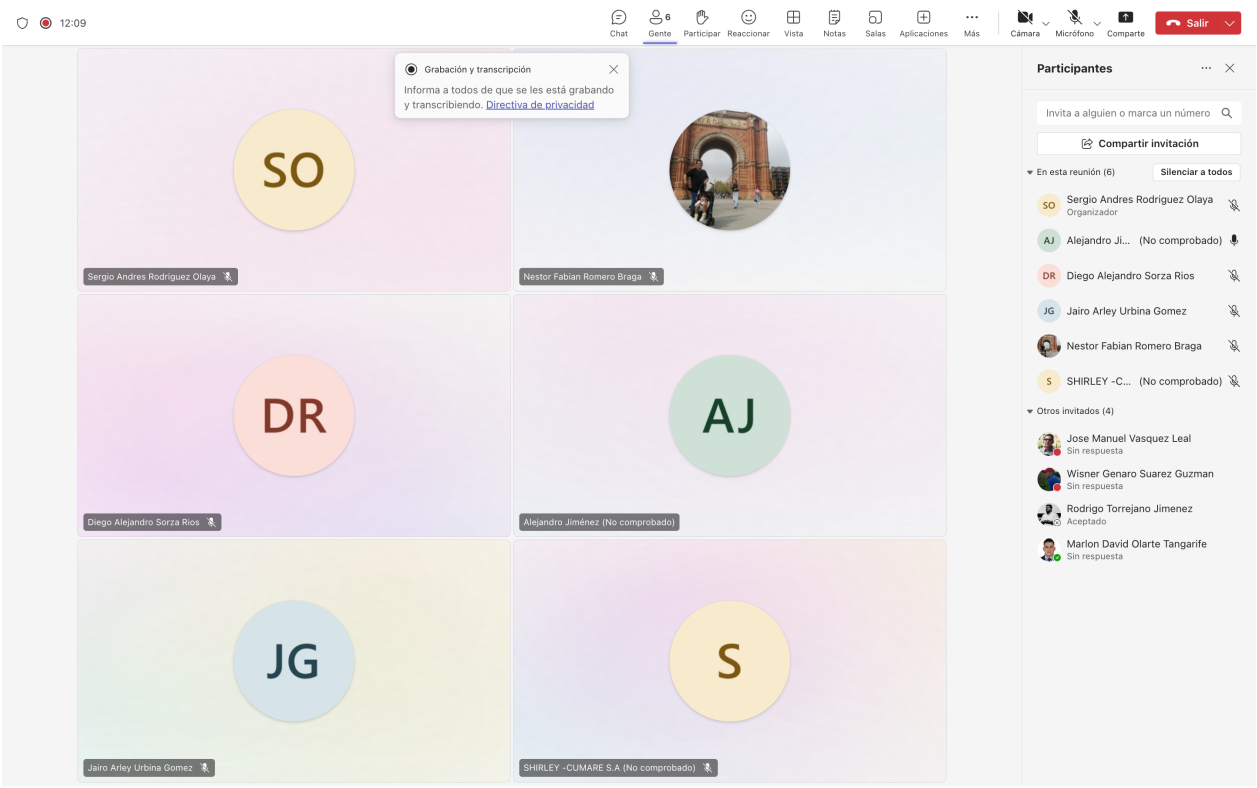


Anexos: (No aplica)
Elaboró: Sergio A. Rodríguez Olaya, SDP-DP-MVCT-VASB
Fecha: 22/07/2024
