ACTA DE REUNIÓN 11 DE JULIO DE 2024

DATOS GENERALES

FECHA:	11 de julio de 2024
HORA:	De 2:30pm a 3:30pm
LUGAR:	**Microsoft Teams**
ASISTENTES:	Juan Miguel Perilla – Ingeniero de seguimiento MVCT Claudia Constanza Londoño - Gestora proyectos FINDETER Juan Carlos Paredes – Ing. Supervisión FINDETER Fernanda Villegas – Auxiliar de Obra Grupo More Andrés Caviedes - Contratista Obra Grupo MORE Sergio Cruz - Grupo MORE Claudia Mendoza – Social Grupo MORE Oscar Aranda - Contratista Obra Grupo MORE Juan Carlos Tello - Contratista Interventoría INTER JCD Luisa González - Contratista Interventoría INTER JCD Danny Ramirez – Residente Interventoría Mario Triana – SST Interventoría Felipe Potes – Ing. Supervisor EMCASERVICIOS S.A Laura Bastidas – Apoyo EMCASERVICIOS S.A Edwin – Municipio de Santander de Quilichao Olaya Larrahondo - Emquilichao E.S.P
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

El día Jueves 11 de julio de 2024 se convocó comité virtual para hacer seguimiento del avance del proyecto CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO QUITAPEREZA CABECERA MUNICIPAL DE SANTANDER DE QUILICHAO -CAUCA

1. Verificación entidades asistentes
2. Lectura acta anterior
3. Informe de avance del contrato de obra PAT-ATF-O-043-2023
4. Compromisos
5. Eventualidades

DESARROLLO:

La Ingeniero Tello realiza la presentación del avance de obra mediante la proyección simultanea de diapositivas, en lo cual se evidencia en el periodo semanal comprendido

entre el 1 al 7 de julio, los porcentajes de avance de obra corresponde a los siguientes:

1. Porcentaje de obra programada para la tercera semana del mes de junio es del 46.60%.

2. Porcentaje de obra ejecutado y aprobado por la Interventoría es de 48.06 %, con lo cual, se tiene un adelanto de 1.46%.

Las actividades que se están ejecutando actualmente en obra, son:

1. En la estructura del tanque de almacenamiento, se continuó con la instalación de los aceros horizontales, además de, proseguir con el montaje de la formaleta para la fundición de los muros del tanque. De igual manera, se realizó la instalación de la cinta Sika V-15 en los muros, para sellar las juntas de construcción.

2. En la estructura del tanque de cloración, se culminó la instalación de los aceros verticales correspondientes a los muros del tanque, similarmente, de la ubicación de los aceros de fisuramiento conforme a los planos de diseño, además de la instalación de formaleta en madera, para la fundición de la losa de fondo.

3. En la estructura de filtros, se continua con la instalación de aceros en la parrilla superior de fondo de losa, así mismo, de la colocación de los aceros verticales de los muros del tanque.

4. Por otra parte, se culminó la excavación para la cimentación de la estructura de las casetas correspondiente a la oficina y los baños de la PTAP, además de realizar la fundición de la viga en concreto ciclópeo.

5. Por otro lado, se evidencia el corte y figuración del material de refuerzo destinado a la cimentación de los tanques de sedimentador, filtros, floculador y viga de cimentación de las casetas.

6. Con respecto al componente de seguridad y salud en el trabajo, se realizó seguimiento a la señalización en obra, además de acompañamiento a las capacitaciones referentes al correcto uso del arnés y tareas de alto riesgo.

7. Durante la semana no se presentan incidentes y/o accidentes en obra.

8. En cuanto al componente social, se presenta flayer de invitación a la socialización del 50% de avance de obra. Por otra parte, se realiza recorrido en obra con el gobernador del Cabildo de Munchique Sr. Albeiro Camayo. Consecuentemente, el contratista realizó reconocimiento al empleado del mes a los señores Iván Jair Mulcue y Jesús Bacca.

9. La empresa Emcaservicios realizará visita a la obra antes del 30 de Julio, además el día de la socialización, presentarán a la nueva persona encargada, debido a que el Ingeniero Felipe Potes no continuará en el proyecto.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Gestionar el lugar de la socialización del 30 de julio, Además dedefinir la fecha de realización y enviar con antelación la invitación a los entes competentes.	Contratista de obra e interventoría	17/07/2024
2	El contratista debe presentar Plan de Contingencia en respuesta al atraso en la actividad del cerramiento perimetral.	Contratista de obra e interventoría	17/07/2024
3			
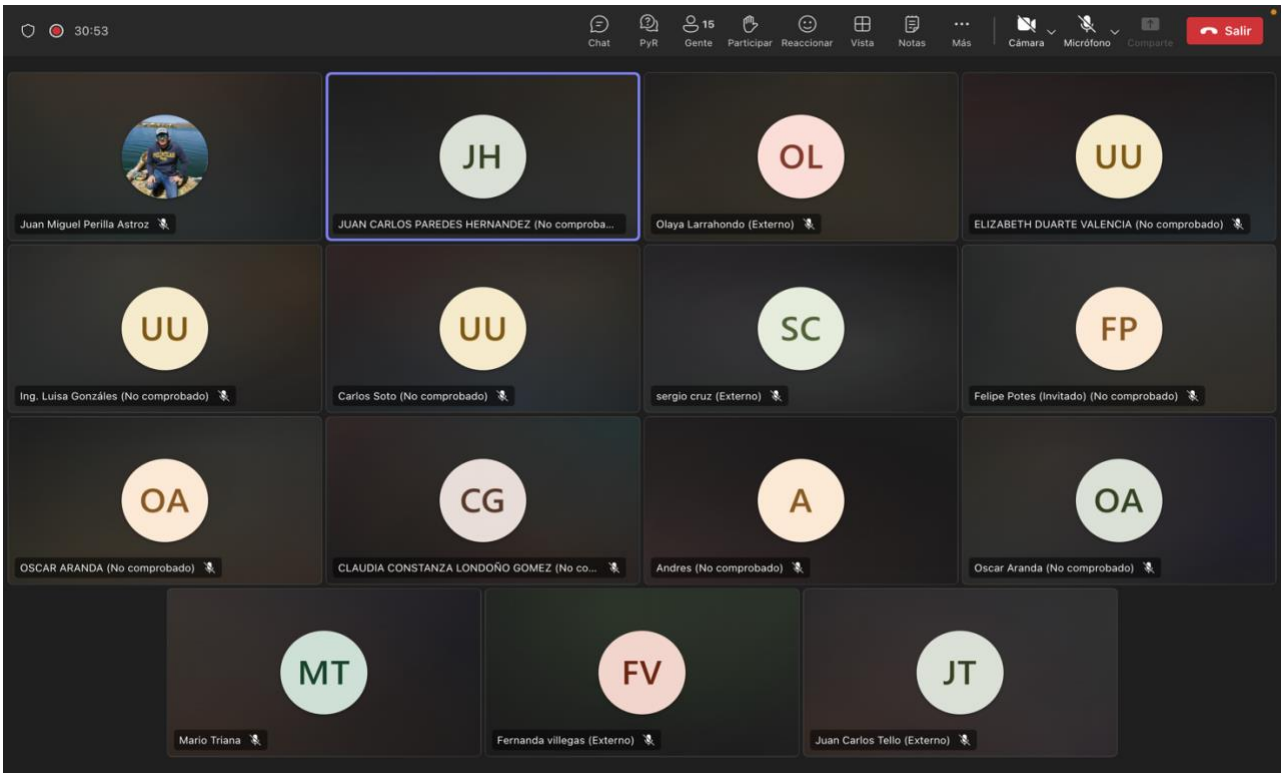
FIRMAS:
