COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA	FORMATO DE CUMPLIDO E INFORME DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO **PROCESO:** GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	Versión: 1.0 Fecha: 14/03/2022 Código: GRF-F-59

FECHA	31/08/2024	**N° DE COMISIÓN**		**N° DE COMISIÓN SIIF**	

NOMBRE DEL FUNCIONARIO O CONTRATISTA:	JUAN CARLOS ALVAREZ LONDOÑO
TIPO DE VINCULACIÓN:	CONTRATISTA
DEPENDENCIA:	DIRECCIÓN DE POLITICA Y REGULACIÓN / GRUPO DE POLITICA SECTORIAL

DE MANERA ATENTA INFORMO QUE CUMPLÍ CON LA COMISIÓN O DESPLAZAMIENTO ASIGNADA EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

COMISIÓN/ AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO	**INTERIOR**	**X**	**EXTERIOR**	

RUTA Y FECHAS DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO:

DESDE			**HASTA**			**RUTA**
DD	**MM**	**AA**	**DD**	**MM**	**AA**	
26	08	2024	30	08	2024	BOGOTÁ-TUMACO- BOGOTA

OBJETO DE LA COMISIÓN Y/O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO

visita de seguimiento y diagnóstico técnico socio-cultural proyecto en los municipios de Roberto Payan y Barbacoas , por parte del GPDC.

INFORME DE COMISIÓN Y/O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, desplazo un equipo de trabajo Se realiza la visita a la Barbacoas y Roberto Payan

Barbacoas 26-28 de agosto 2024. El día uno se realizó trabajo en la población de El Tronco en el resguardo indígena Ñambí Piedra Verde en compañía del su Gobernador del resguardo Carlos Orlando Bisbicus y el señor Emilio Bisbicus; esta zona urbana de la comunidad del El Troco se encuentra ubicada sobre la vía en el Kilómetro 16 de la vía Junín – Barbacoas, esta población se extiende sobre la margen izquierda y derecha de la vía en aproximadamente una longitud de 300 metros aproximadamente. Su población a beneficiar es de 119 habitantes conformadas por 33 familias las cuales se distribuyen según la tabla que se encuentra a

continuación; esta información fue tomada en campo, y verificada con el listado del censo poblacional realizada dentro del el resguardo el primer trimestre del año 2021**.**

Toda esta población se abastece del servicio de agua, mediante la recolección y almacenamiento del agua producto de las lluvias, es así como en las casas tiene un tanque de almacenamiento en donde producto la recolección de aguas lluvias en su tejado, la encausan y almacenan el líquido para su consumo. Muy pocos habitantes de manera individual han realizado la extensión de mangueras de riego hasta sus viviendas, sumergiéndolas en la Quebrada El Pailón hasta su vivienda. Y la población restante debe suplir su necesidad mediante la recolección de agua de las quebradas aledañas, en los cuales tienen que hacer recorridos largo e incomodos.

Luego se día 2 y 3 se visitó el Predio El Verde correspondiente a los resguardos indígenas el Gran Sábalo, Pulgande – Tronqueria y Tortugaña Punde Bravo Se realiza la visita a la población de los resguardos indígenas el Gran Sábalo, Pulgande – Tronqueria y Tortugaña Punde Bravo ubicadas en Predio El Verde, sobre la vía nacional a Pasto – Tumaco; en compañía de la señora NANCY PASCAL CANTICUS Gobernador Suplente Predio el Verde, el señor JULIAN PAI el cual actualmente se desempeña como fontanero del sistema de acueducto que abastece estas poblaciones.

Estas poblaciones se encuentran ubicadas sobre la vía en el Kilómetro 108 de la vía Tumaco- Junín, esta población se extiende sobre este recorrido por 2000 metros aproximadamente, y se ubica en las siguientes coordenadas: X= 877738.5923, Y=642218.9197.

Su población está conformada por 162 viviendas las cuales se encuentran conformadas por comunidad de los resguardos indígenas el Gran Sábalo, Pulgande – Tronqueria y Tortugaña Punde Bravo Toda esta población se abastece del servicio de acueducto y de recolección de aguas lluvias, toda vez que el servicio de abastecimiento de agua es deficiente ya que este se presta de manera intermitente.

Sobre la quebrada El Verde se encuentra la estructura de bocatoma la cual capta el servicio para la población de la vereda Predio Verde; se evidencia que el agua que baja por esta quebrada es captada en su totalidad y al momento que el caudal presenta una reducción, es una de las causales para que el servicio de abastecimiento de agua de la población sea intermitente.

Para el levantamiento de esta información se realizaron diferentes visitas de campo, acompañados de la comunidad de la Vereda Buenavista, El Peje, Comunidad de los Telembies asentados en la V. Buenavista, Resguardo indígena Ñambí Piedra Verde “El Tronco”, y La vereda Predio Verde corresponde a los resguardos indígenas el Gran Sábalo, Pulgande – Tronqueria y Tortugaña Punde Bravo.

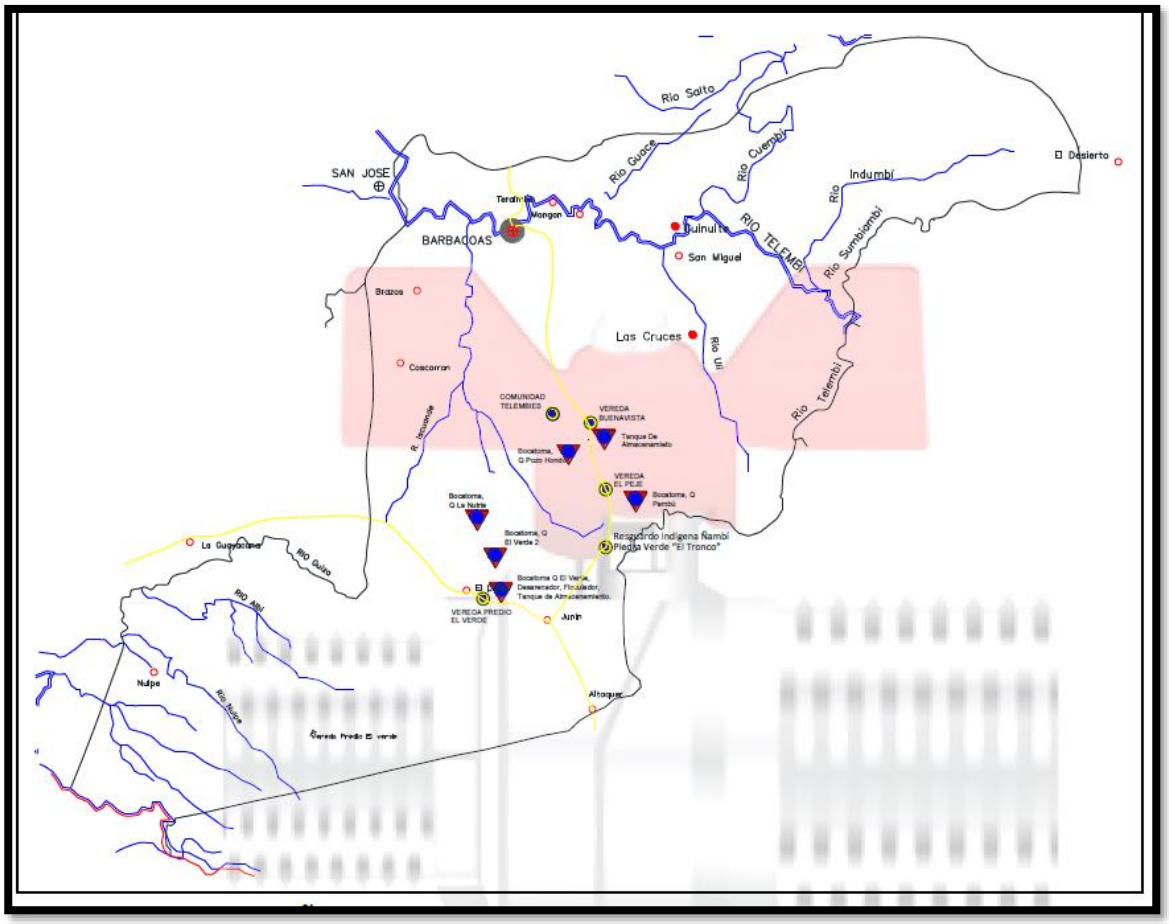

Se generaron en ambos territorio de Barbacoas y Roberto payan diálogos de saberes con la comunidad y mujeres y diferentes agentes sociales del territorio e intercambio de experiencias en : Usos del agua. (pecuarios, agricultura, riego y otros). Diálogos con los gobernadores de las zonas donde se dio respuesta a sus dudas frente al proyecto. En este sentido. Se Realiza un trabajo comunitario para abordar temas de agua enfocados en la captación, distribución, trabajo social y visitas a la infraestructura, en el marco de los esquemas diferenciales y la Resolución 844. Espacio de dialogo y preguntas claves.

Para Fortalecer la participación ciudadana y la comprensión de la importancia del agua para el bienestar de las comunidades. **Para esto** se realizó una reunión inicial con líderes comunitarios para presentar el objetivo del trabajo comunitario y acorde a las obras.

En los recorridos, que se hicieron a la infraestructura y corroborando los diagnósticos que existen se identifican y registran los siguientes daños:
• Desplomes • Desalineaciones • Cambios de aspecto en la masa • Fisuras estructurales • Deflexiones y movimientos • Fracturas y aplastamientos • Erosión • Descascaramiento • Exfoliación • Hinchamientos y reventones • Decoloración y manchado • Eflorescencias • Expansión,

Se vista además las fuentes de captación en donde destaca una estructura se encuentra construida en la quebrada Pozo Hondo, la cual no hace parte del abastecimiento general de la vereda, pero es utilizada por algunas viviendas aledañas que se encuentran en puntos más bajos de la captación. Su fuente de abastecimiento muestra un caudal pequeño e incapaz de abastecer un gran número de usuarios, su ubicación geográfica está dada en la coordenada Latitud 1°29’3,30”N -Longitud 78°4’41,22”O y con el agravante de que su altura respecto a la cabecera muy baja. Esta captación cuenta con una infraestructura en concreto reforzado que consta de muro trasversal,

Sobre Roberto payan días 28 y 29 de agosto, con el fin de evaluar el avance de la construcción del acueducto en las veredas Sante y Conquista. La visita se centró en la inspección del sitio donde se construirá la bocatoma y en el desarrollo de actividades de trabajo comunitario en compañía de la alcaldía municipal.

Se realizo lo siguiente.

- Evaluar el estado actual del proyecto de construcción del acueducto.
- Inspeccionar el sitio seleccionado para la construcción de la bocatoma.
- Fortalecer los lazos con la comunidad y obtener retroalimentación sobre el proyecto.
- Identificar posibles desafíos y oportunidades para garantizar el éxito del proyecto.

Ambas comunidades se tuvieron espacios de dialogo y Reuniones con ambas alcaldías: Se sostuvo una reunión con representantes de la alcaldía municipal para coordinar las actividades de la visita y revisar los avances del proyecto.
Además se visitó el territorio: Se evaluaron aspectos como la disponibilidad de agua, mediante diálogos con la comunidad y cartografía social. Se llevó a cabo una reunión informativa con los habitantes de las veredas Sante y Conquista para presentar los detalles del proyecto, resolver dudas y escuchar sus inquietudes.
el acceso al sitio y la factibilidad de la construcción de una planta compacta.

Trabajo comunitario: Se realizaron actividades en conjunto con los habitantes de las veredas, como la limpieza del terreno donde se construirá la bocatoma y la preparación de materiales para la construcción.
Taller de capacitación: Se impartió un taller a los miembros de la comunidad sobre el funcionamiento de un sistema de acueducto y la importancia del mantenimiento de las instalaciones.
La comunidad mostró gran interés y entusiasmo por el proyecto. Los habitantes se mostraron dispuestos a colaborar en las actividades de construcción y mantenimiento del acueducto.Necesidades de la comunidad: Se identificaron algunas necesidades adicionales de la comunidad, como la capacitación en temas de saneamiento básico y la dotación de equipos para el mantenimiento del sistema.

Caminando en Unidad
por la Pervivencia
inkal Awá

Conclusiones y recomendaciones:

- Se evidencia que en La vereda Predio Verde corresponde a los resguardos indígenas el Gran Sábalo, Pulgande – Tronqueria y Tortugaña Punde Bravo, en la actualidad se cuentan con servicio de acueducto, el cual es deficiente debido que el servicio se presta de manera intermitente. Se realiza el recorrido a la infraestructura del sistema de abastecimiento, encontrando una bocatoma, desarenador, sistema de floculación, caja de válvulas, tanque de almacenamiento y red de conducción. A continuación, se describe cada una de las estructuras.

- Se videncia tanto en Las comunidades de Barbacoas y Roberto payan que: En la actualidad los pobladores de la comunidad El Tronco se abastecen de las aguas lluvias, las cual son almacenadas en tanques plásticos, recolectadas por los techos de las viviendas; la mayor dificultad se presenta en época de verano donde los habitantes de esta comunidad y se ven obligados a proveerse del líquido en la quebrada Pailón la cual está en la parte baja del caserío. En otras ocasiones la población es abastecida por vehículos Carrotanques que son gestiones municipales o recursos propios para traer este líquido.

- La participación de la comunidad es fundamental para el éxito del proyecto. Es necesario realizar algunas adecuaciones en el sitio de la bocatoma antes de iniciar la construcción. Se recomienda fortalecer la capacitación de la comunidad en temas de operación y mantenimiento del sistema de acueducto.Se sugiere incluir en el proyecto actividades de promoción de la salud y la higiene para aprovechar al máximo los beneficios del acceso al agua potable.

Nota: Se ha socializado frente a las entidades territoriales, beneficiarios o partes interesadas los canales habilitados para acceder a los planes, programas y/o proyectos del MVCT y la no existencia de tramitadores y se exhorta a denunciar a las entidades pertinentes en caso de ocurrencia.

EL PRESENTE DOCUMENTO SE FIRMA POR LAS PARTES EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD			
JEFE INMEDIATO / SUPERVISOR DEL CONTRATO		**FUNCIONARIO O CONTRATISTA**	
FIRMA		**FIRMA**	
NOMBRE		**NOMBRE**	Juan Carlos Alvarez Londoño

ANEXOS	
PASABORDOS	SI
SOPORTES DE GASTOS DE VIAJE (SI APLICA)	SI
OTROS ANEXOS (SI APLICA)	N.A

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/gti-plt-01-politica-de-tratamiento-y-proteccion-de-datos-personales-2.0.pdf
