ACTA SEGUIMIENTO PROYECTO QUE SE EJECUTA BAJO EL CUR 866 DE 2019.

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., Colombia, 10 de septiembre de 2024
HORA:	De 11:00 a.m. a 11:45 a.m.
LUGAR:	**Reunión Virtual – Municipio de Pailitas Cesar - PDA del Cesar - Comité de seguimiento al proyecto que se ejecuta bajo el CUR 866 de 2019.**
ASISTENTES:	Phanor Duque Quintero, Apoyo a la supervisión Subdirección de Proyectos – VASB. Camilo Andrés Clavijo Chogó – Secretario de Planeación Municipio de Pailitas. Johana Cujia – Funcionaria de la secretaria de Planeación del municipio de Pailitas Holger Pabón – Supervisor del proyecto por parte de Aguas del Cesar S.A. E.S.P.
INVITADOS:	N.A.

ORDEN DEL DIA:

Comité de seguimiento al proyecto "Optimización del sistema de acueducto y construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales del Corregimiento de Palestina Municipio de Pailitas Departamento del Cesar", que se ejecuta bajo el marco del convenio 866 de 2019.

1. Tema 1: Seguimiento a los avances de puesta en operación de la PTAR.
2. Tema 2: Avances para la liquidación del CUR 866 de 2019.

DESARROLLO:

1. Tema 1: Seguimiento a los avances de puesta en operación de la PTAR: por parte del municipio de Pailitas se informa que se viene ejecutando adecuadamente las actividades contratadas con el proceso MC-37-202, el cual contempla las siguientes acciones:

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
1	ACTIVIDADES MANTENIMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO		
1.1	MANTENIMIENTO DECAMARAS DE INSPECCION (manhoil) CON EQUIPO DE PRESION-SUCCION.	UNIDAD	24,00
1.2	MANTENIMIENTO DE TUBERIAS DE ALCANTARILLADO CON EQUIPO DE PRESION-SUCCION (INCLUYE SENSIBILIZACION AMBIENTAL A LOS HOGARES SOBRE EL BUEN MANEJO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO CON MATERIAL EDUCATIVO	ML	1.353,45

Adicional a las actividades expuestas en el cuadro anterior, también se informó por parte del municipio que después de realizar la limpieza de los pozos de inspección de alcantarillado en el corregimiento de Palestina en el municipio de Pailitas, se contrato la actividad de revisión y mantenimientos a las bombas que ponen en operación y funcionamiento la PTAR construida con el proyecto del CUR 866 de 2019, las cuales se encontraban obstruidas por el material de arrastre que estaba ingresando a la PTAR, una vez realizado el mantenimiento y la revisión se puso en operación la PTAR con una de las bombas. La otra bomba debido a una descarga eléctrica sufrió daños en el bobinado por lo cual se debe enviar a reparar.

Con el fin de mostrar evidencias de lo realizado por el municipio de Pailitas este realiza una presentación con evidencia fotográfica y fílmica de los trabajos desarrollados por el municipio para la puesta en operación y funcionamiento de la PTAR, con lo cual se da cumplimiento al compromiso establecido a través de los diferentes comités de seguimiento al proyecto (Se anexan imágenes de lo expuesto por el municipio).

En la imagen se evidencia el daño que tenía uno de los pozos de alcantarillado, el cual fue sellado y reparado para evitar el ingreso de aguas de escorrentía y material de arrastre en temporada de lluvias.

Se evidencia el mantenimiento a las bombas que se tienen para la operación y funcionamiento de la PTAR.

Mantenimiento y limpieza de las redes y pozos de inspección de alcantarillado con equipo especializado "BACTOR", con el fin de tener las redes en óptimas condiciones de operación y funcionamiento del todo el sistema de alcantarillado.

Además, el municipio con el mantenimiento realizado a las bombas de la PTAR se evidencio que el inversor eléctrico de la PTAR sufrió averías por una descarga eléctrica que se presentó por una tormenta en el corregimiento de Palestina municipio de Pailitas donde se encuentra ubicada la PTAR, por lo anterior se realiza la solicitud al ejecutor del proyecto Aguas del Cesar S.A. E.S.P., de revisar el componente eléctrico del proyecto, ya que la PTAR por los equipos y paneles solares instalados para su operación y funcionamiento debe contar con una red de protección eléctrica frente a los eventos como tormentas eléctricas, situación que es apoyada por el apoyo a la supervisión del Convenio por parte del MVCT.

Al respecto, el supervisor del proyecto por parte de la empresa Aguas del Cesar S.A. E.S.P., informó que realizará la verificación del componente eléctrico del proyecto con el fin de establecer los componentes contratados para el proyecto en la parte eléctrica y de esta manera definir a quien corresponde la responsabilidad de reponer o adecuar el inversor que se afecto con la descarga eléctrica.

2. Tema 2: Avances en la liquidación de los contratos derivados con los que se ejecutó el proyecto:

El ejecutor del proyecto Aguas del Cesar S.A. E.S.P., a través del supervisor del proyecto, informó que se están revisando y verificando las actas de vecindad de cierre que se realizaron con la ejecución del proyecto.

Adicionalmente que el compromiso de la empresa es realizar la liquidación de los contratos derivados finalizando el mes de septiembre ya sea de manera unilateral o bilateral, según las circunstancias que se presenten para realizar dicho proceso.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Adecuación motobomba de la PTAR por daño en el bobinado.	Municipio de Pailitas	27 de septiembre de 2024.
2	Consulta sobre protección eléctrica a la PTAR.	PDA del Cesar	27 de septiembre de 2024.
3	Liquidación de contratos derivados del CUR 866 de 2019.	PDA del Cesar	30 de septiembre de 2024.

Asistencia a la reunión Virtual

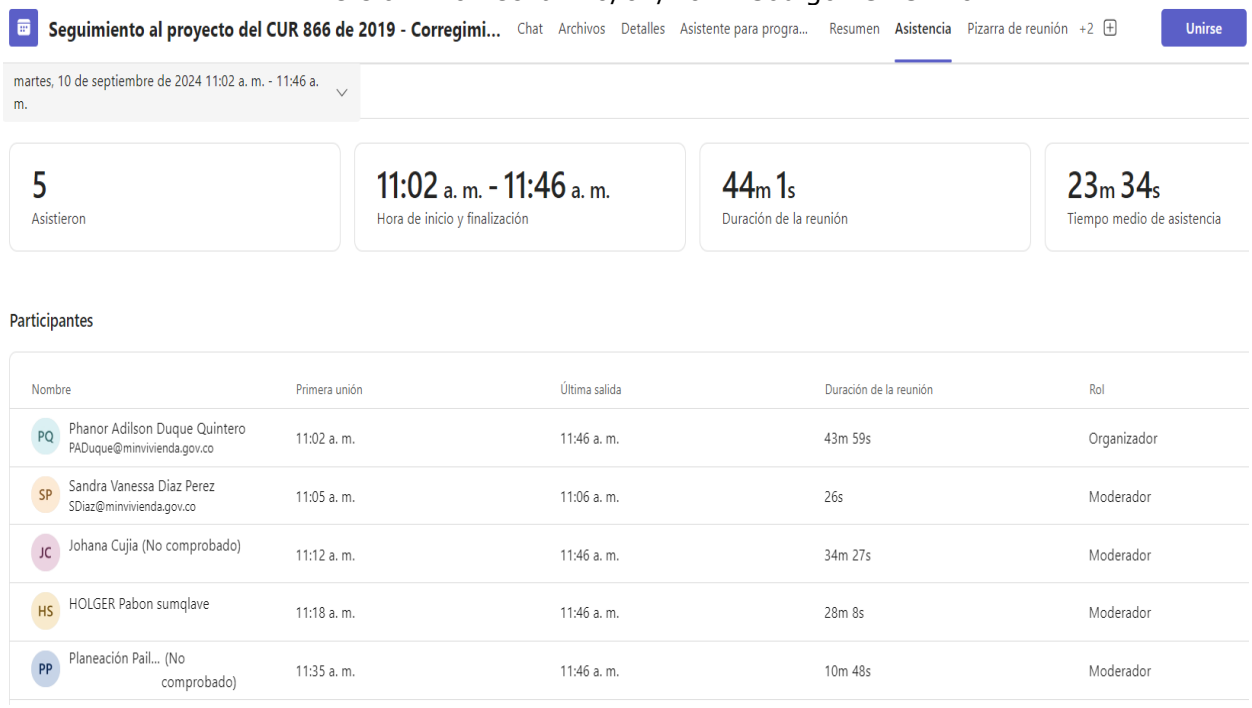

Enlace de grabación de la reunión:

Seguimiento al proyecto del CUR 866 de 2019 - Corregimiento de Palestina, Municipio de Pailitas-20240910_112006-Grabación de la reunión.mp4

FIRMAS:



Phanor Duque Quintero
Apoyo a la Supervisión CUR 866 de 2019

Elaboró: Phanor Duque Quintero
