ACTA No. 6 - Julio 2024

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 18 de julio de 2024.
HORA:	9:00 a.m. a 10:30 a.m.
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Relacionados en Firmas
INVITADOS:	Relacionados en Firmas

ORDEN DEL DIA:

1. Proyecto Alcantarillado Sanitario Vélez Guayabos
2. Proyecto Acueducto el Socorro – CUR 1116-2020
3. Proyecto Plan Maestro acueducto alcantarillado de Vélez
4. Proyecto Acueducto Lebrija.
5. proyecto Mogotes.

DESARROLLO:

1. Proyecto Alcantarillado Sanitario Vélez Guayabos

La ESANT – Ing. luz Yaneth Niño informa que la Esant presiona al Municipio para que se tramiten las servidumbres faltantes.

El Municipio realiza invitación a ESANT y MVCT para el 1 y 2 de agosto de 2024 de visita para revisión de servidumbres, ya realizaron revisión de planos con Interventoría los cuales están bien, para programar visita lo más pronto posible.

2. Proyecto Acueducto el Socorro – CUR 1116-2020

El contratista de Interventoría y la ESANT realizan reunión, de revisión final de documentos, para iniciar La ejecución del acta de recibo final, entre la ESANT, Contratista de Obra e Interventoría y entrega al Municipio.

El Ministerio solicita el acta de entrega del proyecto, acta de funcionalidad y liquidación del convenio.

3. Proyecto Plan Maestro acueducto alcantarillado de Vélez

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co

Se está pavimentando Cll 10 entre Cra 5-6. se termina el 25 de julio de 2024 Y cll 11 entre Cra 4-5 se termina el 26 de julio de 2024.

Se continua frente de trabajo con piedra Barichara en La cll 11 entre 7 y 8, de acuerdo con avance se debe terminar el 20 de julio de 2024.

Las obras por ferias y fiestas se suspenden del 15 de julio de 2024, hasta el 12 de agosto de 2024.

La Cra 6 definitivamente el Municipio no autoriza la intervención hasta el 12 de agosto de 2024.

4. **Proyecto Acueducto Lebrija**

Se presenta cambio de coordinador en planeación Municipal de Bucaramanga, y la licencia se encuentra en tramite.

5. **Proyecto acueducto para el Municipio de Mogotes**

El Ministerio envio correcciones a la ESANT de oficio y cronograma para ser tramitados por la ESANT y Municipio el 2 de julio de 2024, de solicitud de otrosí No. 1 de ampliación en plazo

La Esant radica el otrosí de modicacion del convenio 1373 de 2023 el 5 de julio de 2024.

Con informe 6 semanal del 21-06-2024, se tiene avance del 0.85% ejecutado contra un 0,08% programado. A la fecha se está realizando revisión de la información del proyecto. Se realizo cierre de 31 actas de vecindad y se inició con excavación, instalación y relleno de tubería de PVC presión D=4" RDE 21.

La Esant envía oficio al contratista de obra e Interventoría el 4 de julio de 2024, solicitando ejecución de actividades contractuales.

La Esant se encuentra preparando la entrega de reformulación No. 1 al Ministerio para la primera semana de agosto de 2024.

COMPROMISOS (Si aplica)

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Programación visita a Vélez Guayabos	Municipio	1-08-2024
2	Reunión contratista obra e interventoría con Esant- revisión entrega de proyecto a Municipio Socorro	Contratista de Obra e Interventoría- Esant	25-07-2024
3	Entrega de pavimento de la cll10 entre Cra.5-6 y cll 11 entre Cra.4 -5 proyecto PMAA	Contratista de obra.	25-07-2024
4.	Trámite de otrosí de ampliación en plazo a la ESANT. Proyecto Mogotes.	ESANT – Municipio de Vélez	11-07-2024

FIRMAS:

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co

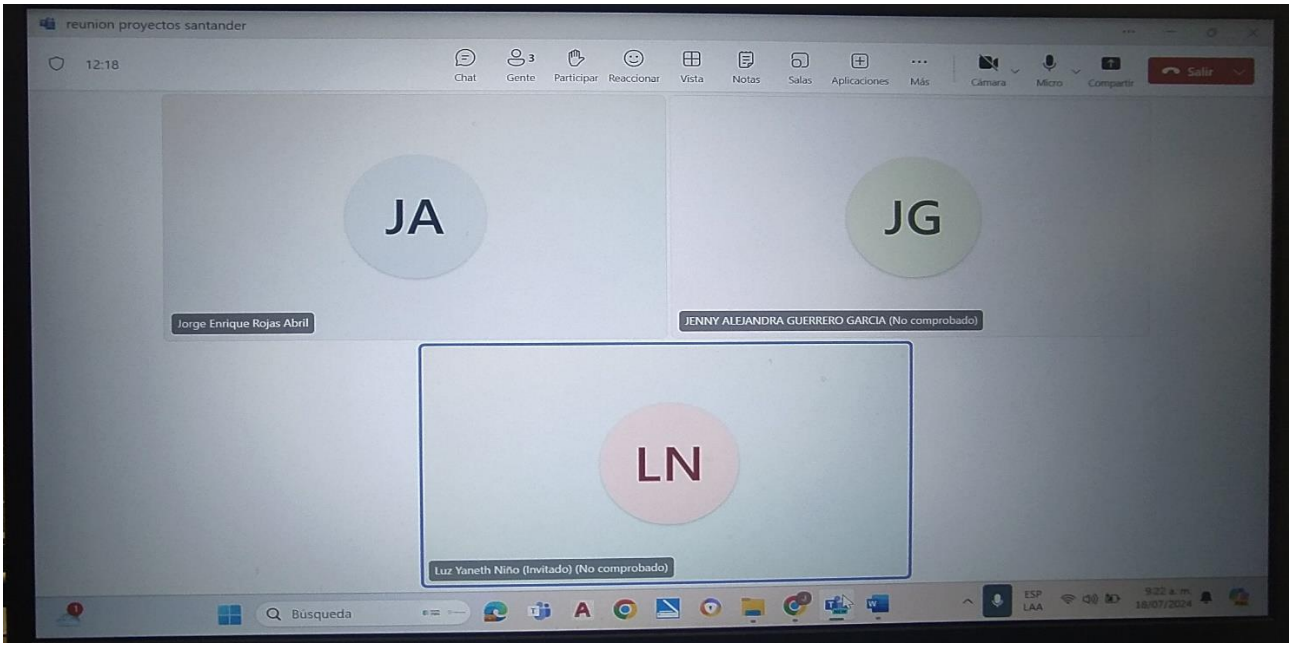

Anexos: (Opcional)

Elaboró: Jorge Enrique Rojas
Revisó:
Fecha: julio 18 de 2024

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co
