ACTA MESA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO

DATOS GENERALES

FECHA:	17 de octubre de 2024
HORA:	De 2:45 pm a 3:45 pm
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	1. Plan Departamental de Aguas: Luisa Berrio- Apoyo Área Técnica a la supervisión Rubén Ely- Jefe Área Técnica Aguas de Córdoba 2. Contratos Derivados Naira Hernández- Consorcio constructor 2021 Lennin Cuello- Consorcio Acueducto San Antero 3. AQUALIA Vellojin Argel, Ana Apoyo a la Supervisión 4. MVCT: Deissy Natalia Moreno Avendaño – Apoyo supervisión del convenio

ORDEN DEL DIA:

1. Mesa Técnica de seguimiento al Convenio CUR 1007-2020 - OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DE SAN ANTERO Y DEL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO EL PORVENIR EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTERO.
2. Gestiones para tramitar
3. Compromisos.

DESARROLLO:

1. Se realiza Mesa Técnica virtual de seguimiento al avance del proyecto.

   Respecto a los compromisos establecidos previamente, PDA informa se hizo el cargue de los informes de interventoría en el aplicativo SIGEVAS, quedando únicamente pendiente el último informe que corresponde al No. 22 correspondiente al corte de septiembre- octubre y el cual se encuentra en

revisión. Se resalta en este informe se reportó un avance del 52.65% vs un porcentaje planeado de 52.79%

Referente al avance de gestiones frente al predio donde se realizarán intervenciones de captación, PDA informa se han realizado dos requerimientos al Municipio para obtener

Desde el MVCT se solicita a las partes informar las actividades establecidas como ruta crítica, y las gestiones que se requieren adelantar a fin de culminar las obras dentro del plazo previsto.

Desde interventoría explica que en el transcurso del proyecto se han adelantado intervenciones en los componentes de la línea de captación a la planta, actividades propias de la planta, línea planta – tanque y la línea tanque porvenir. Se informa que el componente que no presenta avance es lo relativo a la captación y respecto a la optimización de la planta presenta un avance del 33% de ejecución, cuyas actividades se retomarán el día lunes 21 de octubre de 2024.

En relación con las líneas de conducción se encuentra pendiente la construcción de los cruces especiales y los cruces por los Box Culvert, en referencia al tanque se encuentra pendiente la conexión para inicio de operación, actividad que es parte de los compromisos del contratista adquirió frente a AQUALIA para el inicio del funcionamiento del tanque.

Interventoría informa que, frente al componente de captación, no se ha podido avanzar ya que a la fecha persisten los altos niveles del río y esta es una zona de inundación del municipio de Lorica por lo que no se han podido adelantar intervenciones, así como también se indica que el predio donde se instala la tubería, si bien es propio, está dentro de otro predio privado, el cual el propietario no permite el ingreso.

Aqualia informa que desde el mes de mayo de 2024 se autorizaron los trabajos al contratista para la intervención de actividades en la captación San Antero, lo cual corresponde a la instalación de 330 m lineales en tubería de polietileno de 16 in; por lo anterior en el mes de junio de 2024; no obstante, y si bien el predio contempla una servidumbre mediante escritura, el propietario del predio no permitió la ejecución de actividades. Por lo anterior desde Aqualia se hizo las gestiones para contar con el acompañamiento de la Policía Nacional, sin embargo, esta entidad informó se requiere colocar una queja de hecho para hacer el respectivo proceso.

Se recalca desde Aqualia que en el marco del Convenio esta obligación compete al municipio, cuya entidad como parte de la viabilidad del proyecto, emitió la sana posesión y servidumbre de toda el área que contempla el proyecto; por lo que junto con Plan departamental de agua se ha instado a que el municipio haga parte de esta gestión.

Aqualia informa que el contratista ya cuenta con los insumos en el sector para hacer la intervención, por lo que se tiene previsto que una vez bajen los niveles de río en el mes de diciembre o principios de enero, se adelante la intervención la cual tiene un tiempo de ejecución de una semana, por lo que para esa fecha se requerirá del acompañamiento policivo, al respecto es necesario la gestión del municipio.

A solicitud del MVCT, delegada de Aqualia aclara que la gestión del predio afecta el área de instalación de la tubería que sale de la captación hacia la carretera, ya que el área de captación como tal el contratista puede adelantar los trabajos electromecánicos.

Desde el MVCT se solicita a las partes informar si se tienen gestiones o actividades adicionales dentro de la ruta crítica para exponer en la presente mesa técnica, de modo que se pueda adelantar con antelación las respectivas gestiones. Las partes indican que no se tienen temas a tratar.

A solicitud del MVCT, interventoría informa que las pólizas se encuentran actualizadas y aprobadas conforme al último modificatorio del contrato de obra.

2 Gestiones para tramitar

Desde el MVCT se realizará contacto con el Municipio de San Antero para revisar gestiones frente al predio por el cual se requiere instalación de tubería.

3 Compromisos

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Cargar Informe mensual No. 22 de Interventoría (Está en revisión).	PDA	
2	Informar avance gestiones frente al predio donde se realizarán intervenciones de captación.	PDA	

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
3	Citar a próxima mesa técnico de seguimiento incluyendo al Municipio de San Antero	MVCT	29-Oct-2024

FIRMAS:

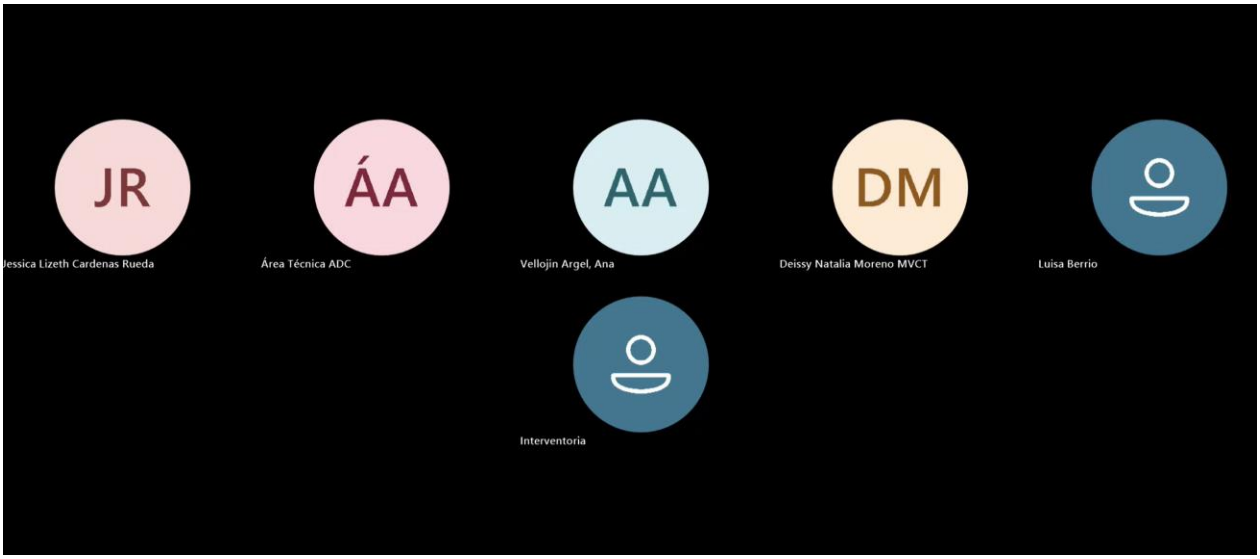

Elaboró: Deissy Natalia Moreno Avendaño – Contratista MVCT
Revisó: -
Fecha: 24 de octubre de 2024
