ACTA MESA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DEL CUR 892 Y 894 DE 2021

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., Colombia, 26 de noviembre de 2024
HORA:	De 4:00 a 5:00 p.m.
LUGAR:	**Reunión Virtual Microsoft Teams**
ASISTENTES:	Por MVCT: Phanor Duque Quintero, Apoyo a la supervisión Subdirección de Proyectos - VASB Por Aguas del Cesar S.A. E.S.P.: Jaime José García, jefe OAP ADC
INVITADOS:	N.A.

ORDEN DEL DIA:

1. **Pelaya CUR 892 de 2021** – Proyecto: CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE SAN BERNARDO, MUNICIPIO DE PELAYA, DEPARTAMENTO DEL CESAR.
   - Reintegro de recursos del CUR 892 de 2021 para la liquidación de este.

2. **Curumaní CUR 894 de 2021** – Proyecto: OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE SAN SEBASTIAN, MUNICIPIO DE CURUMANI, DEPARTAMENTO DEL CESAR.
   - Avance en las actividades necesarias para la adjudicación de los contratos derivados.

DESARROLLO:

1. **Pelaya CUR 892 de 2021** – Proyecto: CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE SAN BERNARDO, MUNICIPIO DE PELAYA, DEPARTAMENTO DEL CESAR.

Reintegro de recursos del CUR 892 de 2021 para la liquidación de este: Por parte del ejecutor del proyecto Aguas Cesar S.A. E.S.P. se informó que ha conversado con el funcionario encargado de la plataforma GESPROY con la cual manejan los proyectos que tienen recursos del Sistema General de Regalías y me dijo que iba a retomar el tema, por que tiene una cantidad de cosas como pendientes y no ha avanzado.

Aguas del Cesar a través de la supervisión al convenio, mediante oficio reiterará la solicitud de reintegro de recursos ante el encargado del manejo de la información del proyecto en la oficina de planeación del departamento del Cesar, poder dar cierre al convenio 892 de 2021.

2. **Curumaní CUR 894 de 2021** – Proyecto: OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE SAN SEBASTIAN, MUNICIPIO DE CURUMANI, DEPARTAMENTO DEL CESAR.

Avance en las actividades necesarias para la adjudicación de los contratos derivados: Se informó por parte del ejecutor del proyecto Aguas del Cesar S.A. E.S.P., que el proceso contractual de obra se encuentra en estado adjudicado conforme a la resolución 551 de adjudicación de la licitación de fecha 6 de noviembre de 2024.

La cual resuelve según el artículo primero: Adjudíquese el contrato derivado del proceso de selección Licitación Pública LP 01 de 2024, cuyo objeto es "OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE SAN SEBASTIAN, MUNICIPIO DE CURUMANI, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR" al CONSORCIO C & G SAN SEBASTIAN conformado por la empresa GIMCOL S.A.S identificada con NIT. 900.484.682-4 con un porcentaje de participación del 20%; y la empresa INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURA S.A.S., identificada con NIT. 900.525.845-5, con un porcentaje de participación del 80%. El CONSORCIO está representado legalmente por el señor, AUGUSTO DAVID APONTE CELEDON, identificado con cedula de ciudadanía Nro. 77.090.048 de Valledupar, por un valor de DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON 89 CENTAVOS ($2.457.634.282,89), y un plazo de ejecución de SEIS (06) MESES.

Proceso licitatorio L-P 01 DE 2024, conforme al siguiente enlace:

Detalle del proceso: L-P 01 DE 2024

Para el proceso de interventoría se tiene que conforme al cronograma de la última adenda en el proceso están mencionando que se cerró el proceso de contratación el 18 de noviembre de 2024 y nos encontramos entre el informe de presentación de la oferta y la evaluación y publicación de la de la evaluación con fecha de plazo para publicar el 29 de noviembre de 2024.

Se anexa el enlace del proceso de interventoría C-M-A 05 DE 2024 en SECOP:

Detalle del proceso: C-M-A 05 DE 2024

Proceso de prórroga al convenio: Se reitera al ejecutor que deben presentar la solicitud de prórroga al Convenio 894 de 2021 por un año más, debido a que para ejecutar el proyecto no se contaría con el tiempo necesario para el desarrollo de este, ya que el convenio vence el 31 de diciembre de 2024. Por lo tanto, se da un ultimátum para presentar la solicitud de prórroga con la documentación soporte a más tardar a el 4 de diciembre de 2024, ya que se incumplió con la fecha establecida del 15 de noviembre de 2024.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Oficio reiterando la solicitud de reintegro de recursos ante el encargado del manejo de la información del proyecto en la oficina de planeación del departamento del Cesar. CUR 892 DE 2021. Pelaya – Cesar.	Aguas del Cesar S.A. E.S.P.	4 de diciembre de 2024.
2	Solicitud formal de prórroga al CUR 894 de 2021. Curumaní - Cesar	Aguas del Cesar S.A. E.S.P.	4 de diciembre de 2024.

Asistencia a la reunión Virtual:

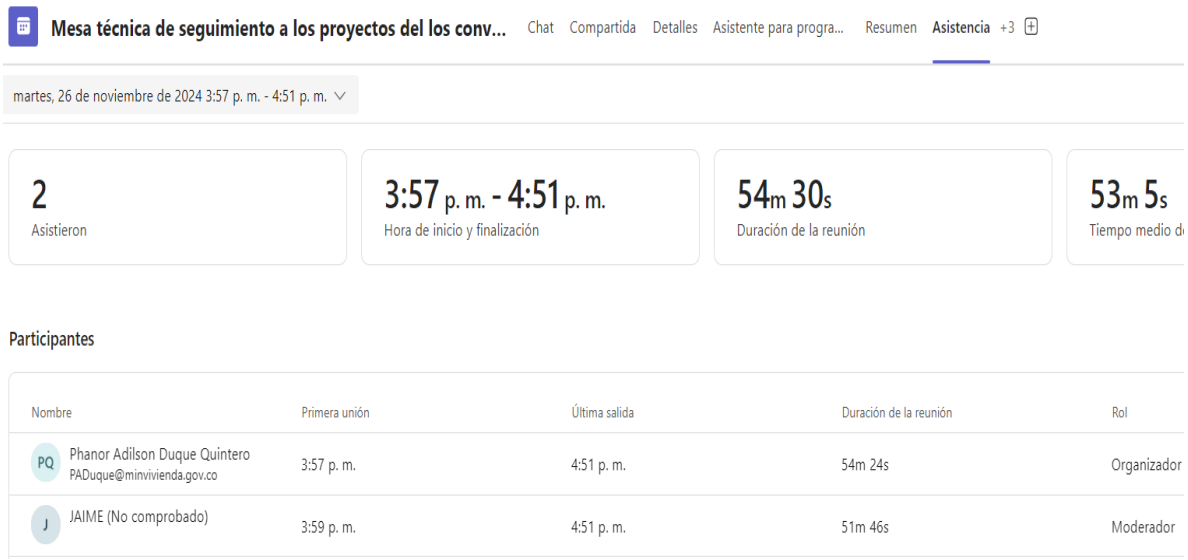

Enlace de grabación de la reunión:

Mesa técnica de seguimiento a los proyectos del los convenios 892 y 894 de 2021-20241126_160549-Grabación de la reunión.mp4

FIRMAS:



Apoyo a la Supervisión –
Phanor Duque Quintero

Elaboró: Phanor Duque Quintero
