ACTA DE REUNIÓN 01 DE NOVIEMBRE DE 2024

DATOS GENERALES

FECHA:	1 de noviembre de 2024
HORA:	De 2:00 pm a 3:00pm
LUGAR:	**Microsoft Teams**
ASISTENTES:	Juan Miguel Perilla – Ingeniero de seguimiento MVCT Juan Carlos Paredes - Ing. Supervisión FINDETER Fernanda Villegas – Auxiliar de Obra Grupo More Oscar Aranda – Director Grupo MORE Andrés Caviedes – Contratista Obra Grupo MORE Jader Carbonero – Contratista Obra Grupo MORE Claudia Mendoza – Social Obra Grupo MORE Carlos Soto - Interventoría INTER JCD Luisa González - Contratista Interventoría INTER JCD Mario Triana – SST Interventoría Jesús Ruiz - Supervisión EMCASERVICIOS S.A Carlos Zapata – Apoyo EMCASERVICIOS S.A Laura Bastidas - Apoyo EMCASERVICIOS S.A Olaya Larrahondo - Emquilichao E.S.P Edwin Salcedo – Municipio de S. de Quilichao
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

El día de 1 noviembre de 2024 se convocó comité virtual para hacer seguimiento del avance del proyecto CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO QUITAPEREZA CABECERA MUNICIPAL DE SANTANDER DE QUILICHAO -CAUCA

1. Verificación entidades asistentes
2. Lectura acta anterior
3. Informe de avance del contrato de obra PAT-ATF-O-043-2023
4. Compromisos

DESARROLLO:

Inicia la presentación del avance de obra mediante la proyección simultanea de diapositivas, en lo cual se evidencia en el periodo semanal comprendido entre el 21 al 27 de octubre, los porcentajes de avance de obra corresponde a los siguientes:

1. Porcentaje de obra programada esta semana es del 97,83%.

2. Porcentaje de obra ejecutado y aprobado por la Interventoría es de 97,95%, con lo cual, se tiene un adelanto de 0.12%.

LAS ACTIVIDADES EJECUTADA EN OBRA DURANTE LA SEMANA EN MENCIÓN, SON:

1. En la estructura del tanque de almacenamiento: se realiza fundición del solado de limpieza, para iniciar con el armado de la caja de entrada de la estructura.

2. En la estructura correspondiente al Tanque de Filtros, se realizó el día 24 de octubre la fundición de la losa de cierre superior en la zona de vertedero, así mismo, se realiza la instalación de la tubería en PVC Corrugado de 14”, adicionalmente, se inicia con el montaje de las guillotinas y compuertas.

3. En cuanto al Tanque de sedimentador, se realiza la fundición de la caja de salida de la estructura, así mismo, se realizó la fundición de una parte del muro lateral colindante con el tanque de floculación.

4. En la estructura del Tanque de Floculación, se efectuó la instalación de la cinta Sika PVC en el perímetro de la estructura, de igual manera, el día 29 de octubre, se realiza la fundición de la losa de fondo, para dicha labor, se destinaron 25.3 m3 de concreto premezclado proveniente de la empresa SICON, así mismo, a dicho concreto se le realizaron las pruebas de calidad pertinentes en campo.

5. En la estructura del Tanque de Cloración, se efectúa la fundición de la losa de cierre superior de la caja de inspección frontal.

6. Consecuentemente, en la zona destinada para la dosificadora de cloro, se culminó la viga aérea de la estructura, además de, continuar con la pega de mampostería en la zona inmediatamente superior. En cuanto a, la caseta de Oficina y Vestier, se continuó con la instalación de la teja termoacústica para la cubierta, adicional a esto, se inicia con la instalación de la tubería de (1/2”) para el sistema eléctrico, con respecto al Laboratorio, se continua con la pega de mampostería y relleno de dovelas del sistema parcialmente reforzado.

7. Referente al cerramiento perimetral, se efectuó la conformación de la alfajía en un tramo de 52 metros.

8. Durante la semana llega a obra, las guillotina y/o compuertas provenientes de la empresa Saniaguas (26 de octubre), por otro lado, la tubería para el sistema eléctrico PVC Tipo A y Extra Fuerte SCH 40 Tubería certificada por el Retie, y la teja termoacústica.

9. En cuanto al componente de seguridad y salud en el trabajo, se evidencia refuerzo de señalización interna en la obra, principalmente donde se ubican los tanques de Sedimentador, Filtros y Cloración. Por otra parte, la empresa Emquilichao realiza recolección de residuos en obra. La Interventoría hace verificación e inspección preoperacional de maquinaria y equipos empleados en la jornada de fundición del día 29 de octubre.

10.En cuanto, al componente social, se recibe visita por parte de la entidad Findeter para verificación del avance físico de la obra, así como, designar compromisos para la culminación satisfactoria y puesta en marcha de la obra, en el tiempo de prorroga aprobado. Por otra parte, se reprograma el séptimo (7) comité de sostenibilidad para el día sábado 02 de noviembre, así mismo, se continua con la redacción de la respuesta al oficio de solicitud de la Sra. Florinda Casamachi con respecto a la construcción de muro de contención.

11. Con respecto al acta parcial N°06 de obra ya se encuentra radicada en la Fiduciaria, para desembolso.

12. El contratista de obra expresa que en articulación con la entidad Emquilichao, se está evaluando la posibilidad de realizar el trazado e instalación de la tubería a la red existente, por el sector Oeste de la obra, sin embargo, intervendría un predio privado, por lo cual, solicita al Municipio y a la empresa Emquilichao la ayuda en la solicitud del permiso requerido para la instalación de dicha tubería.

13. Durante la semana en mención, no se presentaron acontecimientos que atrasarán y/o afectarán el desarrollo normal de las actividades

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Realizar acta de reunión con los acuerdos definidos para la instalación de la tubería a la red existente, así mismo, anexarla en los respectivos informes de Interventoría y de obra.	Contratista de Obra, Interventoría	8/11/2024
2	Dar respuesta al oficio emitido por la Sra. Florinda referente a la construcción del muro.	Contratista de Obra	8/11/2024
3	Recepcionar lista con la respectiva información concerniente al personal de la empresa que se capacitará para el manejo y/o operatividad de la planta.	EMQUILICHAO	8/11/2024

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
4	Mejorar la instalación de la valla informativa, teniendo en cuenta que, está quede empotrada o fijada a un sistema rígido.	Contratista de Obra	8/11/2024
5	Programar prueba de estanqueidad y extender la invitación a los entes involucrados del proyecto para su participación y constatación.	Contratista de obra e interventoría	22/11/2024
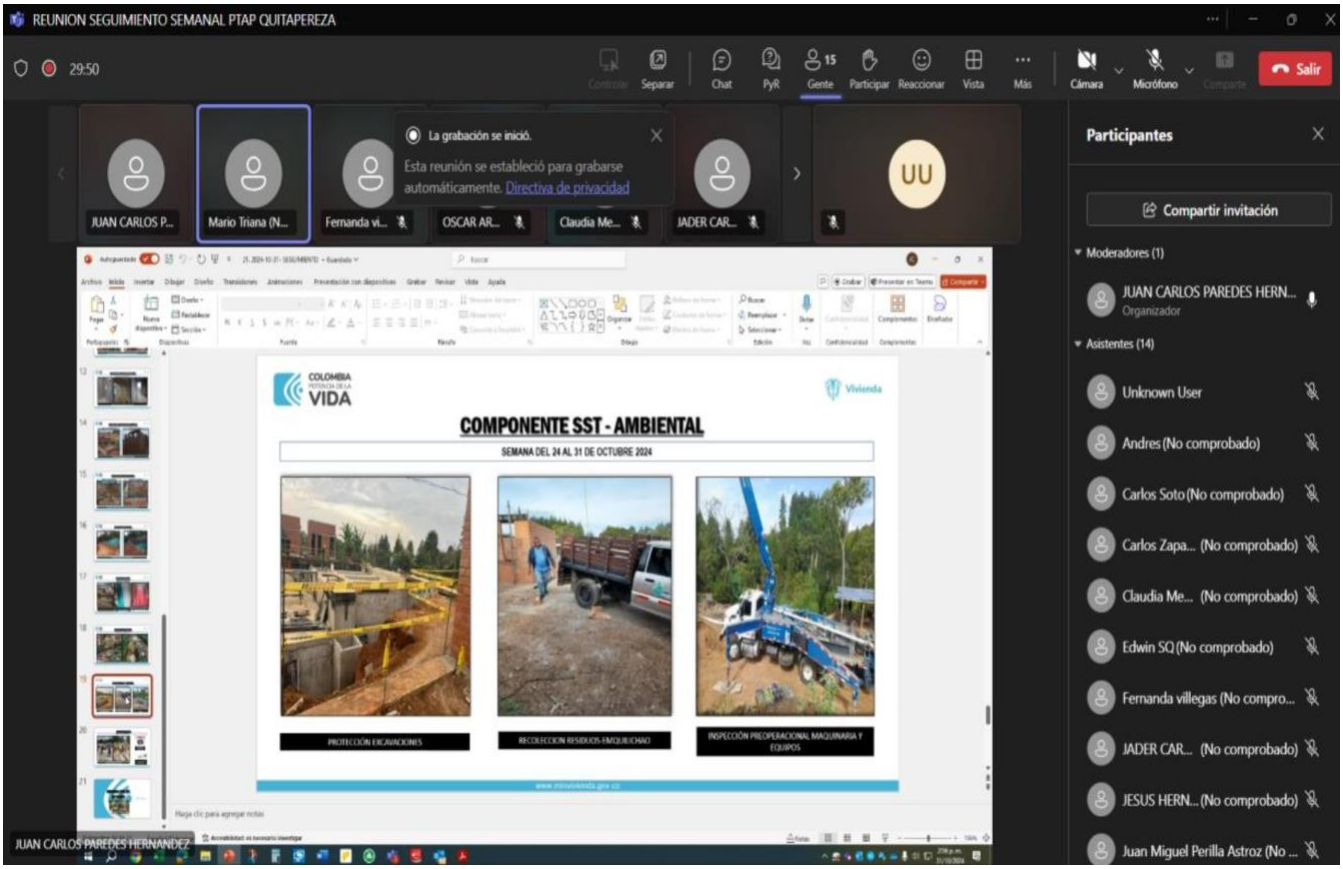
FIRMAS: Reunión Virtual
