ACTA REUNION

DATOS GENERALES

FECHA:	18 de diciembre de 2024
HORA:	De 10:00 a.m. a 12:00 m.
LUGAR:	Reunión presencial
ASISTENTES:	Se anexa listado de asistencia

ORDEN DEL DIA:

Seguimiento a los convenios

- CUR 800 de 2022 - Vigencia 22 diciembre 2024 (Obras 14 diciembre 2024)
- CUR 802 de 2022 - Vigencia 29 de enero de 2024, (Obras 29 de marzo 2024)
- CUR 1080 de 2022 – Vigencia 10 de mayo de 2025 (Obras 30 diciembre 2025)
- CUR 1082 de 2022 - Vigencia 26 de noviembre de 2024, (Obras 10 agosto 2024)

DESARROLLO

En cumplimiento del seguimiento a los convenios suscritos con el Municipio de Rionegro Antioquia, con asignación de recursos Nación, cuyo ejecutor es la Empresa de Desarrollo Empresarial Sostenible de Oriente - EDESO, y el municipio de Rionegro, se realizó reunión virtual que contó con la participación de la administración municipal de Rionegro, la EDESO, el MVCT.

1. CUR 800 DE 2022: CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS DEL CENTRO POBLADO GALICIA PARTE ALTA SECTOR RINCÓN SANTO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO.

Estado de los contratos derivados: Suspendidos, EDESO informó que continúan los contratos de obra e interventoría suspendidos, por lo que los indicadores de avance no se modifican.

- Avance físico programado	98 %	Suspendido 10 de septiembre 2024
- Avance físico ejecutado	92.21 %	atraso 8%
- Avance financiero programado	98 %	
- Avance financiero ejecutado	87.8 %	

El MVCT solicitó se definiera el tiempo de la suspensión dado que se solicitaron 2.5 meses, pero el CDP que se diligencio vence el 31 de diciembre de 2024, por lo que se

estaba consultando, si por el cambio de vigencia se afecta la expedición del RP por parte del Municipio de Rionegro.

EDESO y el Municipio de Rionegro informó que se consultó el proceso de expedición de RP concluyendo que para el expedición del CDP en el año 2025, necesario para la adición del proyecto de obra e interventoría el proceso se iniciaría una vez se tenga el presupuesto de las obras de cimentación para el tramo de tubería entre los pozos de inspección C24 y C25, que esta programado para el 22 de enero de 2024, dado que se está gestionado la investigación con equipo robótico y CCTV para llevarlo acabo en las dos próximas semanas.

Posteriormente remitir al Consultor de los diseños este informe, obtener el concepto del diseñador, realizar las modificaciones recomendadas en los diseños del tramo, hacer el presupuesto, estructurar la reformulación técnica y económica y paralelamente solicitar el CDP mencionado, lo cual manifiesta el ejecutor se haría en un mes decir a más tardar el 22 de febrero de 2024.

Por último en se radicaría la reformulación en el Ministerio la cual se presentaría una vez expedido el CDP.

Así mismo, el Ministerio reiteró a las entidades la información que se encuentra pendiente por remitir al Ministerio.

- Respuesta al oficio con radicado 2024EE0084887 del 8 de noviembre de 2024
- Informe de interventoría sobre la intervención del tramo en el momento de la instalación de la tubería entre los pozos de inspección C24 y C25.
- En cuanto al informe de interventoría sobre el tramo de 125 metros, entre los pozos C24 y C32 concepto del diagnóstico.
- Concepto del diseñador sobre la situación presentada en el tramo del colector que presenta filtraciones excesivas, soportado en el diagnóstico realizado, que incluya la solución a las fallas que presentan los tramos afectados.
- Plan de contingencia para la reparación de los tramos que presentan fallas constructivas.
- Informe con el estado de la conexión eléctrica entre la PTAR y la EBAR.
- Protección tubería paso elevado.
- Estabilización del talud en la margen izquierda.

Por otra parte EDESO manifestó que se ha realizado una evaluación técnica y económica de las posibles alternativas de solución al tramo en estudio y se abstuvieron preliminarmente los siguientes costos de la solución planteada:

- Recursos para balance del contrato que incluyen mayores cantidades demolición de roca, volúmenes placa huella en: presupuesto mayores cantidades de obra demolición de roca, volumen de placa huella en el sector del Hoyo, concreto ciclópeo, escaleras del canal de entrada, mas las obras para recuperación del tramo en estudio $ 222.000.000, recursos para interventoría $ 147.000.000, para un costo total de $ 369.000.000. Presupuesto que será revisado por el supervisor del proyecto y la subgerencia de EDESO.

El MVCT verificó el avance en las observaciones a las obras ejecutadas y el estado en que se encuentran, estableciendo lo siguiente:

Caseta de operación de la EBAR**.**

- Instalación de equipos de bombeo pruebas, pasamanos. 13-12-24
- Conexión tubería de impulsión que debe realizar en acero a 45° o en PEAD romperla roca. 13-12-24
- Barandas escaleras y pasamanos alrededor del pozo. 13-12-24.
- Carpintería metálica ventanas 13-12-24
- Puente Grúa instalación 13-12-24
- Instalación de bombas. 13-12-24
- Empradización 13-12-24

En lo que tiene que ver con la planta de tratamiento de aguas residuales domesticas las observaciones pendientes por terminar corresponde a:

- Planta de emergencia y tableros, suministro pendiente 10-12-24
- Instalaciones eléctricas cableado-interno. Lámparas 80% 6-12-24.
- Conexión eléctrica entrega la PTAR y la estación de bombeo. 13-12-24
- Canal de entrada: Instalar barandas, pasamanos, rejillas, vertedero triangular. 13-12-24
- Carpintería edificios administrativos. Ventanas 13-12-24
- Recibo de las obras eléctrica e instalación de contador energía. 13-12-24.
- Planos récord y manual de operación. 13-12-24.

A la fecha la suspensión del convenio solicitada se encuentra en evaluación jurídica de la Subdirección de Proyectos y a la espera que la EDESO remita al Ministerio el oficio solicitando los 3 meses que considera necesarios, así como el cronograma de la suspensión.

2. CUR 802 de 2022: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO GALICIA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO

Estado de la contratación derivada: Suspendida desde el 11 de octubre de 2024

Convenió: Suspendido desde el 29 de octubre hasta el 28 de enero de 2024.

La EDESO informó que los indicadores de avance de las obras son los siguientes al 11 de octubre de 2024 fechas en las que se suspendieron los contratos de obra e interventoría:

- Avance físico programado 100 %
- Avance físico ejecutado 73.94 % 11 de octubre 2024 14%
- Avance financiero ejecutado 71.74 %
- Avance financiero programado 71.74 %

La solicitud de reinicio y prórroga del convenio está en revisión jurídica por parte de la Subdirección de Proyectos.

Se informó por parte de la EDESO que las obras pendientes por construir son:

- Instalación de la red de alcantarillado, conexiones domiciliarias 23 de 75, pozos y
- PIT de lodos
- Instalación de sistema de bombeo.
- Instalación de tanque lechos de secado
- Optimización de las instalaciones eléctricas (Tablero de control y red nueva)
- Arboles sembrados.

En cuanto a la compensación forestal EDESO radicó informe el 28 de noviembre de 2024 al Municipio de Rionegro, entidad que realizó observaciones las cuales fueron subsanadas y se remitió el informe el 6 de diciembre de 2024.

La administración municipal manifestó que el día 13 de diciembre de 2024 remitirá el informe a CORNARE.

3. CUR 1082 de 2022: CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO, ESTACIÓN DE BOMBEO E IMPULSIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS DEL CENTRO POBLADO GALICIA PARTE ALTA SECTOR LA YEE DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO-ANTIOQUIA.

Indicadores de avance: Continúan sin modificación dado que se están liquidando los contratos derivados de obra e interventoría.

- Avance físico programado 100 %
- Avance físico ejecutado 100 %
- Avance financiero ejecutado 89.4 %
- Avance financiero programado 100 %

La EDESO informó sobre el avance en la rectificación y corrección de observaciones quedando pendientes las siguientes.

- Planos récord y Manual de operaciones 13/12/2024
- Aprobación RETIE EPM Municipio Radicado en EPM Pendiente paz y salvo se consultará al contratista 9 de diciembre de 2024.
- Conexiones domiciliarias operador: La administración municipal informó que surgió un problema jurídico por lo que el contrato del operador no se dio el 1º de diciembre como estaba previsto. Debido a esto el Comité de Contratación informó que este año no va contratarse.
- Balance de las obras, acta final de obra: Se remitió oficio a la interventoría del cual no se ha recibido respuesta 6/12/2024
- Liquidaciones contratos derivados 12/12/2024
- Instalación de micromedidor acueducto: Pendiente.
- Actualización Sigevas Pendiente.

Al respecto el Ministerio reiteró que se debe dar celeridad a la consolidación de la documentación necesaria para la liquidación del Convenio 1082 de 2022, cuyo plazo de liquidación vence el 10 de febrero de 2024, y a la fecha no se tienen los documentos que se relacionaron en el oficio No. 2024EE0042494 del 11 de junio de 2024, previendo la terminación de las obras el 10 de agosto de 2024.

De otra parte el Ministerio manifestó que se hará los días 17 de y 18 de diciembre de 2024, la visita técnica de seguimiento y control para verificar el funcionamiento de la infraestructura construida en este proyecto en especial el funcionamiento de la EBAR y su descarga, por lo que solicitó que para el día 17 de diciembre de 2024, el operador temporal tenga en funcionamiento la Estación de Bombas y verificar la operación.

4. CUR 1080 de 2022: OPTIMIZACIÓN Y REPOSICIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO, Y OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE

TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS DEL CENTRO POBLADO GALICIA PARTE ALTA SECTOR POBLADO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO-ANTIOQUIA.

El Ministerio confirmó que el desembolso se había realizado el 3 de noviembre de 2024, por valor de $ 3.622.217.103, completando la totalidad de los recursos asignados al proyecto para su ejecución.

La administración municipal de Rionegro en su calidad de ejecutor informó que los porcentajes de avance del proyecto con corte a 6 de diciembre de 2024 son los siguientes:

- Avance físico programado 67 %
- Avance físico ejecutado 42 % Atraso del 25 %
- Avance financiero ejecutado 24.28 %
- Avance financiero programado 61 %

Obras en ejecución

- Construcción de pilas cimentación en concreto: 80% 4 pilas de 5, se espera que se pueda fundir los últimos 0.80 m de la quinta pila que cuenta con un a profundidad de 5 m

- Solución predial que afecta el proyecto.

  Vía de acceso al EDEN 260m.

  Señaló el municipio de Rionegro que los resultados de la audiencia pública en la inspección del 3 de diciembre 2024, fueron positivos dado que se definió que la vía de acceso al sector del EDEN era de propiedad del Ente Territorial aclarando a los propietarios que no tienen ningún derecho sobre esta vía. La inspectora solicitó a la administración que se remitiera es ese despacho el cronograma de actividades para ejecutar las obras en este sector lo cual a la fecha de la presente reunión está pendiente.

  Así las cosas, desde el 3 de diciembre de 2024, el Contratista de Obra puede intervenir, ente sector que cuenta con una longitud de 260 m. aproximadamente e implementar la solución aprobada por la interventoría y avalada por la administración municipal de Rionegro, desde el mes de agosto de 2024.

  Predio 124:

El municipio de Rionegro informó se encuentra gestionando el CDP para realizar la contratación de la firma evaluadora.

El Ministerio hace manifiesta su preocupación por que este tramo de aproximada mente 45 metros de longitud es fundamental para le funcionamiento del proyecto y las gestiones no avanzan con la celeridad necesaria para resolver el problema predial le cual nunca fue reportado oportunamente por el Contratista de obra ni la interventoría en los meses en que se llevó a cabo el replanteo de las obras es decir en julio y agosto del año 2023.

- Alcantarillado

  El municipio informó que una vez revisadas las especificaciones técnicas de EPM se verificó que si esta contemplado la prueba hidráulica de la tubería nueva que se instale. Sin embargo señaló que la prueba era complicada por lo que se haría una vez instalada la tubería se inspeccionaría cada uno de los tramos construidos para verificar su funcionalidad.

  Al respecto el Ministerio manifestó su inconformidad dado que con la inspección mencionada no se puede determinar si en las uniones de la tubería o en las sillas yee que conectan las conexiones domiciliarias existen filtraciones o exfiltraciones lo cual si se puede detectar con la prueba hidráulica de la red instalada. Por lo anterior esa cartera Ministerial sugiere que se realice esta prueba de conformidad con la especificación del poryecto.

  Otro frente de obra que se puede intervenir es el sector detrás de los tanques de acueducto (Valencia).

- Valla informativa:

  El ministerio informó que una vez que la administración municipal de Rionegro remitió los archivos y la información solicitada para la aprobación de la Valla Informativa del proyecto, la supervisión remitió a la DIDE la información para iniciar la gestión ante comunicaciones del MVCT, el día 3 de noviembre de 2024.

- Fabricación Biodiscos:
  La fabricante continua a la espera del pago por la fabricación de estos elementos que ahora depende de las cuentas que pague el municipio.

En cuanto a los elementos de fibra de vidrio, como el tanque de lechos de secado sedimentador, canal de aforo están fabricación.

En el aspecto financiero, el municipio de Rionegro informó que la interventoría autorizó el pago de tres actas parciales de obra y paso las cuentas de cobro en la primera semana de diciembre de 2024, las cuales se están revisando por parte de la Secretaria del Hábitat y una vez revisadas y avaladas, se pasaran en el día de mañana a la Secretaría de Hacienda municipal, para que emita la autorización de desembolsos a la fiduciaria y esta pague al contratista de obra.

Cuatas por pagar

Anticipo	$ 278.383.642 este pago es el primero que va a salir
Acta parcial 1:	$ 294.288.830
Acta parcial 2:	$ 248.032.730
Acta parcial 3:	$ 440.902.137
	$ 983.223.697

Hoy se radicará hoy a la Secretaria de Hacienda para autorizar al Encargo Fiduciario el pago de las cuentas relacionadas.

Por otra parte se informó que la solicitud del contratista referente a la solicitud de prorroga por 3.5 meses es decir hasta el 15 de abril de 2024, fue radicada por la interventoría el 21 de noviembre de 2024 y se encuentra en evaluación por parte del Ente Territorial.

El Ministerio solicita al Municipio de Rionegro que se remitan los informes semanales de e Interventoria 15, 16 y 17.

Se programa la reunión de seguimiento presencial para para el 18 de diciembre de 2024 a las 8:00 a.m. en la Secretaria del Hábitat del Municipio de Rionegro.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha cumplimiento
	Convenio CUR 1082 de 2022		

1	Inicio de operación de obras sector al YEE	M. Rionegro	1/12/ 2024 Incumplido
2	Verificación del funcionamiento y operación de la EBAR	M. Rionegro EDESO MVCT	17/12/2024
3	Liquidación contratación derivada obra e Interventoria	M. Rionegro EDESO MVCT	12/12/2024
4	Liquidación Convenio	EDESO	10/02/2025
	Convenio CUR 802 de 2022		
5	Reinicio de Convenio y contratación derivada	EDESO	16/12/2024
	Convenio CUR 800 de 2022		
6	Suscripción suspensión del convenio	M. Rionegro EDESO MVCT	22/12/24
7	Respuesta al oficio con radicado 2024EE0084887 del 8/11/2024	EDESO	Pendiente
8	Terminación de observaciones obras contractuales	Contratista de obra	13 /12/2024
	Convenio CUR 1080 de 2022		
9	Desembolso por parte del Ministerio desembolso 2 por $ 3.622.217.103	MCVT	30/11/2024.
10	Ajuste de alineamiento colector acorde con el replanteo realizado del Colector principal solicitan.	Contratista Interventoria M. Rionegro	3/12/2024 Incumplido
11	Informes mensuales de interventoría del mes de octubre de 2024	M. Rionegro	3/12/2024 Incumplido
12	Informes señales de Ejecutor M. Rionegro del mes de noviembre de 2024	M. Rionegro	29/10/2024 pendiente
13	Solicitud de Valla informativa	Ministerio	29/12/2024

Anexo: Asistencia a la reunión
Elaboró: Jairo Alberto Gómez Riaño
Fecha: 9-12-2024.

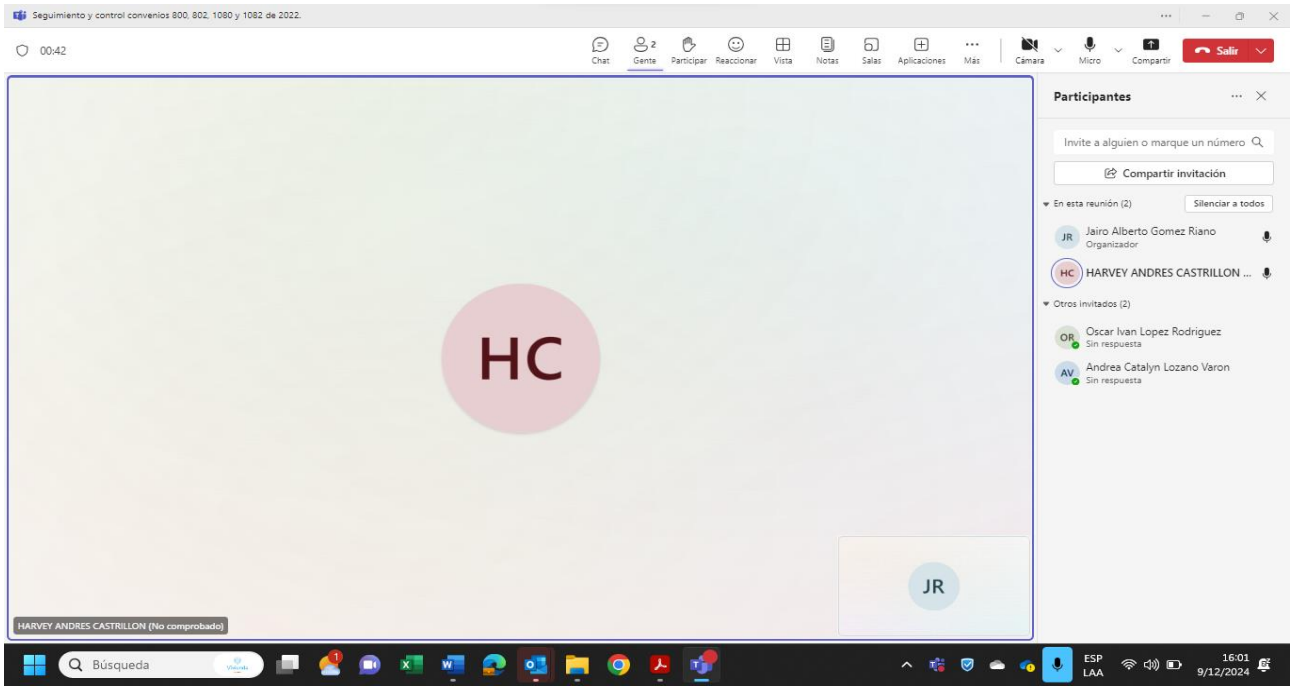
Seguimiento y control convenios 800, 802, 1080 y 1082 de 2022.
00:42
Chat
Gente
Participar
Reaccionar
Vista
Notas
Salas
Aplicaciones
Más
Cámara
Micro
Compartir
Salir
HC
JR
HARVEY ANDRES CASTRILLON (No comprobado)
Participantes
Invite a alguien o marque un número
Compartir invitación
En esta reunión (2)
Silenciar a todos
Jairo Alberto Gomez Riano
Organizador
HARVEY ANDRES CASTRILLON ...
Otros invitados (2)
Oscar Ivan Lopez Rodriguez
Sin respuesta
Andrea Catalyn Lozano Varon
Sin respuesta
Búsqueda
ESP
LAA
16:01
9/12/2024

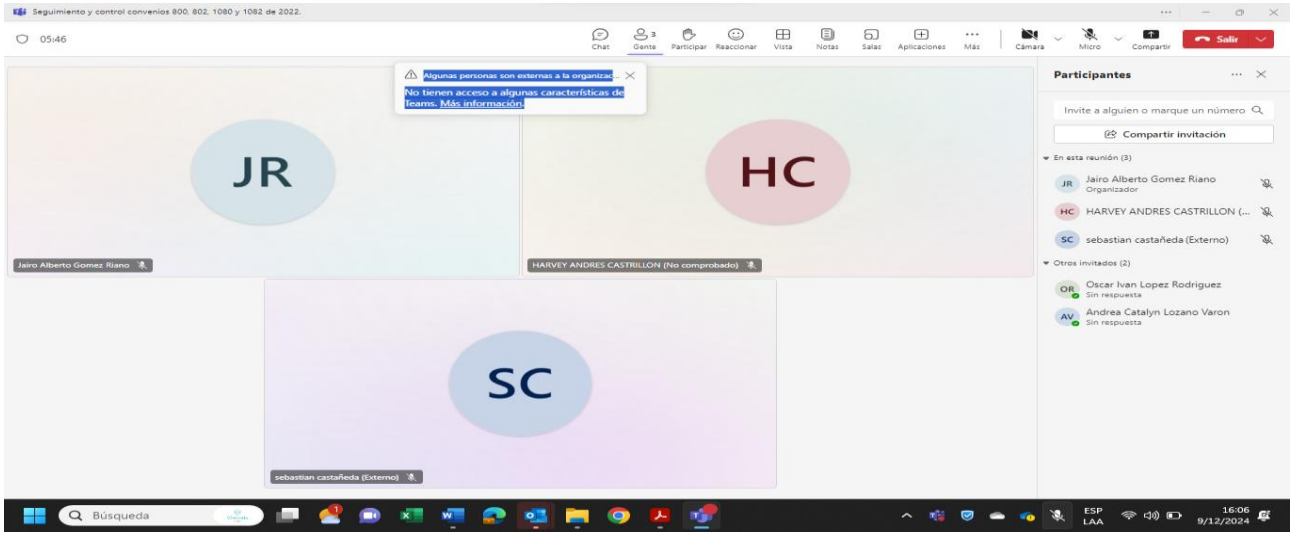
Seguimiento y control convenios 800, 802, 1080 y 1082 de 2022.
05:46
Salir
Algunas personas son externas a la organizac...
No tienen acceso a algunas características de Teams. Más información
JR
HC
SC
Jairo Alberto Gomez Riano
HARVEY ANDRES CASTRILLON (No comprobado)
sebastian castañeda (Externo)
Participantes
Invite a alguien o marque un número
Compartir invitación
En esta reunión (3)
Jairo Alberto Gomez Riano
Organizador
HARVEY ANDRES CASTRILLON (...
sebastian castañeda (Externo)
Otros invitados (2)
Oscar Ivan Lopez Rodriguez
Sin respuesta
Andrea Catalyn Lozano Varon
Sin respuesta
Búsqueda
ESP
LAA
16:06
9/12/2024

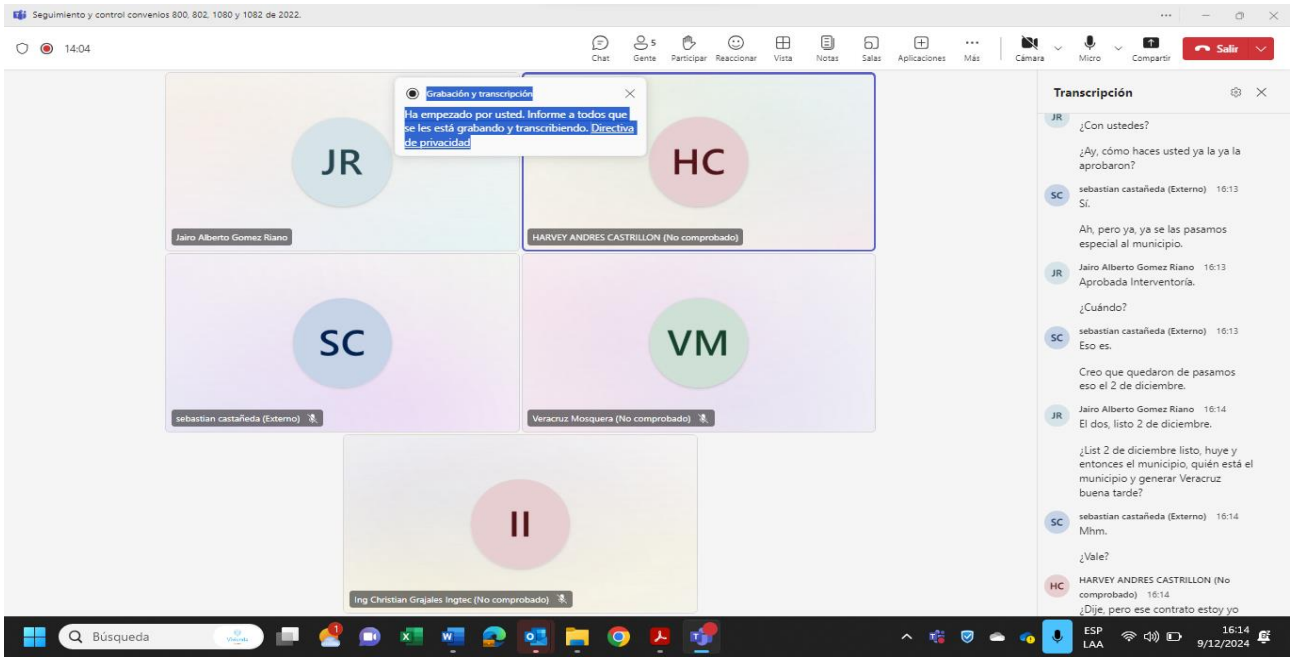
Seguimiento y control convenios 800, 802, 1080 y 1082 de 2022.
14:04
Chat
Gente
Participar
Reaccionar
Vista
Notas
Salas
Aplicaciones
Más
Cámara
Micro
Compartir
Salir
Grabación y transcripción
Ha empezado por usted. Informe a todos que se les está grabando y transcribiendo. Directiva de privacidad
JR
Jairo Alberto Gomez Riano
HC
HARVEY ANDRES CASTRILLON (No comprobado)
SC
sebastian castañeda (Externo)
VM
Veracruz Mosquera (No comprobado)
II
Ing Christian Grajales Ingtec (No comprobado)
Transcripción
¿Con ustedes?
¿Ay, cómo haces usted ya la ya la aprobaron?
sebastian castañeda (Externo) 16:13
Sí.
Ah, pero ya, ya se las pasamos especial al municipio.
Jairo Alberto Gomez Riano 16:13
Aprobada Interventoría.
¿Cuándo?
sebastian castañeda (Externo) 16:13
Eso es.
Creo que quedaron de pasamos eso el 2 de diciembre.
Jairo Alberto Gomez Riano 16:14
El dos, listo 2 de diciembre.
¿List 2 de diciembre listo, huye y entonces el municipio, quién está el municipio y generar Veracruz buena tarde?
sebastian castañeda (Externo) 16:14
Mhm.
¿Vale?
HARVEY ANDRES CASTRILLON (No comprobado) 16:14
¿Dije, pero ese contrato estoy yo
Búsqueda
ESP
LAA
16:14
9/12/2024

}

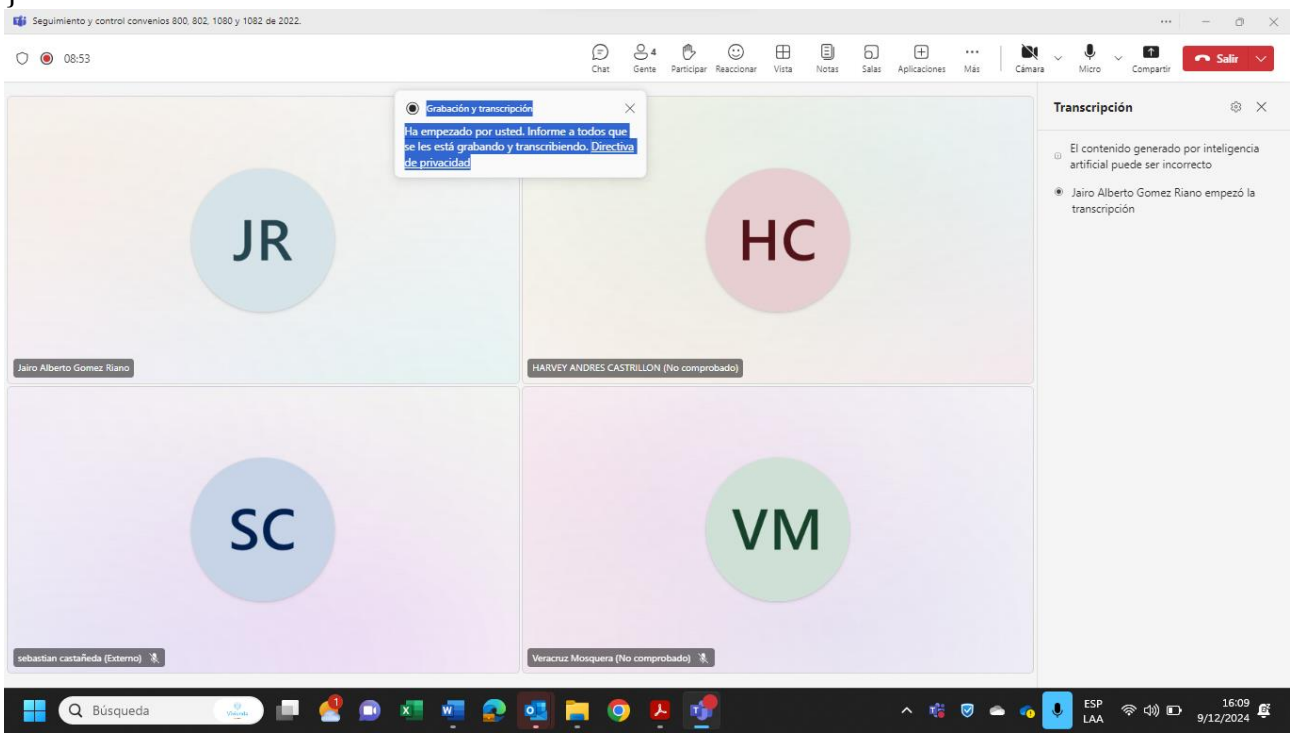
Seguimiento y control convenios 800, 802, 1080 y 1082 de 2022.
08:53
Chat
Gente
Participar
Reaccionar
Vista
Notas
Salas
Aplicaciones
Más
Cámara
Micro
Compartir
Salir
Grabación y transcripción
Ha empezado por usted. Informe a todos que se les está grabando y transcribiendo. Directiva de privacidad
Transcripción
El contenido generado por inteligencia artificial puede ser incorrecto
Jairo Alberto Gomez Riano empezó la transcripción
JR
Jairo Alberto Gomez Riano
HC
HARVEY ANDRES CASTRILLON (No comprobado)
SC
sebastian castañeda (Externo)
VM
Veracruz Mosquera (No comprobado)
Búsqueda
ESP
LAA
16:09
9/12/2024

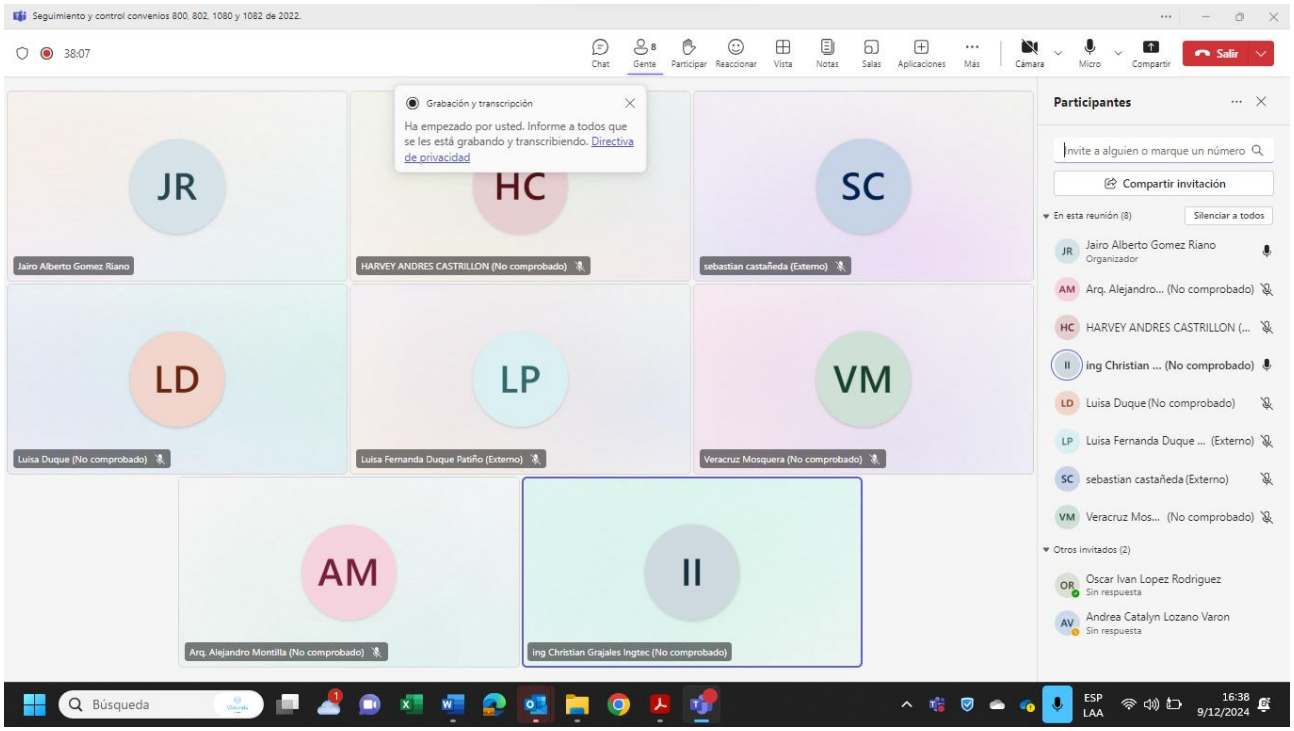
Seguimiento y control convenios 800, 802, 1080 y 1082 de 2022.
38:07
Chat
Gente
Participar
Reaccionar
Vista
Notas
Salas
Aplicaciones
Más
Cámara
Micro
Compartir
Salir
Grabación y transcripción
Ha empezado por usted. Informe a todos que se les está grabando y transcribiendo. Directiva de privacidad
JR
Jairo Alberto Gomez Riano
HC
HARVEY ANDRES CASTRILLON (No comprobado)
SC
sebastian castañeda (Externo)
LD
Luisa Duque (No comprobado)
LP
Luisa Fernanda Duque Patiño (Externo)
VM
Veracruz Mosquera (No comprobado)
AM
Arq. Alejandro Montilla (No comprobado)
II
ing Christian Grajales Ingtec (No comprobado)
Participantes
Invite a alguien o marque un número
Compartir invitación
En esta reunión (8)
Silenciar a todos
Jairo Alberto Gomez Riano
Organizador
Arq. Alejandro... (No comprobado)
HARVEY ANDRES CASTRILLON (...
ing Christian ... (No comprobado)
Luisa Duque (No comprobado)
Luisa Fernanda Duque ... (Externo)
sebastian castañeda (Externo)
Veracruz Mos... (No comprobado)
Otros invitados (2)
Oscar Ivan Lopez Rodriguez
Sin respuesta
Andrea Catalyn Lozano Varon
Sin respuesta
Búsqueda
ESP
LAA
16:38
9/12/2024

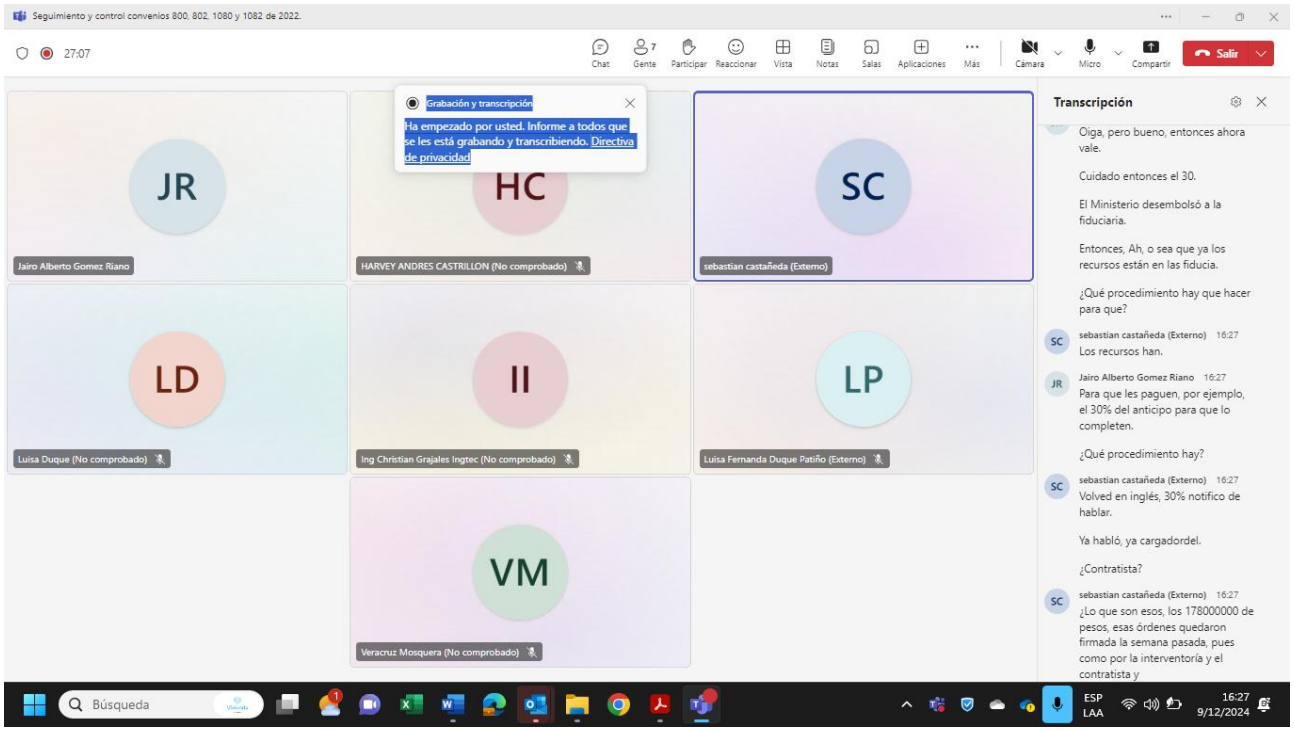
Seguimiento y control convenios 800, 802, 1080 y 1082 de 2022.
27:07
Chat
Gente
Participar
Reaccionar
Vista
Notas
Salas
Aplicaciones
Más
Cámara
Micro
Compartir
Salir
Grabación y transcripción
Ha empezado por usted. Informe a todos que se les está grabando y transcribiendo. Directiva de privacidad
JR
Jairo Alberto Gomez Riano
HC
HARVEY ANDRES CASTRILLON (No comprobado)
SC
sebastian castañeda (Externo)
LD
Luisa Duque (No comprobado)
II
Ing Christian Grajales Ingtec (No comprobado)
LP
Luisa Fernanda Duque Patiño (Externo)
VM
Veracruz Mosquera (No comprobado)
Transcripción
Oiga, pero bueno, entonces ahora vale.
Cuidado entonces el 30.
El Ministerio desembolsó a la fiduciaria.
Entonces, Ah, o sea que ya los recursos están en las fiducia.
¿Qué procedimiento hay que hacer para que?
sebastian castañeda (Externo) 16:27
Los recursos han.
Jairo Alberto Gomez Riano 16:27
Para que les paguen, por ejemplo, el 30% del anticipo para que lo completen.
¿Qué procedimiento hay?
sebastian castañeda (Externo) 16:27
Volved en inglés, 30% notifico de hablar.
Ya habló, ya cargadordel.
¿Contratista?
sebastian castañeda (Externo) 16:27
¿Lo que son esos, los 178000000 de pesos, esas órdenes quedaron firmada la semana pasada, pues como por la interventoría y el contratista y
Búsqueda
ESP
LAA
16:27
9/12/2024

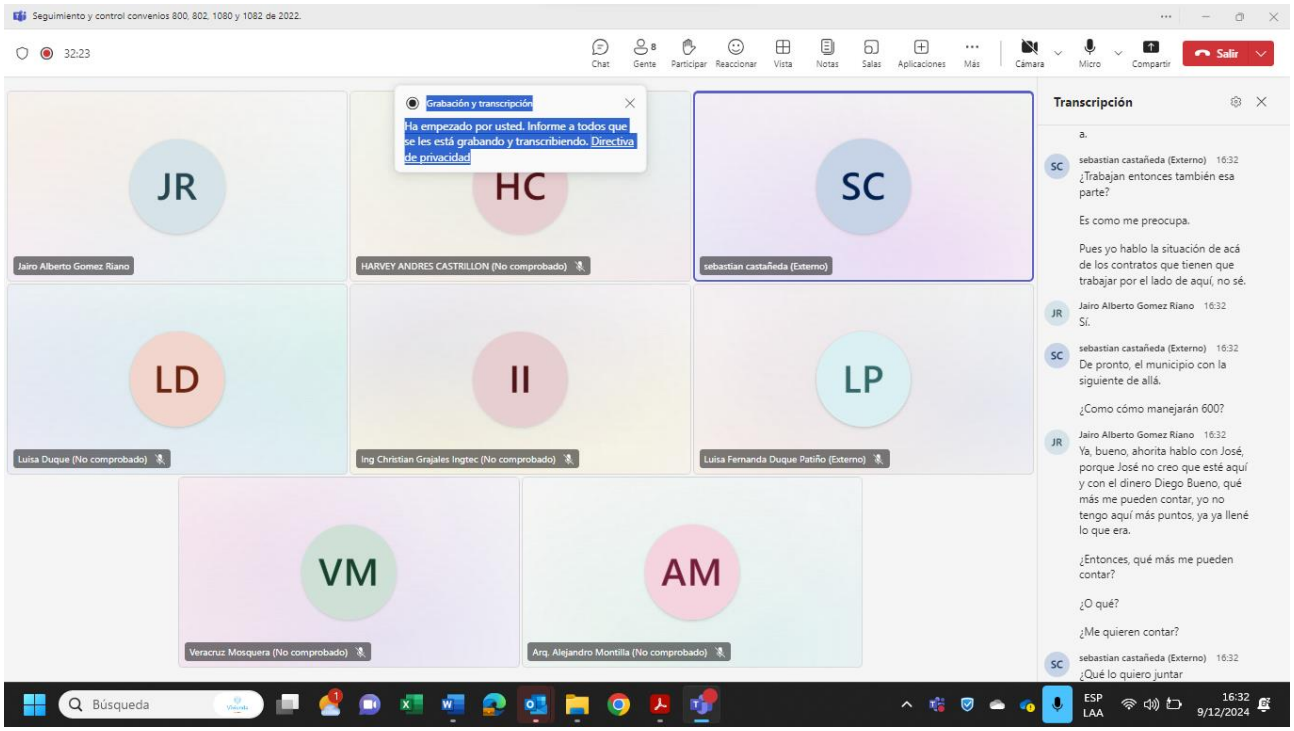
Seguimiento y control convenios 800, 802, 1080 y 1082 de 2022.
32:23
Chat
Gente
Participar
Reaccionar
Vista
Notas
Salas
Aplicaciones
Más
Cámara
Micro
Compartir
Salir
Grabación y transcripción
Ha empezado por usted. Informe a todos que se les está grabando y transcribiendo. Directiva de privacidad
JR
Jairo Alberto Gomez Riano
HC
HARVEY ANDRES CASTRILLON (No comprobado)
SC
sebastian castañeda (Externo)
LD
Luisa Duque (No comprobado)
II
Ing Christian Grajales Ingtec (No comprobado)
LP
Luisa Fernanda Duque Patiño (Externo)
VM
Veracruz Mosquera (No comprobado)
AM
Arq. Alejandro Montilla (No comprobado)
Transcripción
a.
sebastian castañeda (Externo) 16:32
¿Trabajan entonces también esa parte?
Es como me preocupa.
Pues yo hablo la situación de acá de los contratos que tienen que trabajar por el lado de aquí, no sé.
Jairo Alberto Gomez Riano 16:32
Sí.
sebastian castañeda (Externo) 16:32
De pronto, el municipio con la siguiente de allá.
¿Como cómo manejarán 600?
Jairo Alberto Gomez Riano 16:32
Ya, bueno, ahorita hablo con José, porque José no creo que esté aquí y con el dinero Diego Bueno, qué más me pueden contar, yo no tengo aquí más puntos, ya ya llené lo que era.
¿Entonces, qué más me pueden contar?
¿O qué?
¿Me quieren contar?
sebastian castañeda (Externo) 16:32
¿Qué lo quiero juntar
Búsqueda
ESP
LAA
16:32
9/12/2024
