ACTA MESA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO

DATOS GENERALES

FECHA:	19 de noviembre de 2024
HORA:	De 09:45 am a 10:30 am
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	1. Municipio Ayapel Angela Domínguez- secretaria de Planeación 2. Plan Departamental de Aguas: Eduardo Sáenz- Apoyo Área Técnica 3. Contratos Derivados: Michael Tamayo- Consorcio Construir 2021 4. MVCT: Deissy Natalia Moreno Avendaño – Apoyo supervisión del convenio

ORDEN DEL DIA:

1. Mesa técnica de seguimiento en el marco del desarrollo del Convenio CUR 1134-2020 - ETAPA I DE LA REHABILITACION AMPLIACION Y SECTORIZACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y AUMENTO DE LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO Y SEMIENTERRADO EN EL MUNICIPIO DE AYAPEL. -Revisión a compromisos frente a gestiones con la CVS y AFINIA.

- Reporte de Pruebas
- Proceso de entrega a Municipios y empresa Operadora.
- Permiso CVS Concesión de aguas subterráneas
- Permiso AFINIA energización
- Proceso de liquidación contratos derivados PDA
- Seguimiento a compromisos de Mesas Técnica seguimiento 12 de noviembre de 2024.

2. Compromisos.

DESARROLLO:

1. Desarrollo de Agenda

- Reporte de Pruebas

Desde El PDA se informa que la interventoría reportó unos sectores que si bien eran existentes, como parte del desarrollo de las pruebas se han presentado fugas, por lo que se requiere instalar una válvula temporal que permita el desarrollo de pruebas, la cual ya fue solicitada y se está a la espera de la llegada del elemento.

MVCT solicita convocar a las mesas de seguimiento técnico a delegado de la empresa operadora que permita adelantar las gestiones requeridas; al respecto se hace contacto con el profesional de la APC (Administración Pública Cooperativa de Ayapel), a modo de ponerlo al tanto frente a las necesidades de instalación de válvula temporal.

Desde interventoría se recalca que otra opción es colocar un tapón que segreguen las tubería existentes, de modo que se puedan realizar las pruebas.

Interventoría reporta de manera paralela se está realizando calibraciones de los sistemas de cloración y se tiene prevista capacitación para el día 20 de noviembre de 2024.

- Proceso de entrega a Municipios y empresa Operadora.

PDA indica que una vez se terminen las pruebas, se procederá con el proceso de entrega al Municipio y respectivamente a la empresa operadora.

- Permiso CVS Concesión de aguas subterráneas

Secretaria de Planeación indica ya se cuenta con los resultados del ensayo de clorofosfato por lo que se procederá a radicar en la CVS toda la información de manera consolidada.

- Permiso AFINIA energización

Interventoría informa que se realizó cargue de atención de observaciones en plataforma AFINIA pero a la fecha no se ha obtenido respuesta. Secretaría de Planeación indica realizará gestión con AFINIA para conocer el estado de avance en

las gestiones. Desde el MVCT se recalca es necesario adelantar los respectivos trámites para poder concluir y obtener los permisos de energización.

- Proceso de liquidación contratos derivados PDA

MVCT hace llamado a las partes a agilizar procesos de modo que se cuente con la liquidación de los contratos derivados previo a la culminación del plazo del convenio, que corresponde al 18 de diciembre de 2024.

Interventoría informa que el contratista hizo entrega del informe final el viernes 15 de noviembre de 2024, por lo que una vez revisado el documento será remitido el 21 de noviembre de 2024 al PDA. Documentación que no incluye planos.

PDA recalca que si se reciben los documentos según lo indicado por la interventoría será posible liquidar los contratos dentro del plazo definido para el convenio.

Interventoría recalca se continúan usando las plantas de emergencia para la operación del sistema y las calibraciones en los sistemas de cloración.

2 Compromisos

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Reportar seguimiento al desarrollo de pruebas y puesta a punto del sistema (por fugas)	PDA- Contratista	Próxima reunión de seguimiento.
2	Dejar las respectivas trazabilidades frente a los ajustes por fugas.	PDA	-
3	Instalación de válvula temporal	Contratos derivados	22/Nov/2024
4	Evaluar la opción de instalar un tapón que segregue las tubería existentes, de modo que se puedan realizar las pruebas.	Contratos derivados	21/Nov/2024
5	Capacitación sobre tema de proceso de cloración y Calibración de la estación de cloración en la planta.	Interventoría-PDA	20/Nov/2024
6	Radicar atención de observaciones ante la CVS	Secretaría de Planeación- Ayapel	Alta prioridad

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
7	Incluir en la programación a delegado de la APC	MVCT	Coordinar según disponibilidad.
8	Gestionar con AFINIA estado del proceso	Municipio	Alta prioridad
9	Entrega de informe final	Interventoría	21/Nov/2024
10	Adelantar gestiones para entrega del Proyecto al Municipio y a la empresa operadora	PDA	Finalizando el mes de noviembre
11	Generar acta de Reunión y programar mesa técnica de seguimiento para verificación de compromisos adquiridos.	MVCT	28/Nov/ 2024

Link de grabación: CRU1134-2020 Ayapel- Mesa Técnica de Seguimiento-20241119_095757-Grabación de la reunión.mp4

FIRMAS:

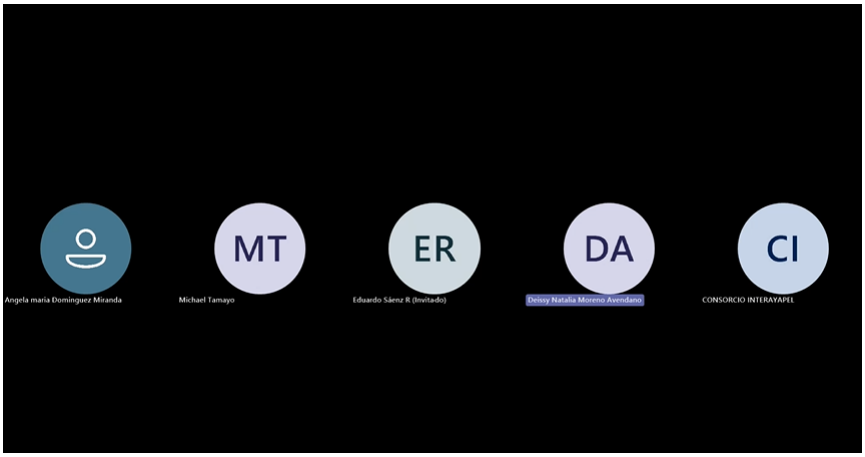

Elaboró: Deissy Natalia Moreno Avendaño – Contratista MVCT
Revisó: -
Fecha: 21 de noviembre de 2024
