ACTA REUNIÓN VIRTUAL

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., 12 de febrero de 2025
HORA:	De 4:00 p.m. a 4:30 p.m.
LUGAR:	Microsoft Teams[1]
ASISTENTES:	**Municipio de Inírida-Guainía** -Ing. Brayan Zambrano – Secretario de Planeación y supervisor del convenio 983 de 2024 -Fabian Octavio Pérez Valencia – Jefe oficina jurídica -Paola Ortiz – Coordinadora del sector de agua potable y saneamiento básico de la Secretaría de Planeación **MVCT-VASB-DPR** -Carlos Julián Flórez – Abogado profesional especializado-Supervisor convenio 983 de 2024 -Patricia León Botón – Ing. Civil -Contratista -Pablo Quiñones – Apoyo jurídico -Contratista
INVITADOS:	

Objetivo:

-El objetivo de la reunión es realizar seguimiento a las obligaciones establecidas en el convenio 983 de 2024 del proyecto Basura Cero denominado "*Construcción de una Estación de Clasificación y Aprovechamiento (ECA), una planta de tratamiento de residuos sólidos orgánicos y fortalecimiento de las actividades de aprovechamiento y tratamiento en el marco del servicio público de aseo, en el municipio de Inírida – Guainía*", en específico sobre los procesos precontractuales.

Agenda:

-Socialización por parte del Municipio de Inírida de las acciones que han venido adelantando para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el CUR 983 de 2024 respecto a los procesos precontractuales y a los compromisos establecidos en la reunión del 06 de febrero de 2025.
-Seguimiento al cronograma de las diferentes actividades que se requieren con el fin de lograr la contratación tanto de la fiducia como de los componentes de inversión del proyecto.

[1] https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTdmMzUwN2UtNWIwZi00YjI0LWJhMWUtMTIwYzQ0ZjZiYTY0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2259f85572-2867-4480-b111-fc473309f9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22917c5d61-14b4-4c3a-9d4d-c28cf52a3bc1%22%7d

DESARROLLO:

- Presentación de asistentes

- **Patricia León del MVCT** saluda a los asistentes e informa que de acuerdo a lo establecido desde el 29 de enero de 2025, se harían reuniones cada ocho (8) días hasta lograr iniciar la contratación de todos los procesos de inversión del proyecto. En ese sentido, el compromiso establecidos en la reunión del 06 de febrero de 2025 era la apertura del proceso contractual de la obra, lo cual se haría entre el 10 y 12 de febrero de 2025; razón por la cual, se pasa la palabra al municipio para que informe las acciones realizadas al respecto.

- **Fabian Pérez Jefe Jurídico del municipio de Inírida** informa que tuvieron que hacer ajustes a los estudios previos con la oficina de Planeación y no se ha publicado debido a dichos ajustes. Se cuenta ya con el cronograma del proceso. La publicación se realizará el día de mañana 13 de febrero.

- **Patricia León** pregunta ¿por qué se incumplió la fecha de publicación que se había establecido para el día de hoy?

- **Fabian Pérez** informa que debido a unos ajustes de información técnica se tuvo que retroalimentar con la oficina de Planeación.

- **Carlos Julián Flórez** pregunta si se va a publicar mañana 13 de febrero de 2025? Porque esta es la tercera reunión que se viene indicando y señalando desde el MVCT la posibilidad de aplicar la cláusula de pérdida de recursos en la Resolución de asignación de recursos. ¿Entonces se pregunta por la fecha exacta de publicación del proceso de obra o cual sería el accionar por parte del municipio en cuanto a la ejecución y la planeación de este convenio y proyecto.

- **Fabian Pérez** informa que respecto a la elaboración de los pliegos bajo las condiciones de los pliegos tipo ha sido un trabajo dispendioso y complejo pero se establece con toda seguridad que el día de mañana 13 de febrero de 2025, queda publicado el proceso, lo cual no genera incumplimiento, pues según la Resolución se establece que se inicie el proceso de licitación antes del 16 de marzo.

  Se comparte pantalla y se ilustra el cronograma planteado para el proceso precontractual y se establece que está programado iniciar la publicación mañana 13 de febrero y con fecha de adjudicación del proceso para el 26 de marzo de 2025.

- **Patricia León** menciona que de acuerdo con el compromiso, se solicita al municipio remitir el día de mañana 13 de febrero por correo electrónico al MVCT el

link con la apertura del proceso licitatorio de obra. De lo contrario, tal y como lo manifestó el supervisor, se dará inicio a la aplicación de la cláusula de pérdida de recursos de la Resolución, teniendo en cuenta que se han realizado varias prórrogas al cronograma inicialmente planteado por el comité técnico de seguimiento al Convenio.

- **Carlos Julián Flores** pregunta por el proceso de interventoría.

- **Fabian Pérez** informa que está en construcción los estudios previos de la interventoría.

- **Patricia León** menciona que el MVCT revisó los estudios previos de la interventoría y fueron remitidos al municipio el 31 de diciembre de 2024.

- **Fabian Pérez** pregunta a la oficina de planeación que hace falta para la radicación del estudio previo de la interventoría en la oficina jurídica?

- **Paola Ortiz de la Secretaría de Planeación del municipio** menciona que faltaban unos ajustes al presupuesto, pero que hoy mismo se radica el estudio previo en la oficina jurídica.

- **Carlos Julián Flórez** informa que el MVCT ha sido algo laxo en el seguimiento al proceso precontractual que adelanta el municipio. Si bien se hizo en Inírida el lanzamiento del programa Basura Cero y se han tenido dificultades, hay una situación jurídica y nosotros como funcionarios o contratistas tenemos unas responsabilidades que debemos cumplir en últimas para lograr ver resultados, porque todo ha conllevado un trabajo arduo desde la formulación, aprobación y ahora en la ejecución se esperaría avanzar, por lo que no es posible que pasado un mes de que el municipio recibiera las observaciones a la interventoría y no se tenga ni siquiera el cronograma de la interventoría.

- **Fabian Pérez** menciona que el plazo de contratación de la interventoría es más corto que la obra y en ese caso los dos procesos estarían para la terminación en la misma fecha.

- **Patricia León** menciona que se busca cumplir el compromiso adquirido en el comité técnico de seguimiento Se solicita priorizar la publicación de la interventoría porque se están contando los términos según cronograma planteado sin tener en cuenta posibles alertas que puedan generar retrasos en el proceso, lo que puede impactar el inicio y ejecución del proyecto. La preocupación del MVCT es porque en el evento de lanzamiento del proyecto en Inírida, el Alcalde se comprometió con la Ministra en la entrega del proyecto dentro del periodo de este gobierno nacional y pues se quiere mitigar cualquier demora que pueda tener el proceso.

- **Fabian Pérez** menciona que nunca la intención ha sido de incumplir los compromisos, sino que se han presentado situaciones complejas, pero ya se tienen las soluciones. El proceso de interventoría se abriría el día martes 18 de febrero.

- **Patricia León** menciona que en ese sentido seguirán las mesas de trabajo o comités técnicos de seguimiento de manera mensual hasta lograr la contratación de todos los procesos del proyecto.

- Se da por terminada la reunión y se agradece el espacio para la misma.

COMPROMISOS

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Elaborar el acta de la reunión con los compromisos y remitirla al municipio	MVCT	19-2-2025
2	Envío link apertura del proceso precontractuales de la obra	Municipio de Inírida	13-02-2025
3	Apertura proceso de interventoría	Municipio de Inírida	18-02-2025
4	Citar a reunión de seguimiento	Municipio de Inírida y MVCT	19-02-2025

Elaboró: Patricia León – DPR-VASB
Fecha: Febrero 19 de 2025

Soporte:

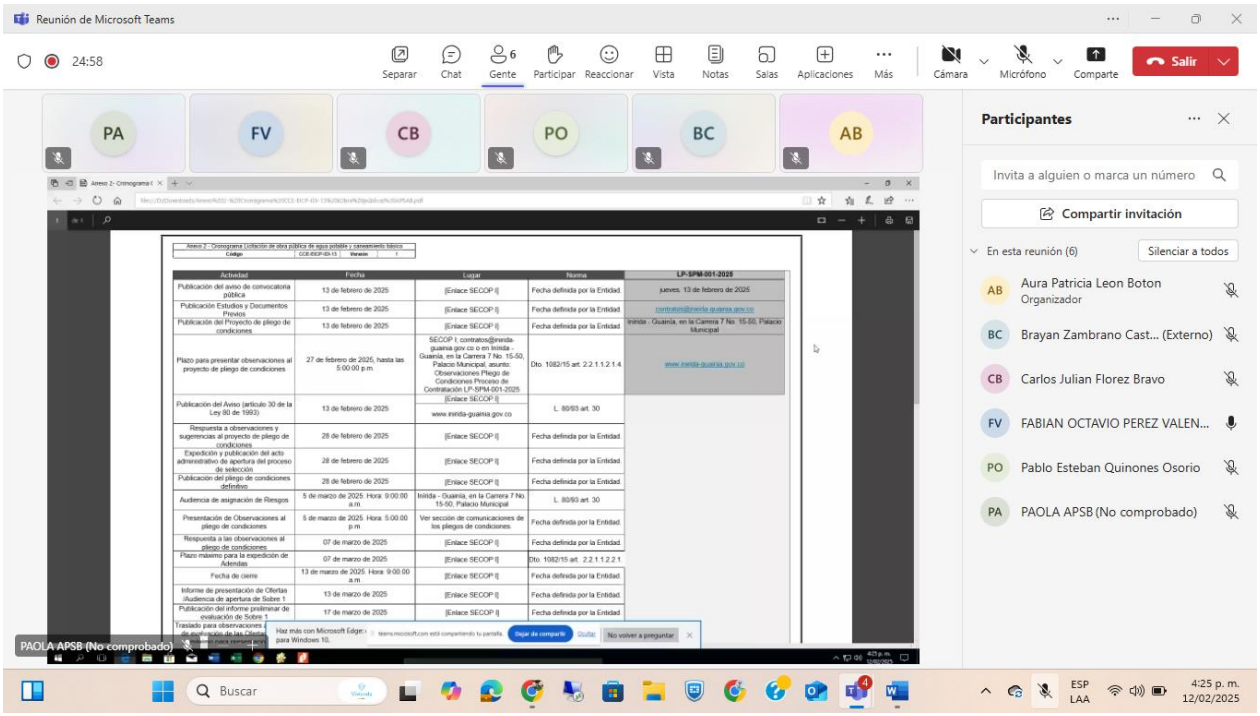

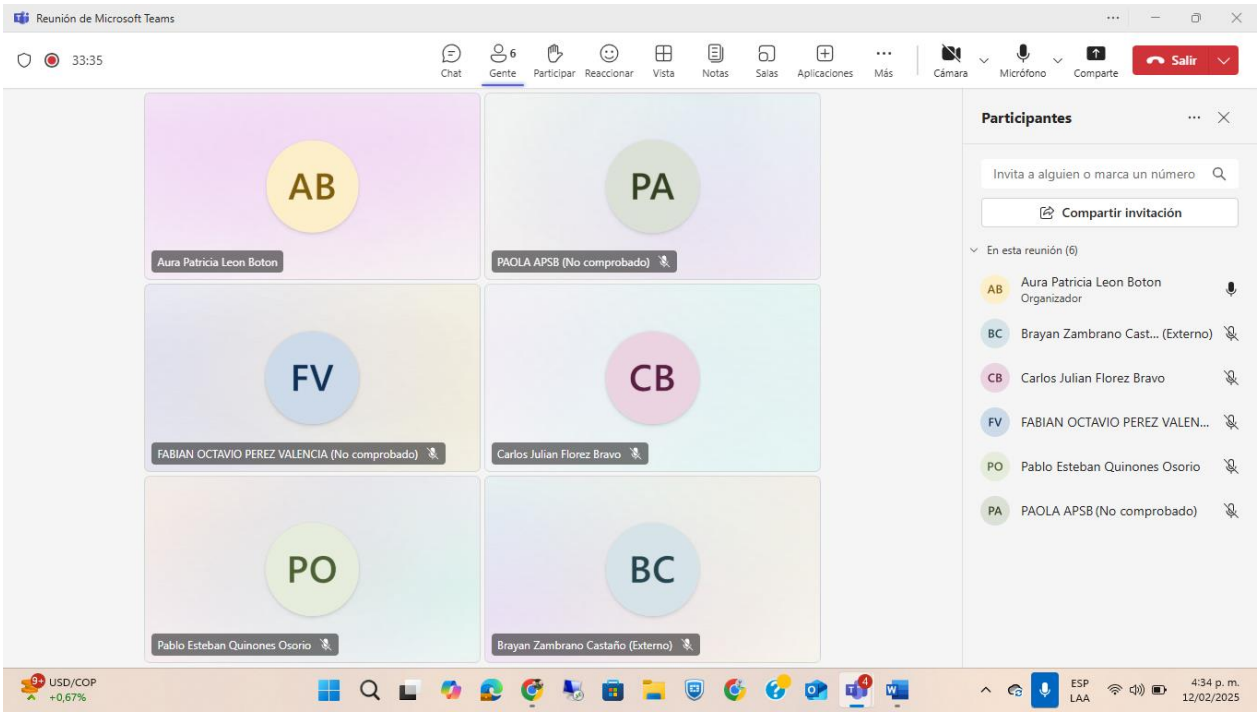

Link grabación reunión: [Comité seguimiento convenio 983 de 2024 Inírida 12-2-2025.mp4]

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-17

LUGAR: Microsoft Teams FECHA: 12 de febrero de 2025 HORA: 4:00 pm -4:30 pm

TEMA: Seguimiento Convenio 983 de 2024 – Proyecto Basura Cero Inírida-Guainía PRESIDE: MVCT

EQUIPO ACOMPAÑANTE: Alcaldía de Inírida

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	FABIAN OCTAVIO PEREZ VALENCIA	JEFE OFICINA JURIDICA Y DE CONTRATACION	ALCALDIA DE INIRIDA	3207204975	fapeva17@gmail.com	Convenio 983 de 2024	FABIAN OCTAVIO PEREZ VALENCIA
2	JULIAN FLOREZ	PROFESIONAL ESPECIALIZADO SUPERVISOR CONVENIO	MVCT-VASB-DPR	3057896044	cflorez@minvivienda.gov.co	Convenio 983 de 2024	
3	Paola Ortiz Villalba	Profesional apoyo SPDE	Inirida	3162519274	Pao1424j@gmail.com	Reunión de seguimiento	PAOLA ORTIZ
4	BRAYAN ZAMBRANO CASTAÑO	SECRETARIO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL	ALCALDIA DE INIRIDA	3213869187	secreplaneacion@inirida-guainia.gov.co	Seguimiento Convenio 983 de 2024_	BRAYAN ZAMBRANO
5	PABLO QUIÑONES	CONTRTISTA	MVCT-VASB-DPR	3046761768	pquinones@minvivienda.gov.co	Convenio 983 de 2024	PQ
6	PATRICIA LEÓN BOTÓN	CONTRATISTA	MVCT-VASB-DPR	3208542653	aleon@minvivienda.gov.co	Convenio 983 de 2024	PLEON
