ACTA No. 3 - FEBRERO 2025

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 21 de Febrero de 2025.
HORA:	9:00 a.m. a 10: a.m.
LUGAR:	virtual
ASISTENTES:	Relacionados en Acta Anexa
INVITADOS:	Relacionados en Acta Anexa

ORDEN DEL DIA:

1. **Proyecto "OPTIMIZACION LINEA DE ADUCCION EXISTENTE DE 18" ASBESTO CEMENTO DESDE DESARENADOR HASTA LA PTAP LA COLINA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA"**

DESARROLLO:

Ingeniera María Angelica Ruiz de Piedecuestana informa:

1. El 6 de febrero de 2025 se realizó reunión programada por la contraloría con Piedecuestana donde se informo el avance del proyecto a la fecha y la posible solicitud de reformulación del proyecto en tiempo y valor.

1.De acuerdo con informe de Interventoría 38 del 3 al 9 de febrero de 2025 al 9 de febrero de 2025, se tiene un avance de 87,20 % contra un programado del 92,09% de acuerdo con reprogramación solicitada por el contratista de 4 meses adicionales.

2.El proyecto entro en suspensión el 11 de febrero de 2025 hasta el 11 de abril de 2025 por 2 meses, por tramite de reformulación No.1de acuerdo a lo siguiente:

-Modificación de cantidades con adición en tiempo y valor:

- Tiempo: 1 mes
- Valor: 118.000.000 aproximadamente

-Por cambio de direccionamiento, mayores y menores cantidades de accesorios y tubería.

-Reforzamiento estructural columna paso elevado.

-Se debe realizar realce de muros en concreto.

L= 80-100 mts A= 0,15 mts H= 0,80 mts

Se tiene programado terminar el 16 de mayo de 2025.

El MVCT entrego lineamientos de reformulación y Piedecuestana inicia proceso de documentación técnica, jurídica y presupuestal para la entrega de reformulación No. 1 al Ministerio a finales de marzo de 2025.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega reformulación No. 1	Contratista Obra, Interventoría, Piedecuesta	30-03-2025
2	Reinicio proyecto	Piedecuestana	11-04-2025
3	Terminación del proyecto	Contratista obra, Interventoría, Piedecuestana	16-05-2025

FIRMAS:

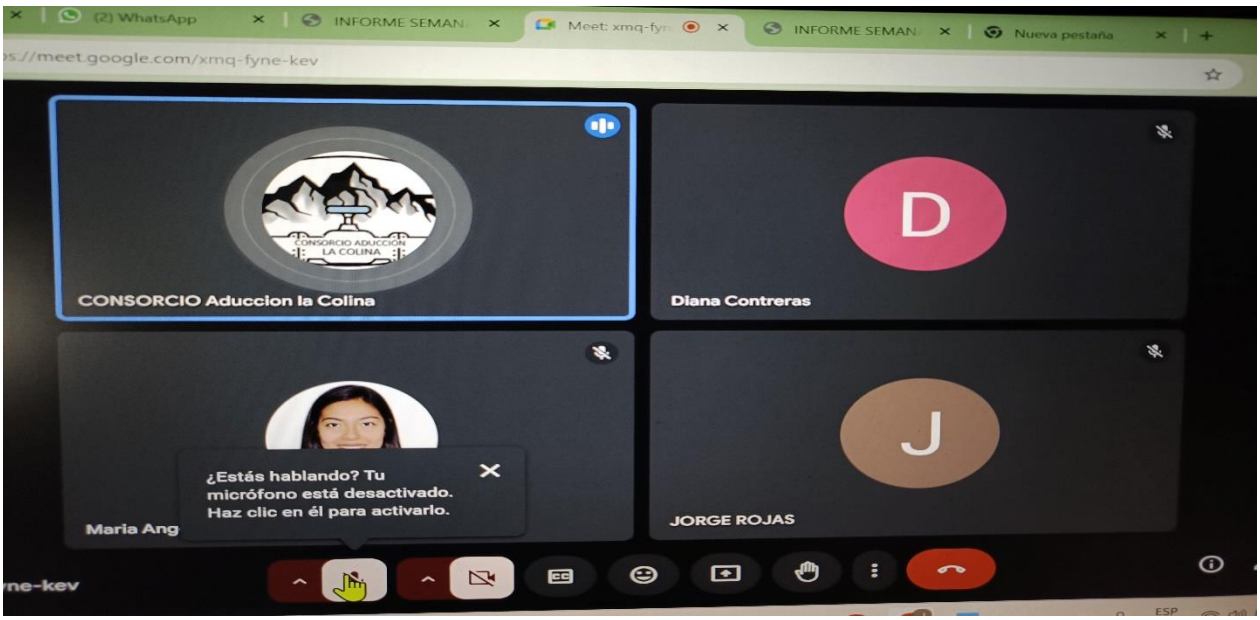

Anexos: (Opcional)
Elaboró: JORGE ROJAS
Fecha: 21-2-25
