MESA DE SEGUIMIENTO TÉCNICO AL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CORREGIMIENTO DE VAIVEN, MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA – ATLÁNTICO.

DATOS GENERALES

FECHA:	26-MARZO-2025
HORA:	4:00 pm
LUGAR:	VIRTUAL TEAMS
ASISTENTES:	• Arq. Francisco Padilla – Supervisor contratación derivada • Ing. Nestor Camelo – interventor de obras REINPRO S.A.S. • Ing. Yiseth Brango – contratista AURORA PROYECTOS E INV. S.A.S. • Ing. Eduardo Mesa Buitrago – Apoyo a la supervisión MVCT
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de asistentes.
2. Informe de avance de obras ejecutado y avance de obras programado del proyecto
3. Informe de actividades destacadas en obra
4. Constitución de servidumbre

DESARROLLO:

Presentación de los asistentes a la reunión.

AVANCE DE OBRA EJECUTADO: 58,21%
AVANCE DE OBRA PROGRAMADO: 60,00%

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co

Se pide al representante de la interventoría que presente el estado de avance del proyecto.

El interventor manifiesta que actualmente tenemos un avance físico del 60,00%.

Menciona también que la alcaldía aún no ha legalizado la servidumbre de un tramo de 552 metros aproximadamente, sin embargo se viene instalando tubería de alcantarillado que representa aproximadamente el 19,7% del total del proyecto.

Se solicita al ejecutor la documentación de la contratación derivada, las actas de reinicio, incluyendo las adiciones que hayan hecho, prórrogas, etcétera, para adicionarlo en la documentación de archivo del MVCT.

Igualmente se solicita al ejecutor actualizar lo sinformes de interventoría de los meses de diciembre de 2024 y enero de 2025.

COMPROMISOS:

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Actualizar informes de interventría y de supervisión al contrato de obra.	• Ing. Nestor Camelo – interventor de obras REINPRO S.A.S.	10/04/2025

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co

ASISTENCIA:

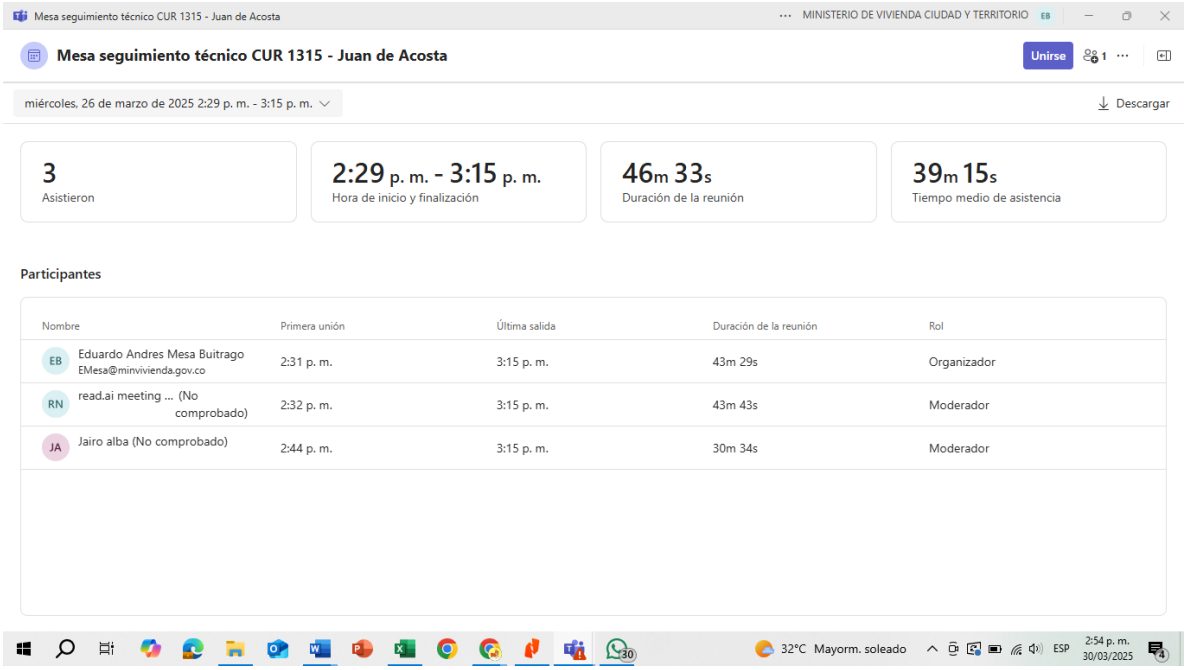

Elaboró: EDUARDO MESA BUITRAGO – Apoyo a Supervisión MVCT - DIDE
Fecha: 26/03/2025

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co
