MESA DE SEGUIMIENTO TÉCNICO AL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS BARRIOS VILLA AZUL Y VILLA DEL CESAR MUNICIPIO EL COPEY (CESAR).

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 26-MARZO-2025
HORA:	9:00 am
LUGAR:	VIRTUAL TEAMS
ASISTENTES:	• Ing. Holger Pabon – Supervisor técnico Aguas del Cesar S.A. E.S.P. • Ing. Eduardo Mesa Buitrago – Apoyo a la supervisión MVCT
INVITADOS:	N/A

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de asistentes.
2. Informe de avance de obras ejecutado y avance de obras programado del proyecto
3. Informe de actividades destacadas en obra

DESARROLLO:

Presentación de los asistentes a la reunión.

AVANCE DE OBRA EJECUTADO: 49,79%
AVANCE DE OBRA PROGRAMADO: 49,79%

Actualmente las actividades en obra están detenidas.

Se pide al representante del ejecutor que presente el estado de avance del proyecto.

El interventor manifiesta que actualmente tenemos un avance físico del 49,79%.

Manifiesta igualmente un avance programado del 49,79%.

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co

Aclara que el contrato o la contratación derivada se encuentra liquidada unilateralmente desde del 19 de noviembre de 2024 mediante la resolución 409 del 19/11/2024, mediante la cual se liquidó unilateralmente el contrato 0272 1021, que era la obra y el contrato, el 033 del 2021, que corresponde la interventoría.

Se planea contratar nuevamente al constructor y al interventor en cuanto se apruebe la reformulación.

Desde la última reunión que tuvimos, los cambios que hemos tenido es que. Se logró presentar.
El Comité evaluador del Ministerio la reprogramación del del Convenio. ¿Donde?
Pues que puntualmente desde el punto técnico se cambiaba el punto de entrega final del Barrio Villas del Cesar. Teniendo en cuenta, pues, que el municipio del Copei tuvo bien realizar.
Al momento de la suspensión de convenio, hacer los estudios de diseños y construcción de la de una estación de bombeo de aguas residuales y en el barrio vieja El César actualmente estructura está en operación y está haciendo, pues, operada por.
Por la empresa de servicios públicos en Copey.
La empresa agua se da como tal, pues hizo los los ajustes.
En cuanto al al tema del rediseño, la empresa asumió pues toda esa parte de y de actualización de diseño de de cantidades de obras.
Precios y demás, hoy fui al proyecto, usted me corrige, ingeniero Eduardo cuenta, pues ya con por parte del Ministerio, con un una aprobación de esa reformulación en estos momentos desde el área de planeación de la empresa.
El día de ayer se envió por solicitud propia de del ingeniero Eduardo un borrador de de de lo que va a ser la solicitud formal de la solicitud de.
De adición en tiempo al convenio para definir, pues lo que lo que va a ser ahorita mismo la la ejecución del barrio, viaje del cesar, que como todos saben, pues igualmente nosotros envió un cronograma con las actividades necesarias, entonces esa es la situación actual que se tiene del.
Del Convenio 1121 del Copei.

Se solicita al ejecutor la documentación de la liquidación unilateral de la contratación derivada, para adicionarla en la documentación de archivo del MVCT.

COMPROMISOS:

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Notificar tan pronto se conozca el oficio de aprobación de la reformulación	Ing Eduardo Mesa	10/04/2025

ASISTENCIA:

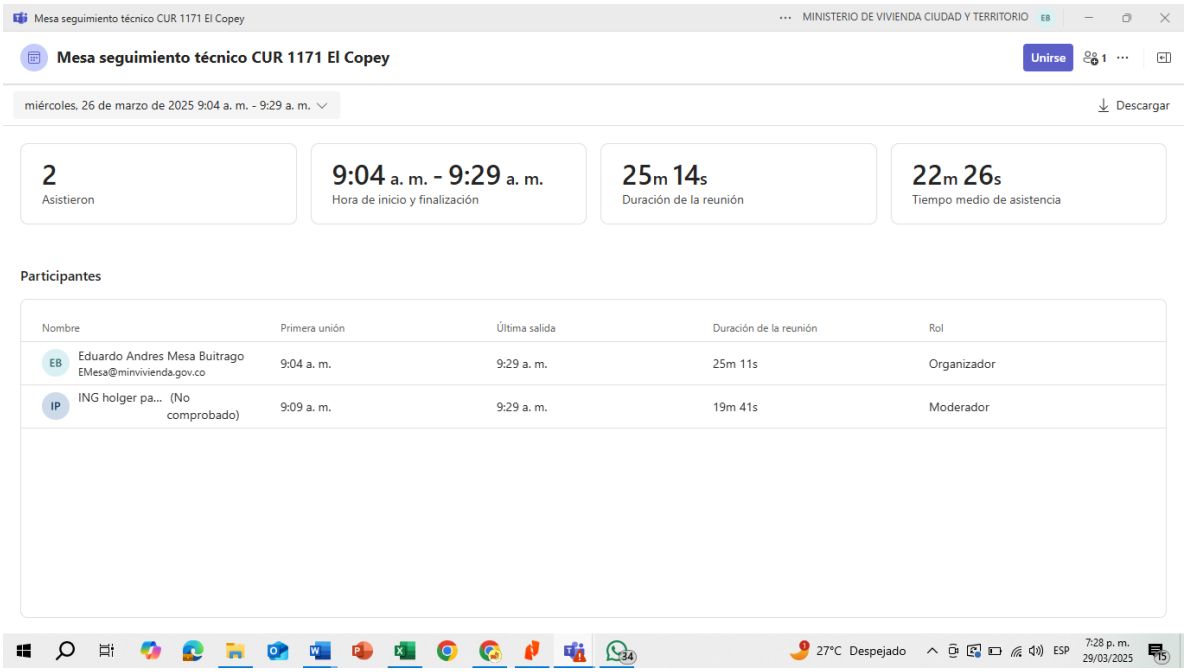



Elaboró: EDUARDO MESA BUITRAGO – Apoyo a Supervisión MVCT - DIDE
Fecha: 31/03/2025

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co
