ACTA No. 02

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá D.C., 03 de mayo de 2021
HORA:	De 16:00 a 17:30 horas
LUGAR:	**TEAMS**
ASISTENTES:	LEONARDO ARAQUE, Secretario de Planeación y Obras Públicas de El Cocuy – Boyacá. CARLOS DEL RÍO, Asesor Secretaría de Planeación. DIEGO MESA, Diseñador Secretaría de Planeación. JEYSSON SUÁREZ, Asesor Secretaría de Planeación. GERMAN AUGUSO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, Alcalde LIZARDO OVALLE, Evaluador VASB
INVITADOS:	No, (Sin Cargo)

ORDEN DEL DIA:

Mesa de trabajo para revisar los avances a las observaciones y requerimientos hallados en el proyecto “CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO VEREDAS FUNCIAL, SUAREZ, ULLOA Y HATILLO ALTO, MUNICIPIO DE TOGUI”, dentro del proceso de Evaluación por Etapas.

1. Presentación de observaciones y requerimientos:

DESARROLLO:

1. Presentación de observaciones y requerimientos
   El VASB informa y a la vez reitera a los asistentes, sobre el estado del proyecto, entre otros, se menciona la ausencia de levantamiento topográfico en el 50% del área del proyecto, la ausencia de información hidrológica y estimación de la oferta hídrica, carencia de títulos de propiedad a nombre del municipio sobre los predios a intervenir y de servidumbres para el proyecto, se reitera y se resalta la necesidad de contar con todos los estudios en medio magnético; también se hacen anotaciones sobre el presupuesto, donde se consideran algunos ítems correspondientes a intangibles, que deben integrarse dentro de los análisis de precios unitarios correspondientes, como por ejemplo, el transporte a lomo de mula.
   También se reitera la importancia de entregar agua potable a los usuarios, dado que no se propone ninguna PTAP ni se define algún mecanismo para ofrecer agua potable a los usuarios; de otra parte se destaca la importancia de acogerse a la normatividad vigente, particularmente dar aplicación a la Resolución 0330 de 2017, empleando los diámetros mínimos allí definidos, para sistemas de acueducto en zonas rurales.
   El VASB hace diversas recomendaciones al municipio, para que dentro de sus informes queden documentadas y suficientemente explicadas las razones que dan origen a la formulación del proyecto, el impacto que ocasiona y demás aspectos

relacionados con el cumplimiento que debe darse a las Resoluciones 0330 de 2017 y 0661 de 2019.

El municipio a través del ingeniero diseñador informa, que aún no ha sido complementada la información digital del proyecto, por lo cual, se está gestionando visita al municipio una vez sea posible, dada la actual emergencia sanitaria, para recopilar toda la información existente, y proponer una solución que beneficie a los 230 usuarios existentes, donde también se efectúen visitas a los predios potenciales para construir obras puntuales, tales como la el desarenador, la PTAP, los tanques nuevos, etc. El señor alcalde señala, que el drenaje de la fuente de captación propuesta, presenta aguas con excelentes condiciones de calidad, lo cual podría beneficiar a los tres sistemas de acueducto existentes, entre ellos, uno que actualmente cuenta con una planta con filtración en múltiples etapas FIME.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Mesa de trabajo, complementando la información digital del proyecto.	Municipio	Mayo 03 de 2021
2			
3			

FIRMAS:

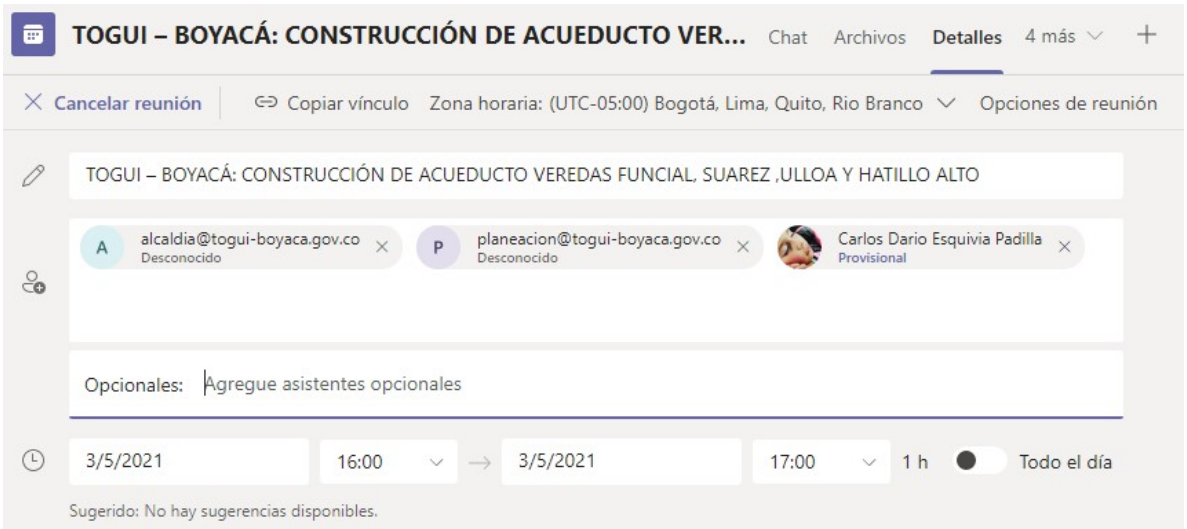

Elaboró: Lizardo Ovalle
Fecha: 03-05-2021
