ACTA No. 1

DATOS GENERALES

FECHA:	21 de junio de 2021
HORA:	De 10:00 am a 11:00 m
LUGAR:	Reunión virtual – Microsoft Teams
ASISTENTES:	Jackeline Menes Olarte, **Subdirectora de Proyectos** Eduardo Cañas**, Coordinador del Grupo Evaluación de proyectos** Laura C. Mejía **Evaluadora preliminar**
INVITADOS:	Municipios de San Juan y San Jacinto del Departamento de Bolivar.

ORDEN DEL DIA:

Asistencia técnica en agua y saneamiento básico para la presentación del proyecto de acueducto regional**.**

DESARROLLO:

Se inicia la reunión a las 10:00AM. Al llamado del quórum se identifican los asistentes del encuentro:

- ✓ **Jorge Castellar**, Alcalde de San Jacinto.
- ✓ **Wilfrido Romero**, Alcalde de San Juan.
- ✓ **Jorge Guette**, Municipio de San Jacinto.

Por parte del Viceministerio de Agua y Saneamiento se presenta **Jackeline Meneses**, Subdirectora de Proyectos, **Eduardo Cañas**, Coordinador del Grupo de Evaluación de Proyectos y **Laura Mejía**, Evaluadora preliminar del mismo equipo.

Se pronuncia el señor alcalde de San Jacinto, **Jorge Castellar**, y presenta un contexto al proyecto de acueducto regional optimizado San Juan –San Jacinto optimizado, que tuvo seguimiento de la contraloría provincial, empalme de las administraciones de ambos municipios y apoyo del PDA Aguas del Bolivar. Posteriormente menciona que el alcance de dicho proyecto no incluyó las redes internas de los Municipios, micro-medidores, accesorios y algunos tramos existentes de la línea de aducción, mismos que serían apremiantes.

Para abordar lo anterior tendrán objeto los proyectos que permitan la optimización de redes internas, 5 km. de tubería en aducción, la ampliación de cobertura del servicio y capacidad de almacenamiento, instalación de micro-medidores y creación de cultura de consumo responsable del agua.

Interviene el señor alcalde de San Juan Nepomuseno, **Wilfrido Romero**, quien a su vez identifica la infraestructura actual, los estudios que se han adelantado para la ampliación de las

redes internas, la construcción de unos tanques de almacenamiento de 1200 m3 y las obras para la puesta en marcha de otras unidades en el Municipio que representa. Informa que el proyecto entregado por el Ministerio y el PDA cubrió 2.2 km de cambio de tubería, e indica que de la Bocatoma de San Agustín salen 110 L/s y a Perico llegan alrededor de 90 L/s aproximando pérdidas de 20 L/s en un trayecto de más de 20 km. Coincide con el Alcalde Jorge sobre la importancia de renovar la línea de aducción en el tramo obsoleto que representa más pérdidas y confirma la necesidad de crear una consciencia sobre el agua en la población.

Toma la palabra la Ingeniera **Jackeline Meneses**, Subdirectora de Proyectos, quien retoma la visita efectuada a San Juan Nepomuseno, oportunidad en la que se visitó la nueva PTAP de 120 L/s, construida con recursos DNP a través del programa de contrato plano. Se evidenció que el sistema regional está funcionando y como lo advierten los alcaldes, algunos tramos de la aducción requieren intervención por las pérdidas mencionadas.

En ese sentido, revela, resultaría necesaria una inversión en estudios para evaluar la conducción y así formular un proyecto regional con la meta de optimizar la infraestructura. Para la problemática interna de cada municipio, es ineludible, a su vez, partir de una consultoría que permita determinar la sectorización de las redes necesarias considerando, además, las características de crecimiento e hidrografía de los municipios.

Sobre la información entregada por el sr. Alcalde William Romero, esta fue revisada y se trata de unos presupuestos y análisis de precios unitarios, que estiman el monto de las inversiones requeridas. Se recuerda a los Alcaldes que los proyectos se deben formular en el marco de la Resolución 661 de 2019, que establece los requisitos de presentación y viabilización de proyectos del sector.

Finalmente, en vista de que varios de los temas tratados requieren gestión del PDA, se sugiere coordinar una reunión con Aguas de Bolivar para estudiar los puntos discutidos y definir un plan de trabajo conjunto en el menor plazo posible.

FIRMAS:

En anexos se comprueba asistencia de los participantes del encuentro.

ANEXOS:

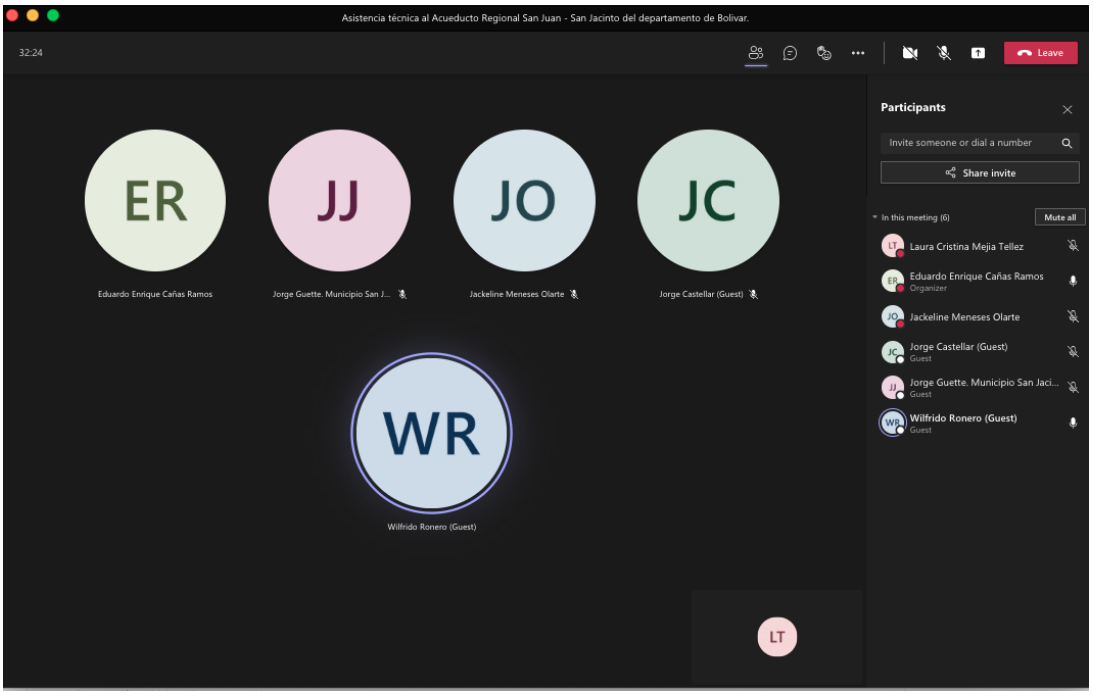
Asistencia técnica al Acueducto Regional San Juan - San Jacinto del departamento de Bolivar.
32:24
Leave
Participants
Invite someone or dial a number
Share invite
In this meeting (6)
Mute all
Laura Cristina Mejia Tellez
Eduardo Enrique Cañas Ramos
Organizer
Jackeline Meneses Olarte
Jorge Castellar (Guest)
Guest
Jorge Guette. Municipio San Jaci...
Guest
Wilfrido Ronero (Guest)
Guest
ER
JJ
JO
JC
WR
Eduardo Enrique Cañas Ramos
Jorge Guette. Municipio San J...
Jackeline Meneses Olarte
Jorge Castellar (Guest)
Wilfrido Ronero (Guest)
LT

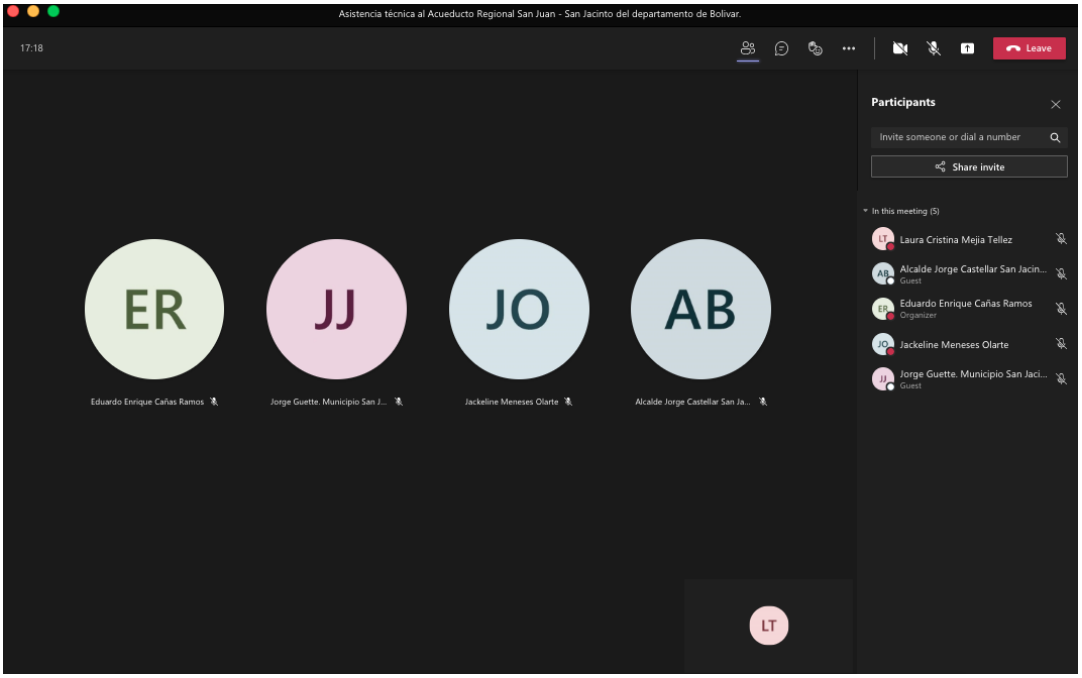
Asistencia técnica al Acueducto Regional San Juan - San Jacinto del departamento de Bolivar.
17:18
Leave
Participants
Invite someone or dial a number
Share invite
In this meeting (5)
Laura Cristina Mejia Tellez
Alcalde Jorge Castellar San Jacin...
Guest
Eduardo Enrique Cañas Ramos
Organizer
Jackeline Meneses Olarte
Jorge Guette. Municipio San Jaci...
Guest
ER
JJ
JO
AB
Eduardo Enrique Cañas Ramos
Jorge Guette. Municipio San J...
Jackeline Meneses Olarte
Alcalde Jorge Castellar San Ja...
LT
