ACTA MESA DE TRABAJO No. 5 - 27/09/2021

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 27 de septiembre de 2021
HORA:	De 2:00 pm a 4:00 pm 2 horas
LUGAR:	**Reunión virtual.**
ASISTENTES:	German A. Naranjo F., Grupo de Evaluación MVCT, 3015296421. Giovanna Naranjo Guzman, Gerencia de Servicios Públicos de la Gobernación de Antioquia - PDA, planeaciongsp@antioquia.gov.co Luis Fernando González Aguirre, Coordinador Infraestructura PDA, Gerencia de Servicios Públicos del Departamento de Antioquia, Fernandogonzalez.Gsp@Gmail.Com Darwin Felipe Pulgaín Correa, PDA, darwinpulgarin.gsp@gmail.com Fernando Ibáñez Camacho, Ingeniero de apoyo Técnico, Consultoría Universidad de Antioquia, fersaga13@gmail.com
INVITADOS:	german.naranjo.faccini@gmail.com planeaciongsp@antioquia.gov.co apoyoformulacionpda9@udea.edu.co gnaranjogsp@gmail.com isacanasplaneacion@gmail.com darwinpulgarin.gsp@gmail.com formulacionpda3@udea.edu.co fersaga13@gmail.com

ORDEN DEL DIA:

1. Mesa de trabajo para seguimiento general al ajuste y complementación del proyecto de “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO DE SANTA RITA EN EL MUNICIPIO DE ANDES, ANTIOQUIA”, según los requerimientos presentados por el MVCT en su proceso de evaluación.

DESARROLLO:

Esta mesa de trabajo virtual se desarrolló el lunes 27 de septiembre de 2021, iniciando a las 2:00 p.m., con la finalidad de revisar el avance en la complementación de las observaciones realizadas a la fecha por el equipo de evaluación del MVCT para el ajuste y complementación del proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO DE SANTA RITA EN EL MUNICIPIO DE ANDES, ANTIOQUIA”.

Se da inicio con el saludo a los asistentes, haciendo la notación que no se presento nadie por parte del Municipio, siendo que fueron convocados a la presente mesa de trabajo y que son en parte responsables en cuanto a el avance en cuento a los temas prediales.

El MVCT y el PDA de Antioquia, solicitan al consultor que exponga el avance al momento, la Consultoría procede con su explicación, inicia comentando sobre los temas de topografía y suelos, que dado a que se requieren trabajos de campo para su complementación, estos han tenido dificultades para ser ejecutados, ante lo que el PDA informa que se están tomando acciones para que el municipio apoye con estas actividades, donde se remite un correo para que la Consultoría revise con el Municipio si es posible que estas gestiones se realicen por la entidad territorial. Dadas estas complejidades la Consultoría no presenta posibles fechas de presentación de los ajustes correspondientes.

Se continua la exposición evidenciando el trabajo adelantado en la complementación de los temas de análisis de alternativas y realización de proyectos por etapas, donde la consultoría expone que se realizaron aclaraciones y justificaciones, así como una complementación detallada siguiendo la normatividad sobre las alternativas donde se presentara para soporte una matriz multicriterio.

Sobre las observaciones hidráulicas, se procede a presentar el ajuste realizado indicando las diferentes actividades realizadas para dar aclaraciones y solucionar los temas observados por el MVCT.

El MVCT solicita que la Interventoría sea la encargada de realizar una revisión detallada del proyecto y que sea quien de su aprobación antes de su envió al MVCT.

El consultor se compromete a remitir la información a la interventoría de forma integral este viernes 01/10/2021, luego de lo cual la interventoría procederá con su revisión y aprobación, se espera en una semana presentar estos ajustes al MVCT (08/10/2021).

El PDA pregunta si luego de realizar los ajustes de topografía y suelos afectaría lo trabajado en hidráulica, ante lo que el Consultor indica que considerar que la hidráulica no será afectada, pero lo que si puede cambiar son los presupuestos, en condiciones de entibados o recomendaciones geotécnicas, por ejemplo.

El PDA solicita que el Consultor se comprometa a dar respuesta al correo para ver si las gestiones para la realización de los componentes de terreno en topografía y geotecnia podrán ser aportadas por el Municipio.

De igual manera el PDA pregunta al MVCT por observaciones sobre otros componentes, el MVCT indica que al momento no se tienen otras observaciones, tan pronto los especialistas presenten las mismas se procederá a remitir por correo el documento y a coordinar una mesa de socialización de las mismas.

Con lo cual se da por terminada la reunion.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir ajustes en hidráulica a la interventoría	Consultoría	01/10/2021
2	Remitir ajustes al MVCT, si la consultoría cumple con la entrega definida.	PDA	08/10/2021
3	Dar respuesta al correo del PDA sobre gestiones del Municipio en cuanto a las actividades de terreno en topografía y suelos.	Consultoría	01/10/2021

FIRMAS:

Se presentan a manera de firmas la imagen de la reunioin evidenciando la presencia de los asistentes:

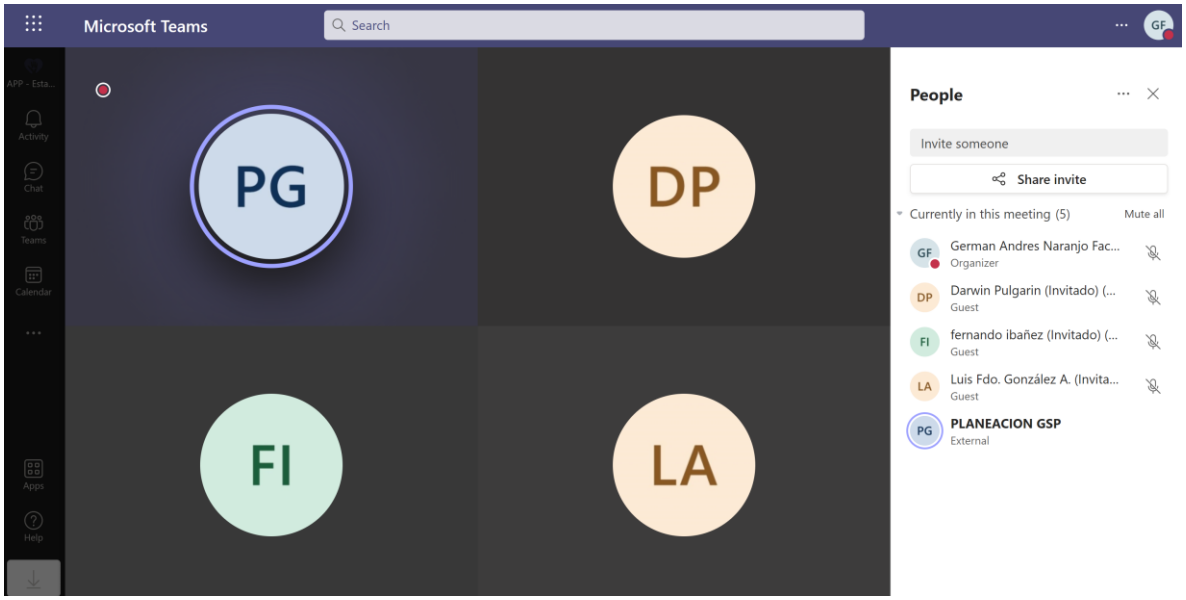

Elaboró: German A. Naranjo F. – Grupo de Evaluacion VASB-MVCT.
Fecha: 27-09-2021
