ACTA No. 01

DATOS GENERALES

FECHA:	Ciudad, Bogotá 19 de abril de 2022
HORA:	De 10:00 a 12:50 PM
LUGAR:	Reunión virtual – Microsoft Teams
ASISTENTES:	William Zambrano, Grupo Evaluación de proyectos MVCT
INVITADOS:	-Fabian Mauricio Echeverria Peinado Alcalde Municipal de la Unión - Nariño -Manuel Jesús Moreno Guaca Secretario de Planeación Municipal -Jiclit Montañez Asesor Dirección Ejecutiva FCM -Ivan Ceron Rep. legal de la Unión Temporal Consultorías la unión 2015

ORDEN DEL DIA:

Socializar las principales observaciones resultantes de la Revisión Documental Preliminar correspondiente al proyecto "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL LA CAÑADA DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN-DEPARTAMENTO DE NARIÑO".

DESARROLLO:

Se inicia la reunión por parte del Ingeniero William Zambrano, Evaluador de Proyectos del VASB, Agradeciendo a cada uno de los presentes por su asistencia en la reunión y se procede con la presentación de cada uno de los asistentes. (ver anexo).

El ingeniero William, informo en la mesa de trabajo que es necesario que todos los involucrados o responsables del proyecto estén presente en la reunión, con el objetivo de aclarar dudas en cuanto a la documentación solicitada. Así mismo el ingeniero William informo, que el proyecto no presenta la documentación en su totalidad, para continuar con el proceso de evaluación. Con lo anterior Ivan Ceron Rep. legal de la Unión Temporal, añadió que la información se cargó en su totalidad y que en el cargue se presentaron inconvenientes con la plataforma, así mismo se dispondrán a verificar los documentos con el objetivo de que este ministerio continue con la evaluación del proyecto.

Él ingeniero William Zambrano, le indico al cuerpo formulador y funcionarios de la alcaldía, que el proyecto presenta falencias en los componentes (Generales, legales, institucionales, técnicos, financieros, ambientales y prediales. En ese sentido en la reunión se explicó de manera detallada cada documento faltante del proyecto y la forma

de presentación ante el ministerio, de acuerdo a la resolución 0661 de 2019. Así mismo el ingeniero Ivan Ceron Rep. legal de la Unión Temporal– Equipo Formulador del Proyecto, indico que por parte de los formuladores se cuenta con la documentación correspondiente y que se dispondrán a enviar la información.

Manuel Jesús Moreno Guaca Secretario de Planeación Municipal, solicitó el envío de las diapositivas donde se indicaban los puntos tratados del proyecto. Con lo anterior, el ingeniero William se comprometió a enviar el documento a más tardar el día hoy 19/04/2022.

Adicionalmente William Zambrano, indicó que los documentos se deben enviar lo más pronto posible y según lo contemplado en la resolución 0661 de 2019 del MVCT. Por lo anterior, se pactó una fecha límite para el envió de los documentos, la cual corresponde al 12 de mayo del 2022.

Se agradece a cada uno de los asistentes y se da por terminada la reunión.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Enviar las diapositivas y formatos de la resolución 0661 de 2019	William Zambrano, Grupo Evaluación de proyectos MVCT	Martes 19 de abril de 2022
2	Enviar la totalidad de los documentos.	-Fabian Mauricio Echeverria Peinado Alcalde Municipal de la Unión - Nariño -Manuel Jesús Moreno Guaca Secretario de Planeación Municipal -Jiclit Montañez Asesor Dirección Ejecutiva FCM -Ivan Ceron Rep. legal de la Unión Temporal Consultorías la unión 2015	Jueves 12 de mayo de 2022

FIRMAS: En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral de asistentes.

Elaboró: William Farid Zambrano Guillen
Fecha: 19 de abril de 2022

ANEXOS

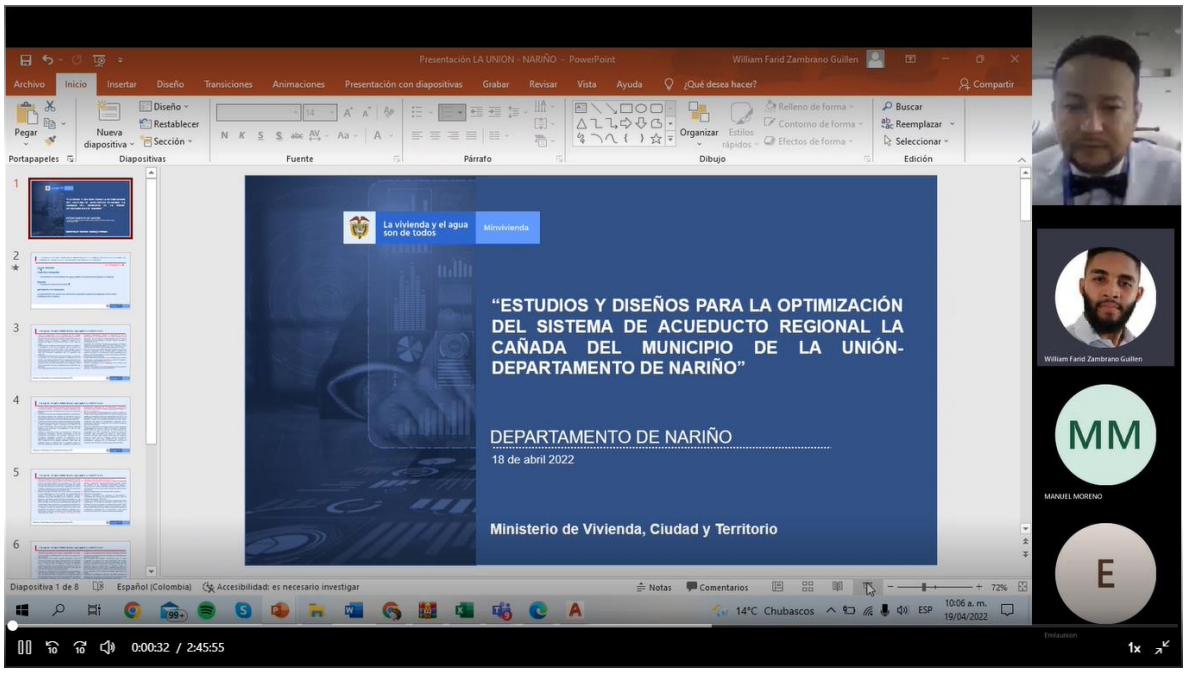
Presentación LA UNION - NARIÑO - PowerPoint
William Farid Zambrano Guillen
La vivienda y el agua son de todos
Minvivienda
"ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL LA CAÑADA DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN-DEPARTAMENTO DE NARIÑO"
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
18 de abril 2022
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
William Farid Zambrano Guillen
MM
MANUEL MORENO
E
0:00:32 / 2:45:55
1x

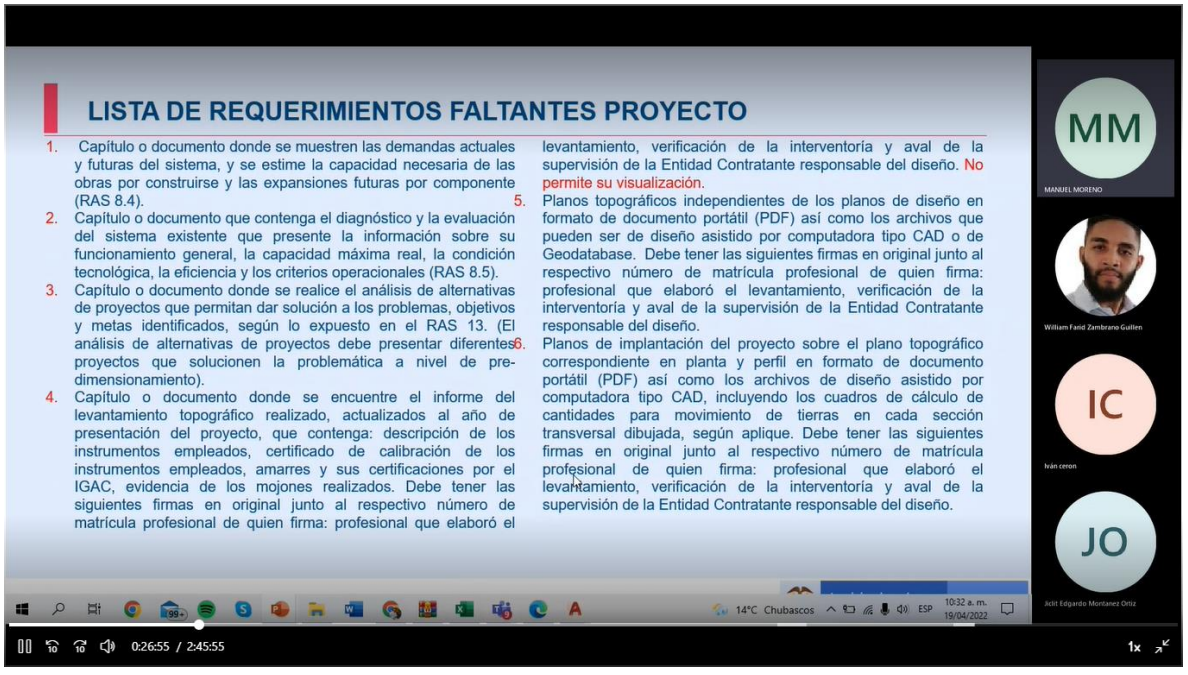
LISTA DE REQUERIMIENTOS FALTANTES PROYECTO
1. Capítulo o documento donde se muestren las demandas actuales y futuras del sistema, y se estime la capacidad necesaria de las obras por construirse y las expansiones futuras por componente (RAS 8.4).
2. Capítulo o documento que contenga el diagnóstico y la evaluación del sistema existente que presente la información sobre su funcionamiento general, la capacidad máxima real, la condición tecnológica, la eficiencia y los criterios operacionales (RAS 8.5).
3. Capítulo o documento donde se realice el análisis de alternativas de proyectos que permitan dar solución a los problemas, objetivos y metas identificados, según lo expuesto en el RAS 13. (El análisis de alternativas de proyectos debe presentar diferentes proyectos que solucionen la problemática a nivel de pre-dimensionamiento).
4. Capítulo o documento donde se encuentre el informe del levantamiento topográfico realizado, actualizados al año de presentación del proyecto, que contenga: descripción de los instrumentos empleados, certificado de calibración de los instrumentos empleados, amarres y sus certificaciones por el IGAC, evidencia de los mojones realizados. Debe tener las siguientes firmas en original junto al respectivo número de matrícula profesional de quien firma: profesional que elaboró el levantamiento, verificación de la interventoría y aval de la supervisión de la Entidad Contratante responsable del diseño. No permite su visualización.
5. Planos topográficos independientes de los planos de diseño en formato de documento portátil (PDF) así como los archivos que pueden ser de diseño asistido por computadora tipo CAD o de Geodatabase. Debe tener las siguientes firmas en original junto al respectivo número de matrícula profesional de quien firma: profesional que elaboró el levantamiento, verificación de la interventoría y aval de la supervisión de la Entidad Contratante responsable del diseño.
6. Planos de implantación del proyecto sobre el plano topográfico correspondiente en planta y perfil en formato de documento portátil (PDF) así como los archivos de diseño asistido por computadora tipo CAD, incluyendo los cuadros de cálculo de cantidades para movimiento de tierras en cada sección transversal dibujada, según aplique. Debe tener las siguientes firmas en original junto al respectivo número de matrícula profesional de quien firma: profesional que elaboró el levantamiento, verificación de la interventoría y aval de la supervisión de la Entidad Contratante responsable del diseño.
MM
MANUEL MORENO
William Farid Zambrano Guillen
IC
iván ceron
JO
Jicit Edgardo Montanez Ortiz
0:26:55 / 2:45:55
1x
