ACTA No. 13

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 17 de octubre de 2023
HORA:	De 10:00 a 10:30 horas
LUGAR:	**Virtual**
ASISTENTES:	Néstor Apraez Caicedo, Consultoría del proyecto Patricia Mendoza, Alcaldía Municipal de Rionegro Jairo Arely Urbina Gómez, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP Jaime Alberto Fuentes Romero, Contratista Grupo Evaluación de Proyectos MVCT-VASB-DIDE-SDP
INVITADOS:	No aplica

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes e introducción
2. Reunión en el marco de la evaluación estructural del proyecto
3. Comentarios de los asistentes
4. Cierre de la reunión

DESARROLLO:

1. Presentación de los asistentes e introducción. Participantes de la entidad territorial, consultoría del proyecto y evaluadores del MVCT.
2. Reunión en el marco de la evaluación estructural del proyecto OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO PAPAYAL, MUNICIPIO DE RIONEGRO –SANTANDER
3. Comentarios de los asistentes
   - El Ingeniero Jaime Fuentes abre la reunión cediendo la palabra a la consultoría, para que se refiera de la necesidad de la reunión.
   - El Ingeniero Nestor Apraez, indica que la semana pasada recibió observaciones estructurales. Hay observaciones a la patología, sobre el modelo matemático, que no está conforme a los resultados de laboratorio, que es la resistencia corregida. Lo que significa que el estructural de la patología, tiene que hacer ese modelo conforme a las resistencias de laboratorio.
   - El Ingeniero Jairo Urbina, indica que se tuvieron en cuenta los resultados del esclerómetro, y no los resultados procesados.

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co

- El Ingeniero Nestor Apraez, pregunta si es que no se especifica la resistencia del concreto para columnas y vigas. Pregunta si hace falta definir con qué resistencia se hizo la evaluación del concreto.
- El Ingeniero Jairo Urbina, indica que en el informe no se evidencia la resistencia de los materiales. En el reporte, debe verse la resistencia de los materiales. Indica que debe tenerse en cuenta el análisis hidrodinámico.
- El Ingeniero Nestor Apraez indica que se pasarán las cantidades de obra a los planos estructurales.
- El Ingeniero Jairo Urbina, indica que se deben recalcular los momentos, calculando el coeficiente de durabilidad ambiental. Para el arriostramiento, incluir el diseño en la memoria.
- El Ingeniero Nestor Apraez indica que va a indicar al estructural, que realice el arriostramiento pertinente dentro del programa.
- El Ingeniero Jairo Urbina, indica que respecto del tanque, debe evidenciarse que se encuentra en buen estado. Debe analizarse sus características. Cómo se garantiza que ese tanque, durante la etapa de ejecución, no vaya a presentar problemas.
- El Ingeniero Nestor Apraez indica que se deben sellar algunas zonas del tanque.
- El Ingeniero Jairo Urbina, indica que lo sorprendió que no se extrayeron núcleos de concreto. Indica que debe aportarse una respuesta mejor. La patología debe robustecerse.
- El Ingeniero Nestor Apraez indica que va entregar estas inquietudes a los ingenieros encargados. Se compromete a entregar las subsanaciones estructurales para el día 30 de octubre de 2023.
- El Ingeniero Jairo Urbina indica que se deben obtener los ensayos de resistencia del concreto y la distribución de las losas.

4. Cierre de la reunión

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remisión de subsanaciones estructurales del proyecto	Néstor Apraez Caicedo, Consultoría del proyecto	30/10/2023

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co

FIRMAS:

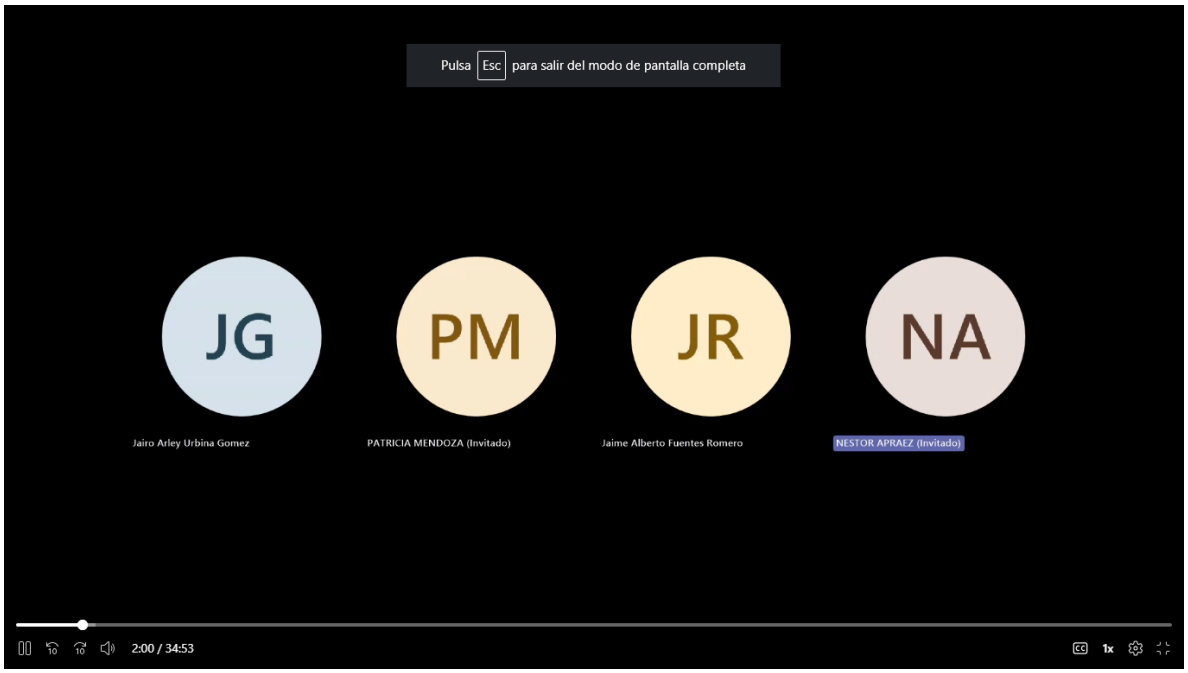

Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico	Rol
Jaime Alberto Fuentes Romero	10/17/23, 10:00:15 AM	10/17/23, 10:39:21 AM	39 min 6 s	JFuentes@minvivienda.gov.co	Organizador
Jairo Arley Urbina Gomez	10/17/23, 10:00:43 AM	10/17/23, 10:39:17 AM	38 min 33 s	JUrbina@minvivienda.gov.co	Moderador
NESTOR APRAEZ (Invitado)	10/17/23, 10:01:11 AM	10/17/23, 10:39:18 AM	38 min 6 s		Moderador
PATRICIA MENDOZA (Invitado)	10/17/23, 10:02:58 AM	10/17/23, 10:06:58 AM	3 min 59 s		Moderador
PATRICIA MENDOZA	10/17/23, 10:13:14 AM	10/17/23, 10:38:13 AM	24 min 58 s		Moderador

Elaboró: Jaime Alberto Fuentes Romero
Fecha: 17-10-2023

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co
