FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0**, Fecha:** 09/06/2023**, Código:** GDC-F-01

Reunión Proyecto: OPTIMIZACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EXISTENTES EN LOS MUNICIPIOS DE VILLA DEL ROSARIO Y LOS PATIOS, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

Fecha: 13 marzo 2024
Hora: 11:00 am

Asistentes:
Jorge Beltrán Calvo – MVCT
Rafael Gallardo Eraso – MVCT
Mayra Delgado – Secretaría de Agua PDA Norte de Santander
Juan David Ratkovich – Municipio de Cúcuta
Diego F Mora – Gerente EIS Cúcuta
Luz Marina Barbosa – Aguas Kpital Cúcuta
Oscar Javier Laguado – Aguas Kpital Cúcuta
Tito Bonilla – Municipio de Los Patios
Hugo Vergel – Aguas Kpital Cúcuta
Mayra Perez – EICVIRO E.S.P, Villa del Rosario

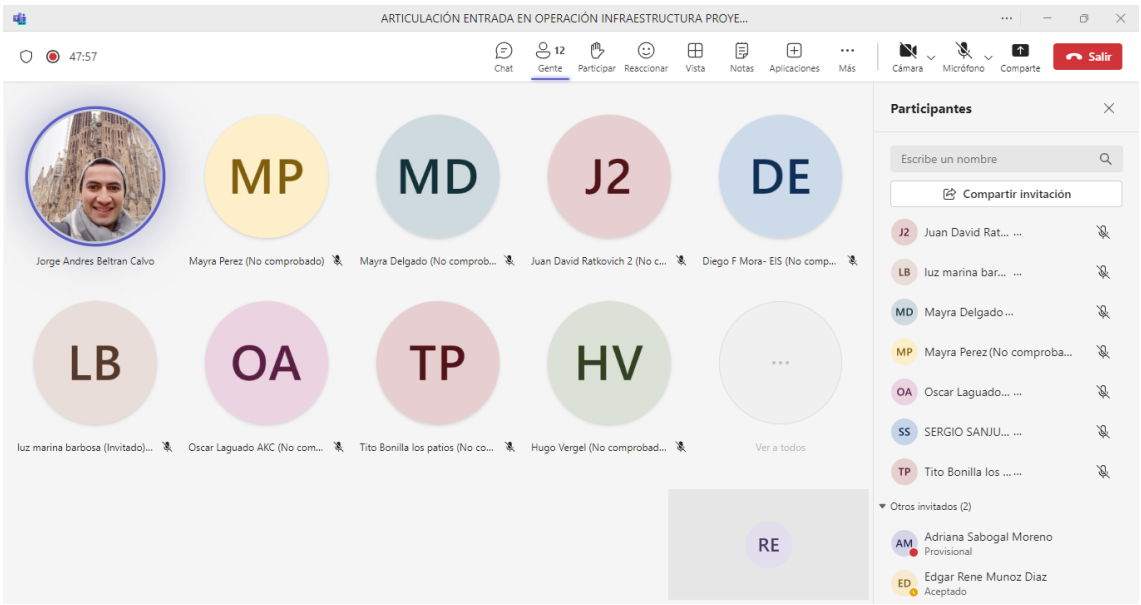

ORDEN DEL DIA:

Seguimiento a la entrega parcial del proyecto OPTIMIZACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EXISTENTES EN LOS MUNICIPIOS DE VILLA DEL ROSARIO Y LOS PATIOS, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER y recibo de los municipios de Villa del Rosario y Los Patios

DESARROLLO:

El MVCT indicó que de acuerdo con los compromisos la EIS Cúcuta y Aguas Kapital debía enviar la propuesta del valor del valor del agua en bloque a los municipios de Los Patios y Villa del Rosario.

La EIS Cúcuta manifestó que habían enviado la propuesta la semana pasada y que habían sostenido una reunión el día de hoy 13 de marzo de 2023, con representantes de los municipios y de los operadores de estos y en donde quedaron que los municipios revisarían con los operadores la propuesta

Así mismo indicaron que en Los Patios los puntos de conexión en el municipio solo estaría uno habilitado de los 3 que se deben hacer y que sería insuficiente y que falta una conexión que depende de un permiso con el INVIAS.

Afirmaron que el siguiente paso es reunirse con los operadores para suscribir el contrato de suministro de agua en bloque

El MVCT preguntó si los municipios ya aceptaron la propuesta del valor del agua en bloque y que, si en un acta quedó esa aceptación, ellos indicaron que el acta está en elaboración y que después se entregaría una copia al MVCT.

El MVCT preguntó por el tema de la conexión en los Patios y el PDA indicó que hasta el viernes se tiene el recorrido con el operador de Los Patios y se verificarán los puntos de conexión, que está en trámite el permiso ante el INVIAS para hacer la otra conexión.

Así mismo indicó que por ahora se realizará entregar agua con el punto de 6”

El PDA indicó que Villa del Rosario se va a realizar la visita el viernes y firmar el acta de recibo parcial la próxima semana.

El MVCT preguntó a los representantes de los municipios de Villa del Rosario y Los Patios los avance que se han tenido con los operadores para la articulación de la entrada de operación.

El representante del municipio de Los Patios indicó que ellos vienen adelantando la entrega con el operador (agua de los Patios) y con su interventor, así mismo indicaron que entregaron los documentos del costo del agua en bloque para luego definir los procedimientos y definir el valor que aplicará a los usuarios, esperan tener en 15 días tener un borrador de la tarifa. Así mismo, manifestaron que en 15 días tendrían un borrador con EIS Cúcuta y Aguas Kapital para el valor del agua en bloque

Mayra Perez de EICVIRO E.S.P representante del municipio de Villa del Rosario indicó que ya han realizado las mesas de trabajo con el operador Acualia, para definir la tarifa a los usuarios y que respecto a la infraestructura ya se hicieron las pruebas de conexión al tanque de Acualia, también han tenido reunión con el PDA de Norte de Santander para realizar los recorridos y el recibo parcial

También manifestó que están pendiente de hacer el otrosí para la entrega de los tanques al operador para llegar al 5 de abril con los documentos listos.

Indicaron que por parte de Ecopetrol se recibió y se entregó toda la información técnica para al prestador para que pueda recibir la infraestructura (los tanques).

El MVCT indicó que los tiempos se deberían acelerar, ya que la entrada en operación se debe hacer antes del 5 de abril, por lo que los recorridos se debían hacer en la semana y a la fecha no se ha realizado para firmar las actas de entrega parcial, por lo que se pide la fecha estimada para la firma de los otrosíes entre los municipios y los operadores. Se solicitó al PDA definir las fechas y hora de los recorridos.

El PDA de Norte de Santander indicó que las visitas están programadas para el viernes 15 de marzo de 2024, falta definir la hora para que quede programar los recorridos.

En la reunión y entre las partes se definió que para el municipio de Los Patios el recorrido se realizará a las 8:00 am y para Villa del Rosario a las 3:00 pm.

También se definió que la reunión entre los tres operadores se debe realizar para la próxima semana, Aguas Kapital entregó a la EIS Cúcuta el borrador del contrato del suministro de agua en bloque y se enviará a los municipios para su revisión el 13 de marzo de 2024.

El MVCT, indicó que programará reunión para el próximo martes 20 de marzo de 2024, con el fin de hacer el seguimiento a tres temas:

1- Recorridos
2- Contrato de agua en bloque y actas parciales de entrega
3- Otrosíes para el recibo de las obras de los tanques

COMPROMISOS:

- El PDA de Norte de Santander y los representantes de los municipios de Los Patios y Villa del Rosario con sus operadores realizarán el recorrido el 15 de marzo de 2024, a las 8:00 am con el municipio de Los Patios y a las

3:00 pm con el municipio de Villa del Rosario, para posteriormente se realizar la firma del acta de entrega parcial de las obras en la semana del 18 al 22 de marzo de 2024.

- Reunión para la revisión de la Munita del del contrato de suministro de agua en Bloque entre los tres operadores de los municipios de Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios en la semana del 18 al 22 de marzo de 2024, dado que se enviará el borrador del contrato a los municipios para su revisión el 13 de marzo de 2024.

- El MVCT citará a reunión para el 20 de marzo de 2024 para realizar seguimiento a los compromisos - 11:00am
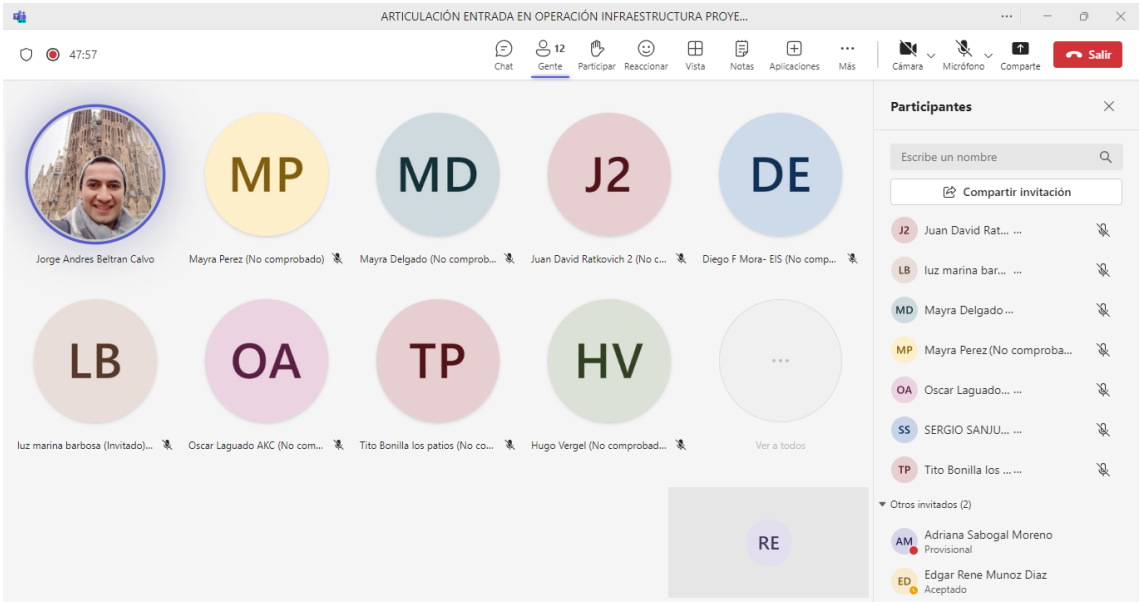
FIRMAS:
