ACTA No. 2

DATOS GENERALES

FECHA:	29 de mayo de 2024
HORA:	De 03:00 pm a 03:30 pm
LUGAR:	**Aplicativo Teams**
ASISTENTES:	• Esteban Eduardo Jaimes - Procurador Judicial (convocante) • Henry Anaya – director Unidad de Servicios Públicos de Bochalema, unisepublicos@bochalema-nortedesantander.gov.co • Jhonattan Boada – secretario de Planeación del municipio de Bochalema, planeacion@bochalema-nortedesantander.gov.co • Luis Carlos Garcés Fernández – Profesional Especializado, Evaluador líder, Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT, lgarces@minvivienda.gov.co
INVITADOS:	MVCT Alcaldía municipal de Bochalema Departamento de Norte de Santander Corporación autónoma regional de la Frontera Nororiental Defensoría del pueblo Regional Norte de Santander

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes.
2. Seguimiento al avance del proyecto "CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE BOCHALEMA, NORTE DE SANATANDER", en marco de los fallos judiciales de fecha 22 de junio de 2017 y 12 de septiembre de 2019.
3. Compromisos.

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co

DESARROLLO:

El Dr. Esteban contextualiza la reunión, explicando que la mesa se citó para realizar el seguimiento al avance del proyecto de la PTAR Bochalema, en marco de los fallos judiciales de fecha 22 de junio de 2017 y 12 de septiembre de 2019. Se realizó el pasado seguimiento el día 16 de mayo de 2024, en el cual quedaron compromisos como realizar mesas de trabajo los días 21 y 22 mayo, realizar gestiones ante CORPONOR y avanzar en la revisión de los componentes pendientes del proyecto por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

El ing. Luis Carlos explica que efectivamente se cumplieron los compromisos adquiridos en la pasada reunión, teniendo los siguientes avances y observaciones:

- Se realizó mesa de trabajo del componente de topografía el día 21 de mayo, teniendo participación del topógrafo y especialista hidráulica del equipo de consultoría. Se aclararon todas las inquietudes con relación a las observaciones formuladas por el MVCT. A la fecha no se ha presentado la documentación actualizada para este componente.
- Se realizó mesa de trabajo del componente predial el día 22 de mayo, teniendo participación del municipio de Bochalema, consultoría y especialista del MVCT. Teniendo que la consultoría presentó el mismo de la reunión la documentación predial actualizada, la cual se encuentra en revisión por parte de la especialista del MVCT.
- La mesa del componente institucional se reprogramo para el día 30 de mayo, a las 3 pm, toda vez que a la especialista del MVCT se le presentó un percance que impidió su participación en le mesa de trabajo.
- Sobre la revisión de los componentes pendientes, se tiene que ya fueron revisados en su totalidad, teniendo que la revisión del componente hidráulico se extendió un poco más de lo previsto, pero fueron enviadas las observaciones hace un par de horas. Sobre dicho componente se tiene prevista una mesa de trabajo para la próxima semana, en aras de dar claridad sobre las observaciones y poder avanzar exitosamente en la subsanación de estas. El ingeniero resalta que la ingeniera Angela de la consultoría se excuso por no poder asistir a la reunión.

El Dr. Henry informa que adelantaron acercamientos con CORPONOR, que están a la espera de una respuesta sobre el particular.

El Ing. Luis Carlos acota que se debe tener un concepto oficial (documentado) sobre el permiso de vertimientos por parte de CORPONOR, en aras de tener

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co

soportes para el componente ambiental del proyecto cuanto a futuro se presente para concepto favorable en el mecanismo de viabilización del MVCT.

El Dr. Henry se compromete a solicitar el oficio que documente el concepto de CORPONOR sobre el permiso de vertimientos del proyecto

El Dr. Esteban propone realizar la próxima reunión de seguimiento el día 26 de junio de 2024, a las 3 pm. Los participantes están de acuerdo con la fecha.

No siendo otro el particular, se concertan los compromisos y se procede con el cierre de la reunión.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Presentación de la documentación actualizada de topografía del proyecto	Municipio de Bochalema-Consultoría	Por definir
2	Mesa de trabajo del componente hidráulico	MVCT-Municipio de Bochalema-Consultoría	Próxima semana
3	Solicitar concepto formal a CORPONOR sobre el permiso de vertimientos	Municipio de Bochalema - CORPONOR	Por definir
4	Próxima reunión de seguimiento	Procuraduría (Convocatoria)	26-06-2024

FIRMAS:
Ver imagen de la asistencia virtual.

Elaboró: Luis Carlos Garcés Fernández
Fecha: 29-05-2024

Convocatoria (enlace)
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTAzNWNiYjMtYTc2NC00MmEzLWJmZmMtMGYyYzc5YmFmMDZi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22fcb47a6d-46c6-4bf3-b119-d927900ffc19%22%2c%22Oid%22%3a%22b9170508-c248-4bbc-9c8f-39fcad0dc844%22%7d

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co

Registro de asistencia

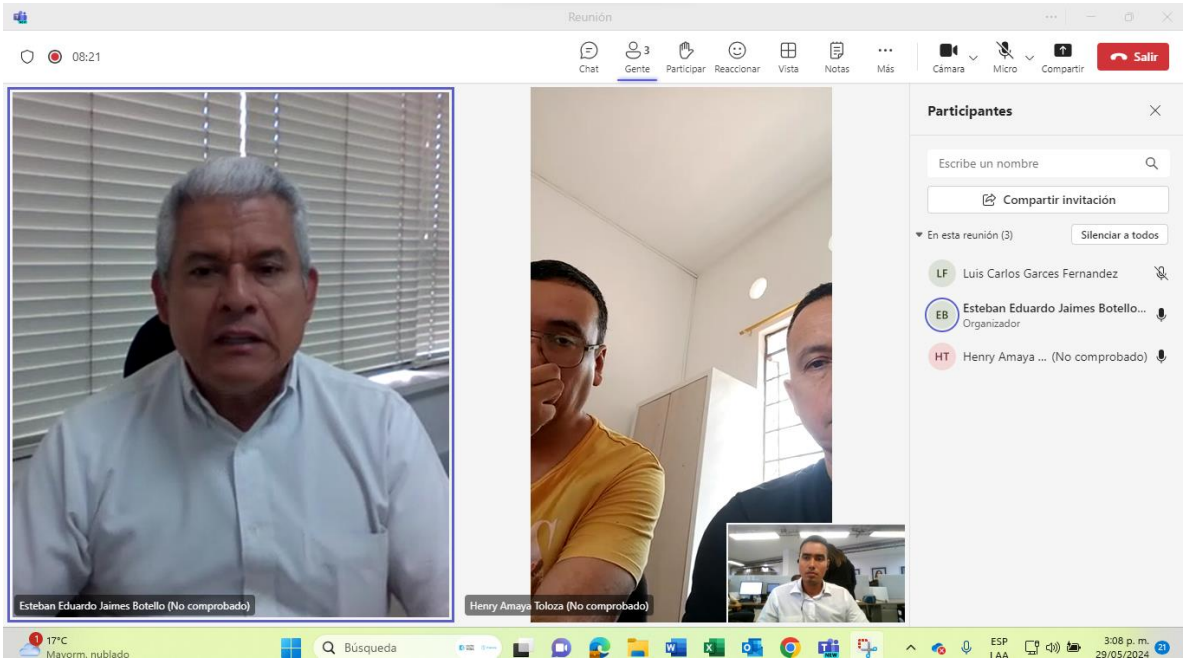

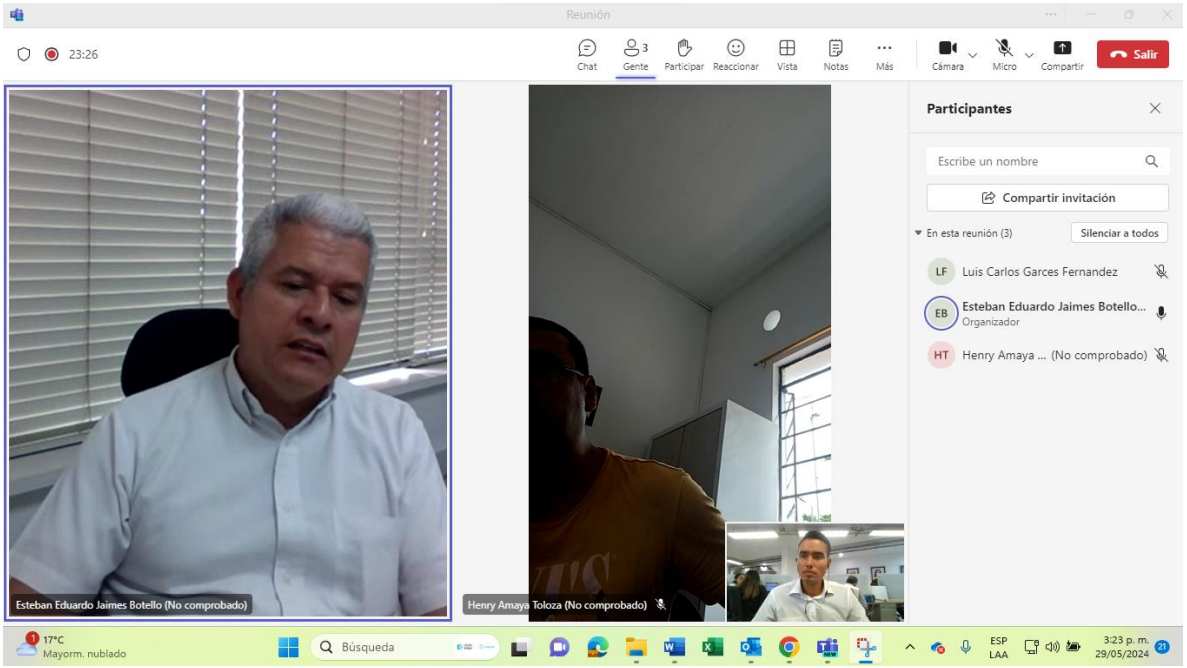

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX
www.minvivienda.gov.co
