ACTA No. 02

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 3 de octubre de 2024
HORA:	De 09:00 a 10:00 horas
LUGAR:	Bogotá, sede administrativa MVCT.
ASISTENTES:	Jorge Luis Cabrales, asesor de la alcaldía de Tierralta, Córdoba, Jorge.cabralest@gmaail.com Alvaro Andrés Corcho Ramírez, contratista, evaluador líder, grupo de evaluación de proyectos, VASB, MVCT, AAcorcho@minvivienda.gov.co

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de participantes.
2. Revisión de los documentos pendientes del componente hidráulico.

DESARROLLO:

1. Se reúnen para la asistencia técnica del 3 de octubre de 2024 en la sede administrativa del MVCT en Bogotá el Ingeniero Jorge Cabrales, asesor del formulador del proyecto 1-2024-83 CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MULTIVERADAL DEL CENTRO POBLADO DE BATATA Y LAS VEREDAS LA SIERPE, MURMULLO MEDIO, MURMULLO BAJO, EL ÁGUILA Y PUERTO RICO, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TIERRALTA – CÓRDOBA. Por parte del ministerio, y quien preside la mesa técnica, se encuentra el ingeniero Alvaro Corcho evaluador líder del proyecto.

2. Se revisan los diferentes componentes, haciendo énfasis en la información faltante para completar la revisión, dentro de esto se encuentra que el levantamiento topográfico tiene falencias, hay curvas superpuestas, no se identifican claramente los cruces y se menciona que hay tramos de la aducción dentro del lecho de la quebrada.

3. Sobre la geotecnia, en la reunión del 19 de septiembre, se indicó la necesidad de realizar trabajo de campo para cumplir con los requerimientos de sondeos en las estructuras puntuales, ya que se destaca que, en los pasos elevados (proyectados, pero no identificados), bocatoma y desarenadores, entre otros, no se cuenta con información. Los sondeos se limitan a tanques, redes, y plantas.

4. Por medio de llamada telefónico con el consultor, se explica esta información, y se establecen algunos compromisos, se indica que, si bien no se relaciona algo de información, esta se encuentra en los documentos del consultor.
5. Se explica plano a plano la información faltante, en el caso de la topografía las curvas de nivel que se sobreponen unas a otras, las vías no se encuentran plenamente identificadas, en los planos de bocatomas y desarenador, faltan los cuadros accesorios, y no se identifican las láminas de agua. No hay congruencia entre la planta y el diseño estructural de la bocatoma. En los perfiles de aducción y conducción no se encuentra la información completa, se requiere identificar accesorios, tipo de tubería, material, incluir los accesorios, identificar los pasos elevados, y estructuras especiales. Se deberá incluir el detalle de los pasos que se proyecten. Sobre las plantas de tratamiento, se ha requiere presentar los niveles de agua esperados en cada componente, verificar el comportamiento hidráulico entre procesos.
6. Del sistema de alcantarillado se solicita ampliar la información de la PTAR, ya que en el informe no se indica si su dimensionamiento fue realizado bajo los parámetros de la resolución 0799 de 201, ya que el informe no relaciona la normativa, ni indica de manera detallada los caudales proyectados para cada proceso.
7. El Ingeniero Jorge Cabrales indica que trabajará con el equipo para adelantar estos requerimientos, mientras se obtienen los requerimientos de las demás especialidades.
8. El Ingeniero Alvaro Corcho finaliza haciendo especial énfasis en el trabajo de campo pendiente, para que no se haga reiteración en estas actividades, y que se adelanten de manera óptima para que, y de acuerdo con la información que indica el asesor del municipio, se pueda obtener la viabilidad en el menor tiempo posible.
9. La mesa de trabajo finaliza a las 10:44 a.m.

FIRMAS:

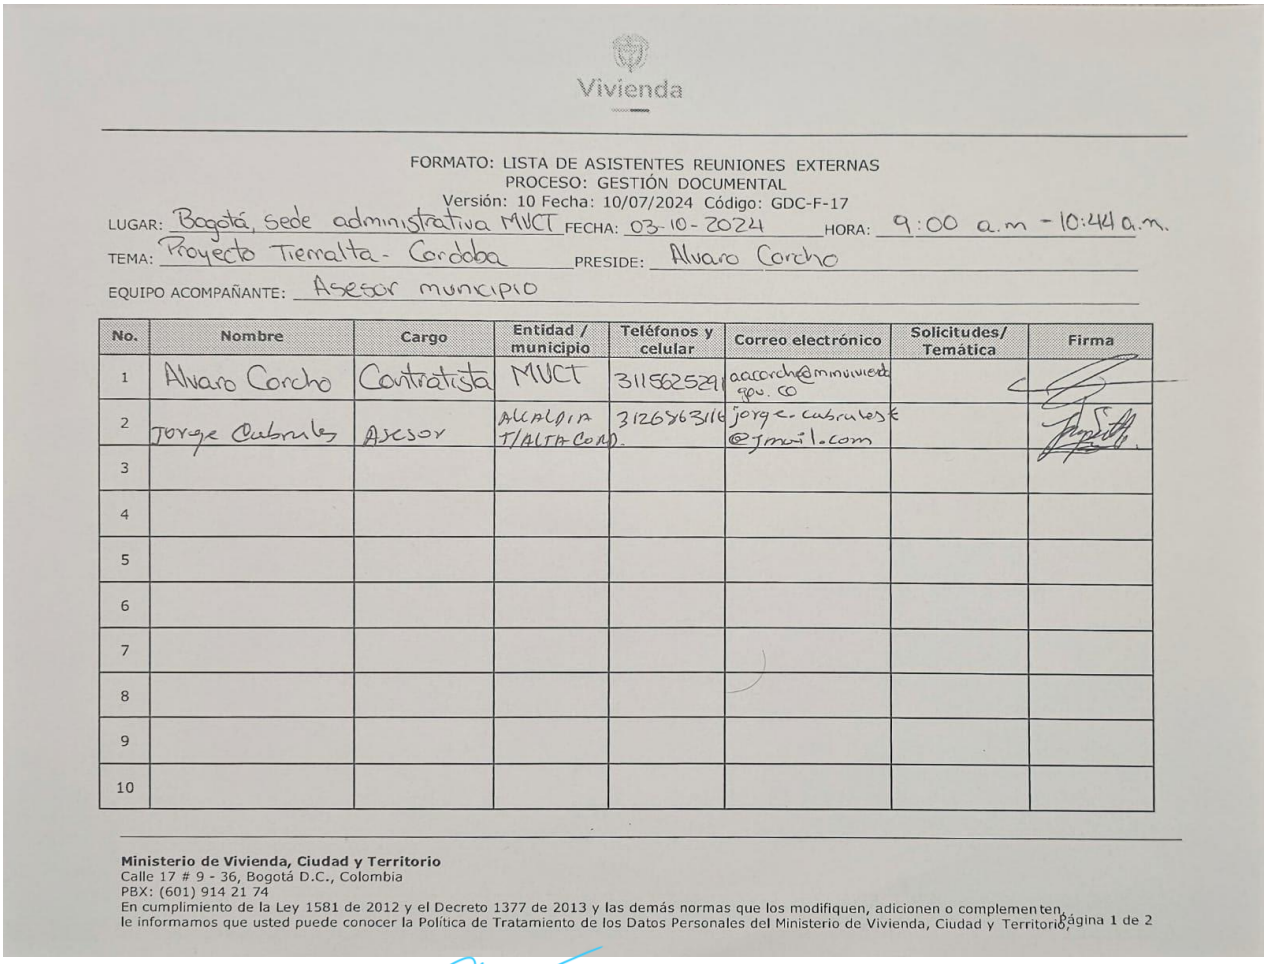

Vivienda

FORMATO: LISTA DE ASISTENTES REUNIONES EXTERNAS
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 10 Fecha: 10/07/2024 Código: GDC-F-17

LUGAR: Bogotá, sede administrativa MVCT FECHA: 03-10-2024 HORA: 9:00 a.m - 10:44 a.m.
TEMA: Proyecto Tierralta - Cordoba PRESIDE: Alvaro Corcho
EQUIPO ACOMPAÑANTE: Asesor municipio

No.	Nombre	Cargo	Entidad / municipio	Teléfonos y celular	Correo electrónico	Solicitudes/ Temática	Firma
1	Alvaro Corcho	Contratista	MVCT	3115625291	aacorcho@minvivienda.gov.co		
2	Jorge Cabrales	Asesor	ALCALDIA T/ALTA CORD.	3126863116	jorge.cabrales@jmail.com		
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Calle 17 # 9 - 36, Bogotá D.C., Colombia
PBX: (601) 914 21 74
En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Página 1 de 2

Elaboró: Alvaro Andrés Corcho Ramírez
Fecha: 04/10/2024.
