ACTA No. 9 - ABRIL 2025

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, Colombia, 24 de Abril 2025.
HORA:	11:30 a.m. a 12:00 p.m.
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Findeter, MVCT.
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

1.Reunion proyecto "OPTIMIZACIÓN DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE LEBRIJA SANTANDER, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE LA CONDUCCIÓN DESDE EL ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA (AMB)".

DESARROLLO:

El MVCT envio correo a Findeter solicitando concepto jurídico con respecto a cambio de impacto del proyecto planteado por el Municipio de Lebrija y municipio de Girón.

El abogado Jickson Rodríguez de Findeter se encuentra en trámite de revisión del concepto jurídico con fecha de entrega del 9 al 15 de mayo de 2025.

AMB envio comunicación el 7 de abril de 2025 a Findeter con observaciones técnicas con mayores cantidades, ajuste en análisis de precios unitarios suministro de equipos y materiales por aparte con respecto al presupuesto, el contratista envía a interventoría respuesta el 25 de abril de 2025, la interventoría revisa y envía informe a Findeter el 2 de mayo de 2025 y Findeter responde a AMB el 9 de mayo de 2025.

Frente a propuesta del consultor, Findeter reviso con contratista e interventoría y recomienda que se mantenga el trazado de la tubería para mantener la servidumbre correspondiente, desde el punto de derivación al nuevo sitio de la estación de bombeo y se devuelve a conectar con trazado existente y continua la conexión al tanque de almacenamiento.

Con respecto al contrato de venta de agua en bloque Findeter se comunicó con el Municipio de Lebrija ing. Nelson Pérez el cual informo que se encuentran en reuniones con AMB para definir las condiciones.

Findeter informa que el martes 22 de abril la Secretaria de planeación de Bucaramanga con contratista de obra suscribieron acta de inicio por un año de intervención el casco urbano de Bucaramanga.

La Contraloría realiza auditoria al plan departamental de agua e incluyo el proyecto de Lebrija programando visita al proyecto el 7 mayo de 2025.

Al alcalde de Girón, Findeter solicito revisar estado y compra del nuevo predio por el Municipio del predio de la estación de Bombeo.

Con respecto al aporte de recursos AMB sigue evaluando la posibilidad de aportar el recurso requerido.

Se programa reunión de seguimiento el 9 de mayo de 2025 a las 10 a.m.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Entrega de concepto jurídico cambio de impacto del proyecto	Findeter	15-4-2025
2	Respuesta a Interventoría observaciones presupuesto solicitadas por AMB.	Contratista	25-4-2025
3.	Respuesta a Findeter observaciones solicitadas por AMB	Interventoría	2-05-2025

4.	Respuesta a observaciones a AMB	Findeter	9-05-2025
5.	Visita programada al proyecto Findeter -Esant	Contraloría	7-05-2025
6.	reunión de seguimiento n	MVCT-Findeter	9-05-2025

FIRMAS

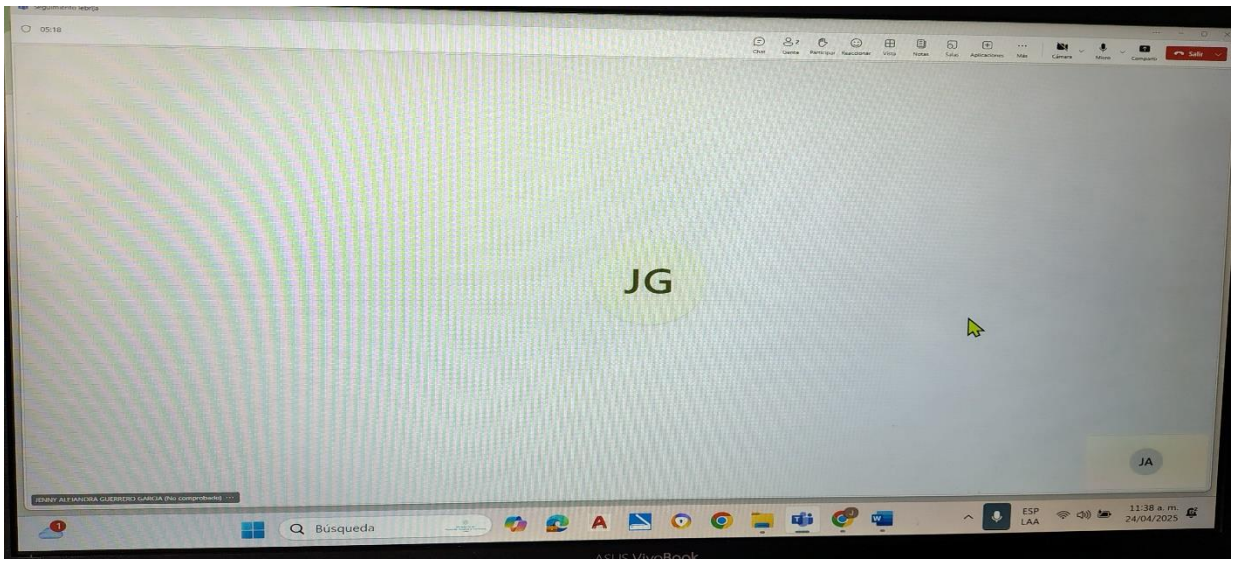

Elaboró: Jorge rojas
Fecha: 24-04-25
