ACTA No. 4

Ariguaní, Magdalena

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá 22 de abril de 2025
HORA:	10: am
LUGAR:	Virtual
ASISTENTES:	Juan Samper - Asesor de Gerencia EDUBAR Andrea Santos – Apoyo a la supervisión MVCT.
INVITADOS:	

ORDEN DEL DIA:

1. Mesa técnica de seguimiento. Reformulación No.1 Convenio Interadministrativo de Cooperación 1142 de 2021 Proyecto ***"CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO (FASE II) DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARIGUANÍ - DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA"***

DESARROLLO:

Se cuenta con la participación de EDUBAR y MVCT en la presente mesa técnica de seguimiento.

EL MVCT manifestó que a la fecha no cuenta con la solicitud de suspensión radicada y que está adelantando el memorando para contratos, pero se requiere contar con todos los documentos radicados.

EDUBAR informa que ya cuenta con los oficios firmados por parte del municipio y del ejecutor que está pendiente por parte del municipio el envío de los parafiscales. EDUBAR manifiesta que el día de hoy queda radicada la solicitud de suspensión en el MVCT.

Con relación a la Reformulación No. 1 el MVCT tiene una inquietud, dado que de acuerdo a la presentación realizada por el consultor el 8 de abril de 2025 se eliminan todas la EBARES que se tenían planteadas, y profesionales que han realizado visita al lugar indican que es imposible dado las condiciones del terreno.

EDUBAR explica que el proyecto si requiere la construcción de EBARES, pero con los recursos que se tienen actualmente destinados no es posible construirlas, se

pretende ejecutar en esta fase la mayor parte del proyecto que sea funcional por gravedad y que posteriormente en otra fase se ejecute el resto del proyecto. Se deja la claridad que el alcance y el impacto del proyecto que se tiene actualmente según ficha de viabilización disminuyen.

De acuerdo a lo indicado se tienen planteadas la construcción de 2 EBARES que están ubicadas en los extremos del municipio de Ariguaní y que posiblemente estas queden incluidas en el diseño general sin un gran nivel de detalle.

El MVCT manifiesta que el proyecto debe ser presentado en su totalidad, pero dejando la claridad de la parte que se ejecutará en esta fase la cual debe ser funcional.

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Radicar a EDUBAR la nueva propuesta	Consultor	29 de abril de 2025
2	Radicar solicitud de suspensión	EDUBAR	22 de abril de 2025

FIRMAS:

Elaboró: Andrea Santos Cubillos
Fecha: 22/04/2025

Link de la reunión

Mesa técnica de seguimiento - Convenio Ariguaní-20250422_095532-Grabación de la reunión.mp4

Asistencia

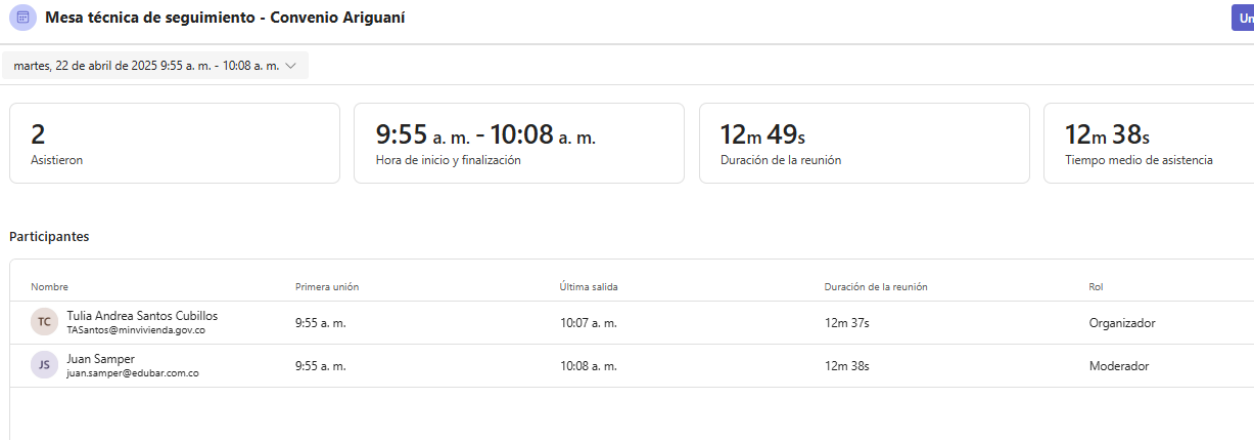

Mesa técnica de seguimiento - Convenio Ariguaní

martes, 22 de abril de 2025 9:55 a. m. - 10:08 a. m.

2	9:55 a. m. - 10:08 a. m.	12m 49s	12m 38s
Asistieron	Hora de inicio y finalización	Duración de la reunión	Tiempo medio de asistencia

Participantes

Nombre	Primera unión	Última salida	Duración de la reunión	Rol
TC Tulia Andrea Santos Cubillos TASantos@minvivienda.gov.co	9:55 a. m.	10:07 a. m.	12m 37s	Organizador
JS Juan Samper juan.samper@edubar.com.co	9:55 a. m.	10:08 a. m.	12m 38s	Moderador
