

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 4

FECHA: 12 de agosto de 2020.

HORA: De 9:30 a 10:00 pm.

LUGAR: Virtual – Plataforma TEAMS

ASISTENTES: John Wilson Carvajal Ruiz – Asesor Municipio de Venecia
Milena Canchano A. – Profesional Especializado MVCT

INVITADOS: Se anexa lista de asistencia

ORDEN DEL DIA: Seguimiento Proyecto PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VENECIA

DESARROLLO:

Se inició la reunión virtual con la presentación de los asistentes en la plataforma digital, seguidamente se indicó que la reunión se realizaba con el fin de hacerle seguimiento a los compromisos adquiridos en la pasada mesa de trabajo realizada en el mes de julio con el Municipio y los Consultores del proyecto.

Como segundo punto el Municipio realizó una presentación de los avances en la consecución de los ajustes concluyendo lo siguiente:


- La actualización de las Certificaciones presentadas, se encuentran en curso, estiman tenerlas el próximo 14 de agosto del 2020.
- El formato Resumen del Proyecto, se ajustará una vez cuenten con el presupuesto aprobado.
- El PSMV fue solicitado ante CORANTIOQUIA el 6 de agosto del 2020. Actualmente se encuentran a la espera del pronunciamiento de la CRA.
- Los predios y Servidumbres necesarios para el proyecto estiman enviarlos a finales de la próxima semana (14 de agosto).
- El diseño, memorias y presupuesto del componente eléctrico, se encuentra en ejecución. Se estima entregarlo el 14 de agosto del año en curso.
- Las cotizaciones solicitadas y los ajustes presupuestales requeridos se presentaran al MVCT el 14 de agosto de 2020.
- La actualización de la concesión de aguas ya la tienen y fue enviada en la misma reunión.

El Municipio reitero su interés por la ejecución de este proyecto y el compromiso que tienen para sacarlo a feliz término.

- Compromisos (Si aplica)

Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento
Enviar la información requerida en la reunión	Municipio de Venecia	14-08-2020

FIRMAS: Se adjunta lista de asistencia.

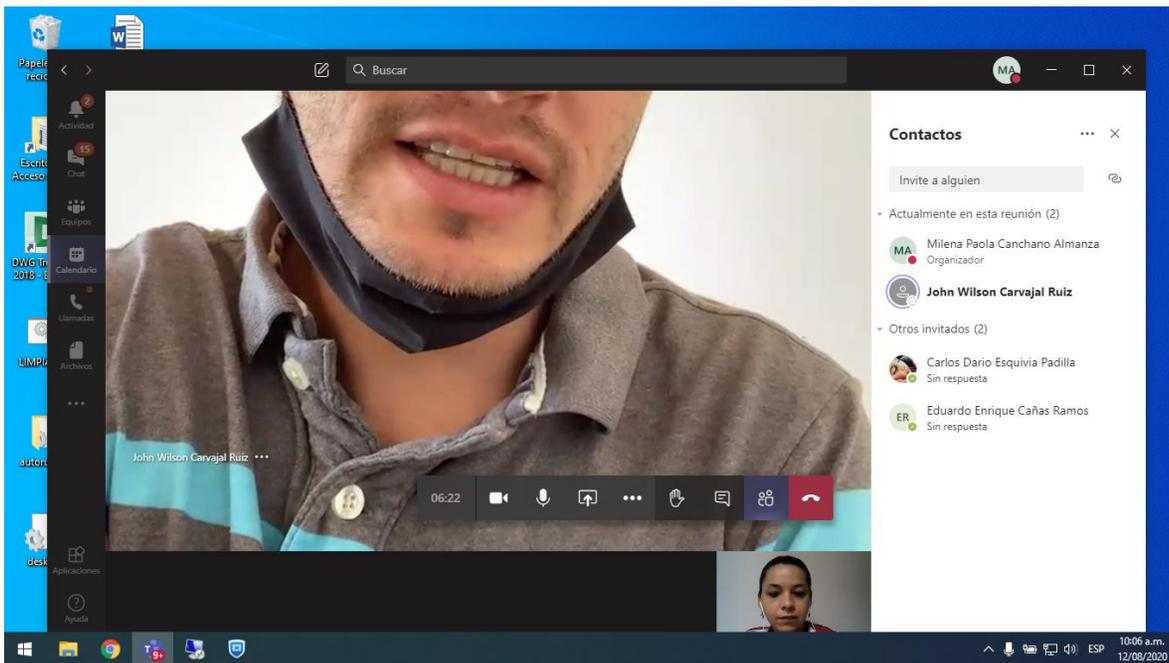

Elaboró: Milena Canchano A.

Fecha: 23/05/2020
