

	FORMATO: ACTA	Versión: 4.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 10/09/2019
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 01 – 14/10/2020

FECHA: Bogotá D.C., 14 octubre de 2020
HORA: De 2:00 pm - 3:00 pm
LUGAR: Reunión Virtual Teams: PDA TOLIMA y MVCT

ASISTENTES:

LIDA ESPERANZA AGUILAR PULIDO / MVCT - GPS
DIANA ALEXANDRA VEGA PARRA / MVCT - GPS
CLAUDIA PATRICIA ARREDONDO GIRALDO - SGE
DIEGO DURAN – PDA TOLIMA

ORDEN DEL DIA:

- Revisar los ajustes realizados por el PDA Tolima en la ficha técnica estructuración proyecto SIASAR.

DESARROLLO:

La reunión empieza con la revisión de los ajustes solicitados a la ficha técnica del proyecto – SIASAR; en especial para los temas de presupuesto y cronograma; teniendo en cuenta que se van a levantar 72 comunidades, 72 perfiles de proyecto y 18 planes de gestión.

Se le plantea al PDA Tolima la posibilidad de contratar al equipo por parte del departamento y no hacer una consultoría, esto con el fin de que el departamento que de con la capacidad instalada y el costo para el desarrollo de los programas rurales salgan a un costo bajo, más, sin embargo, el PDA responde que en años anteriores habían optado por esa opción pero que no les dio buenos resultados, por eso todo lo hacen a través de las consultorías.

Dejando en claro el tema se pasa a la revisión del presupuesto:

2	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL - NIVEL DEPARTAMENTAL	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor mes	Valor Total
2.1	Administración			1 equipo 3-50 viviendas 1 comunidad	1 equipo 56-1000 viviendas 28 comunidades	
2.1.1	Profesional sectorial (Responsable General - Validador) - Del PDA	Personas	1			
2.1.2	Profesional IT (Soporte Informático)- Del PDA	Personas	1			
2.1.3	Equipos de cómputo-Del PDA	Equipos/ Eventual	-			
2.1.4	Gastos de viaje profesional sectorial	Viaje / Eventual	2			
	Subtotal			\$ -	\$ -	\$ -
2.2	Trabajo de Campo	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor mes	Valor Total
2.2.1	Profesional Sectorial (Coordinador trabajo Campo)	Personas	3	\$245.000	\$ 4.900.000	\$ 132.300.000
2.2.2	Técnico Ambiental	Personas	3	\$150.000	\$ 3.000.000	\$ 81.000.000
2.2.3	Técnico Comunidades	Personas	3	\$150.000	\$ 3.000.000	\$ 81.000.000
2.2.4	Gastos de viaje técnico	viajes / día / persona	3	\$97.152	\$ 1.943.030	\$ 29.145.450
2.2.5	Gastos de viaje coordinador trabajo campo	Viaje / día	6	\$109.000	\$ 2.180.000	\$ 65.400.000
2.2.6	Transporte (público/privado) (terrestre, marítimo, fluvial, aéreo)	día / persona	9	\$175.000	\$ 3.500.000	\$ 157.500.000
2.2.7	Papelería (cuestionarios)	Juego Cuestionarios / persona	72	\$10.000		\$ 720.000
2.2.8	Equipos móviles (Tableta/ GPS)	Unidad/ Por equipo	6	\$259.050	\$ 1.554.300	\$ 7.771.500
2.2.9	Plan Internet	Unidad / Eventual	9	\$90.000	\$ 810.000	\$ 4.050.000
2.2.10	Seguridad y salud en el trabajo	Dotación, EPP- y Bioseguridad	9	\$310.200	\$ 2.791.800	\$ 13.959.000
2.2.11	Pruebas para COVID	Pruebas	9	\$230.000	\$ 6.210.000	\$ 31.050.000
2.2.12	Talleres capacitación y socialización	evento	1	\$ 4.500.000	\$ 4.500.000	\$ 4.500.000
2.2.13	Muestra de agua y análisis de laboratorio. (KIT/Laboratorio Móvil/Cadena de custodia)	Muestra y análisis laboratorio	72	\$ 2.000.000		\$ 144.000.000
	Subtotal			\$ 8.325.402	\$ 34.389.130	\$ 752.395.950
	Total sin IVA			\$ 8.325.402	\$ 34.389.130	\$ 752.395.950
	Valor por comunidad	Número de Comunidades 72		\$115.631	\$477.627	\$10.449.944

Es necesario que estos costos sean ajustados ya el presupuesto referente por SIASAR una comunidad, es de 1.500.000 a 2.000.000 de pesos. Así mismo, se debe de contemplar los costos de bioseguridad dada la situación actual del país, así mismo se le menciona los costos por equipos móviles (tabletas/GPS) y plan de internet debería de darlos la consultoría ya que es el segundo piloto que se realizaría con ellos.

Se les vuelve hacer la precisión que para las muestras de calidad de agua se sugiere la adquisición de un kit multiparámetro. El PDA Tolima, menciona que estas muestras las va a realizar con la secretaria de salud departamental del Tolima, el MVCT / VASB menciona que no hay problema pero que se requieren las dos constancias: la primera es del trabajo la constancia del trabajo realizado en el 2019 y la segunda es la constancia del trabajo que se realizará este año con ellos.

Se les recomienda hacer más de 1 taller de capacitación y socialización para que la comunidad pueda comprender mejor los temas y el ejercicio a realizar. Además, debe de ajustarse el costo.

Explica el PDA que los costos se incrementan por que van a tener 3 equipos en campo y por las pruebas Covid – 19; así mismo necesitan todo ese tiempo para no tener inconvenientes con los instrumentos de perfil de proyecto y plan de gestión.

Pasando al tema de cronograma se le hace al PDA las siguientes apreciaciones:

No	ACTIVIDADES	TIEMPO/ MESES									
		MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	
1	Preparación información (Alistamiento comunidades, muestra y logística territorio)										
2	Taller Transferencia Conocimiento										
3	Taller Transferencia Conocimiento perfiles de proyecto										
4	Trabajo de Campo (Levantamiento información) SIASAR										
5	Trabajo de Campo (Levantamiento información) perfiles de proyecto										
6	Trabajo de Campo (Levantamiento información) planes de gestión										
7	Cargue de la información en plataforma										
8	Validación										
9	Informe SIASAR										
10	Elaboración de perfiles de proyecto										
11	Elaboración planes de gestión										
12	Socialización de productos										

El tiempo debe de reducirse ya que teniendo en cuenta la relación de Tiempos y Rendimientos del Proyecto SIASAR ES (1 persona = 1 comunidad en 1 día = 20 comunidades en 1 mes). Con esta relación, el tiempo para realizar SIASAR es de un mes y medio ya que ustedes están contemplando 3 equipos en campo, recolectando así la información de los instrumentos de perfil de proyecto y planes de gestión.

Recomendaciones

Se recomienda ajustar la ficha técnica de estructuración SIASAR en lo referente al presupuesto y el cronograma de acuerdo con las recomendaciones dadas.

Se recomienda que, para los perfiles de proyecto y planes de gestión, se desglosen bien en el campo de observaciones en cuanto a tiempos y presupuestos.

Conclusiones


Se concluye que hasta cuando no sea ajusta el presupuesto y el tiempo en el cronograma, no se le puede dar aprobación de esta ficha. Ya que para SIASAR el precio de comunidad está entre 1.500.000 y 2.000.000 y la recolección de la información de los tres instrumentos SIASAR, perfil de proyecto y plan de gestión se hacen en un tiempo no mayor a 4 meses o menos.

- Compromisos (*Si aplica*)

Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
Ajustar la ficha de técnica estructuración proyecto SIASAR	PDA TOLIMA	Mes de octubre del 2020
Analizar la ficha con los tres instrumentos (SIASAR, perfil de proyecto y plan de gestión), con el fin de poder dar salida y visto bueno a la ficha	MVCT	Mes de octubre

FIRMAS:

Elaboró: Lida E. Aguilar – Diana vega / Contratistas Grupo Política Sectorial
Fecha: 14 octubre de 2020

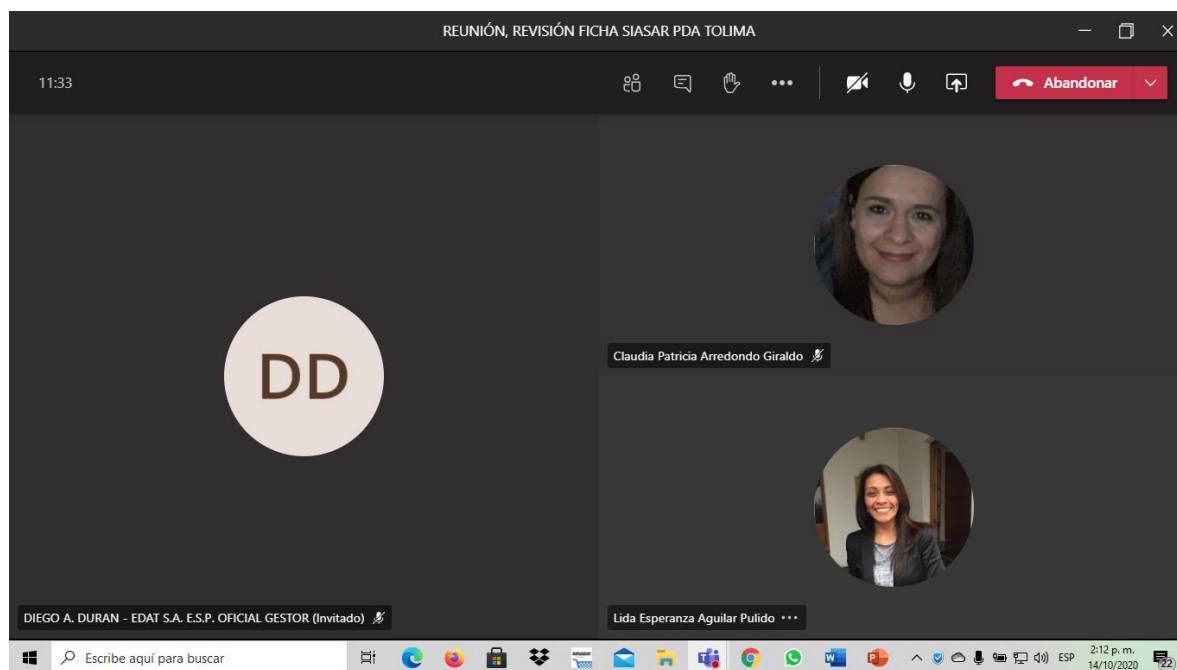

REUNIÓN, REVISIÓN FICHA SIASAR PDA TOLIMA

11:49

Abandonar

Participantes

Escribe un nombre

En esta reunión (4)

Silenciar a todos

Diana Alexandra Vega Parra
Organizador

Claudia Patricia Arredondo Giraldo

DIEGO A. DURAN - EDAT S.A. E....
Invitado

Lida Esperanza Aguilar Pulido

DD

Claudia Patricia Arredondo Giraldo

Lida Esperanza Aguilar Pulido

DIEGO A. DURAN - EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL GESTOR (Invitado)

Escribe aquí para buscar

2:12 p. m.
14/10/2020
