

	FORMATO: ACTA	Versión: 5.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 15/02/2021
		Código: GDC-F-01

ACTA No. 06

DATOS GENERALES

FECHA:	7 de julio de 2021	
HORA:	De 10:00am a 11:00am	
LUGAR:	Virtual	
ASISTENTES:	Luis Hernán Torres Suarez	ltorres@minvivienda.gov.co
	Manuel Pérez	mperez@acuacar.com
	Maria Eugenia Dagobet N.	mdagobet@acuacar.com
	Caroline Avendaño	cavendano@acuacar.com
INVITADOS:	NA	

ORDEN DEL DIA:

Mesa de trabajo para establecer compromisos de entrega a los ajustes del proyecto CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO CORREGIMIENTOS DE BAYUNCA Y PONTEZUELA DEL DISTRITO DE CARTAGENA.

DESARROLLO:

Se da inicio a la mesa de trabajo por parte del ingeniero Luis Hernan Torres Suarez evaluador líder del MVCT del proyecto en referencia con el objetivo de hacer seguimiento a la ultima mesa de trabajo realizada el 6 de abril de 2021, donde se dejo como compromiso la radicación del todo el componente técnico el día 6 de mayo de 2021 lo cual no se ha dado cumplimiento.

La ingeniería maría Eugenia Dagobet quien hace un informe del estado del proyecto con el cual indica que actualmente los temas de los predios para las estaciones de bombeo no han sido resueltos con el distrito de la ebar pontezuela.

Adicional a lo anterior se componente al envió de la información de geotecnia y estructural del proyecto hoy mismo para su revisión y comentarios.

Con relación a la topografía, este ha sido un tema álgido que no se ha podido resolver pues no se tiene claridad con relación a los ajustes solicitados pues en el envió de información en el mes de mayo con relación al anterior siguen saliendo las mismas observaciones y se envió comunicación por parte de Acucar al ministerio con el fin de resolver el tema.

Con relación a este tema el ingeniero luis Hernan Torres Suarez, sugiere que para dar solución al tema de topografía se citara a mesa de trabajo con la participación del Juan Alejandro Garzón encargado de la evaluación de la Topografía del Ministerio y del topógrafo por parte del formulador Acucar.

Adicional a lo anterior se pregunta si para la ejecución del proyecto la empresa Acucar o el distrito cuenta con recursos económicos para cofinanciar el proyecto ya que este tiene un valor alto que necesita de diferentes fuentes para poder adelantar el cierre financiero y además de la intención por parte de Acucar en continuar y ajustar el proyecto a las observaciones que se han generado de la información del proyecto en el marco de la resolución 661 de 2019.

La ingeniera María Eugenia Dagobet informa que la empresa está comprometida en continuar con el proyecto, pero para el caso de recursos económicos para el cierre financiero no tiene en este momento disponibilidad de recursos y que desconoce si el distrito cuenta con algún recurso para su cofinanciación, la empresa Acucar puede apoyar con el personal de la empresa la intervenía si fuera el caso.


COMPROMISOS (Si aplica)

Envió el día 7 de julio de 2021, la información ajustada de los componentes de geotecnia y estructural del proyecto.

Citar a mesa de trabajo para el tema de topografía el día 19 de julio de 2021 a las 10:00 am.

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Envió de información técnica	acucar	07/07/2021
	Mesa de trabajo topografía	mvct	19/07/2021

FIRMAS:

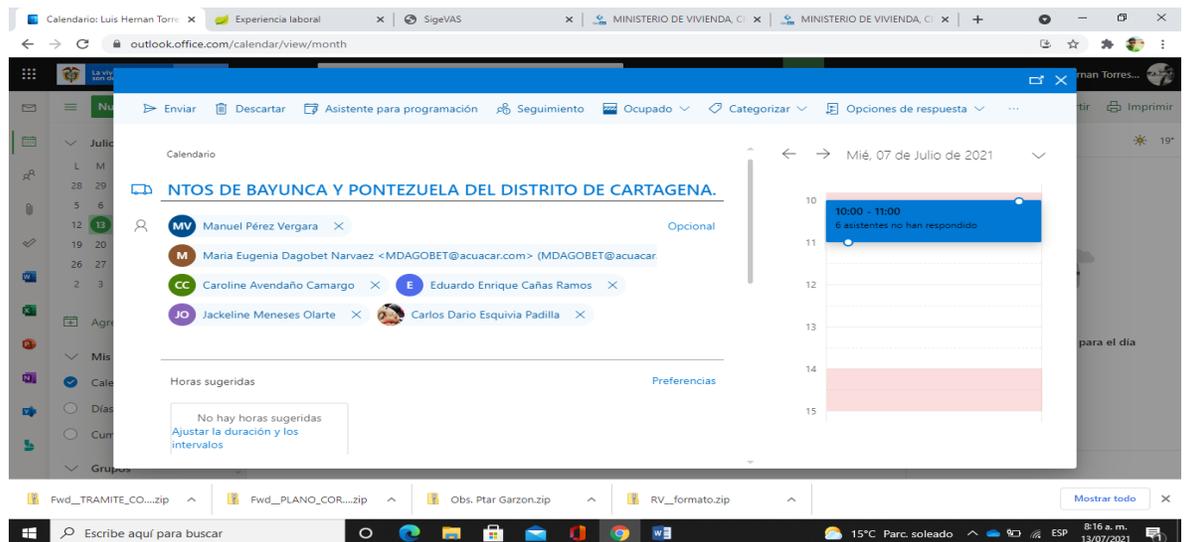

Elaboró: Luis Hernan Torres - profesional especializado
 Fecha: 7/07/21
