	FORMATO: ACTA	Versión: 6.0
	PROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Fecha: 11/02/2022
		Código: GDC-F-01

**ACTA MESA DE SOCIALIZACIÓN DE AVANCE EN OBSERVACIONES AL
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS
REDES DE ACUEDUCTO Y PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS DEL
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE**

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 21 de junio de 2022
HORA:	De 2:30 pm a 5:00 pm, 2.5 horas
LUGAR:	Reunión virtual.
ASISTENTES:	German A. Naranjo Faccini, Evaluador líder del proyecto, Grupo de Evaluación MVCT, gnaranjo@minvivienda.gov.co 3015296421 María Lucía Tarazona, Directora de proyectos institucionales, Findeter, mltarazona@findeter.gov.co 3057911895 Lilia Carolina Maldonado Santafé, Supervisora delegada, Gerencia de Banca de Inversión Findeter, lmaldonado@findeter.gov.co 3166953372 Jorge Alberto Diazgranados Amaris, Supervisor de Proyectos, FINDETER jadiazgranados@findeter.gov.co 3008096182 Francisco Burgos Lengua, Contratista, DNP – GNPT, fjburos@dnp.gov.co 1067859906 Yudith Andrea Díaz Hurtado, Asesor Gerencia de Pactos Territoriales, DNP, yudiaz@dnp.gov.co 3114918893 Israel Quintero Trejos, Contratista, DNP, iquintero@dnp.gov.co 3004605956 Johanna Lopez Quintero, Representante legal, Interventoria, Consorciointer2021@gmail.com 3217547940 Hanna Stephanie Robayo, Profesional de coordinación, Interventoria, Consorciointer2021@gmail.com 3041369681 Rigoberto López Pineda, Especialista Hidráulico, Interventoría, consorciointer2021@gmail.com 3105846496 Carol Hernández, Especialista ambiental de la interventoría, Interventoría, caritoyese@gmail.com 3142486192 Crysthian David Sánchez, Ingeniero topográfico, Interventoría, cdsanchezingeneria@gmail.com 3012735060

	Alberto Polo Cueto, Director De Proyecto, Estudios Técnicos Y Construcciones albertopolocueto@gmail.com 3158592666 Camilo Contreras, Especialista Estructural, ESTUDIOS TECNICOS, camiloacontreras@gmail.com 3204946208 Carol Yessenia Hernandez Delgado, Especialista Ambiental, Consultoría consorciointer2021@gmail.com 3142486192 Paola Andrea López Barragán, Auxiliar de Consultoría, Estudios técnicos y construcción, consulcovenas2021@gmail.com Yony Cifuentes Diaz, Especialista Predial, Estudios Técnicos Y Construcciones S.A.S. yocidi2004@gmail.com 3115132177 Juan Camilo Rodríguez Ayala, Topógrafo, CAR ingeniería y Topografía SAS, carsasingeneria@gmail.com 3208535622
INVITADOS:	planeacion@covenas-sucree.gov.co

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los avances en la evaluación por requerimientos al proyecto “CONSTRUCCIÓN DE LA OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE” socializando las observaciones en las especialidades Institucional, hidráulica y predial.

DESARROLLO:

Esta mesa de trabajo virtual se desarrolló el martes 21 de junio de 2022, iniciando a las 2:30 p.m., con la finalidad de presentar los avances en la evaluación por requerimientos al proyecto “CONSTRUCCIÓN DE LA OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE” socializando las observaciones en las especialidades institucional, hidráulica y predial, ante la entidad territorial encargada del proyecto, su equipo formulador, su consultoría, FINDETER y el DNP, así como aclarar cualquier inquietud que surja luego de presentar las mismas.

La reunión inicia con el saludo y agradecimiento a los asistentes, luego de lo cual, el Ingeniero Naranjo como Evaluador Líder por parte del MVCT realiza una introducción a la reunión proponiendo como metodología de presentación exponer una a una el listado de requerimientos y recomendaciones halladas al momento por parte del equipo evaluador del MVCT, a medida que se presenta se espera a que los asistentes indaguen buscando dar la claridad sobre las mismas; indicando que luego de la reunión se entregará un acta de la reunión en que se adjuntara el documento con el avance en los requerimientos presentado en la mesa de trabajo, así como dejar en claro que este se trata de un avance

sobre la lista de chequeo mientras el equipo de evaluación termina de realizar el proceso y se presenta la primer lista de chequeo sobre el proyecto, informa que una vez se presente la lista de chequeo se empezaran a contar un periodo de 6 meses para la complementación del proyecto, luego del cual si no se logra la complementación el MVCT por normatividad debe proceder a su devolución. Al momento se ha desarrollado la evaluación sobre la parte documental, hidráulica, institucional y predial; estando pendientes las demás especialidades.

Se inicia con las observaciones documentales del proceso de evaluación, indicando que se presentan observaciones en este sentido (ver documento adjunto de avance evaluación por requerimientos).

Sigue la evaluación de los elementos institucionales, indicando que se presentan observaciones en este sentido (ver documento adjunto de avance evaluación por requerimientos) y proponiendo que luego del análisis se proceda con la coordinación de una mesa especializada en este componente.

Se continua con las observaciones técnicas donde se presentan varias observaciones (ver documento adjunto de avance evaluación por requerimientos). Luego se indica que están pendientes las observaciones de la parte financiera y presupuesto.

Se termina con las observaciones prediales (ver documento adjunto de avance evaluación por requerimientos).

Se procede a indicar que cualquier información de ajuste debe ser remitida al MVCT por parte de la Entidad responsable del proyecto una vez cuente con la aprobación de la interventoría, por solicitud se mantendrá informado como copia al DNP y a FINDETER. Adicionalmente se indica que cualquier solicitud de mesas de trabajo se deberá solicitar por correo una vez se realice el análisis del documento de avance de observaciones presentado.


Se deja la indicación de si existe algún comentario o duda posterior se comunique al Ingeniero Naranjo a su correo gnaranjo@minvivienda.gov.co o a su celular con el número 3015296421, para dar la atención del caso.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
N/A			

FIRMAS:

Se presentan las firmas la imagen de pantalla con los asistentes.

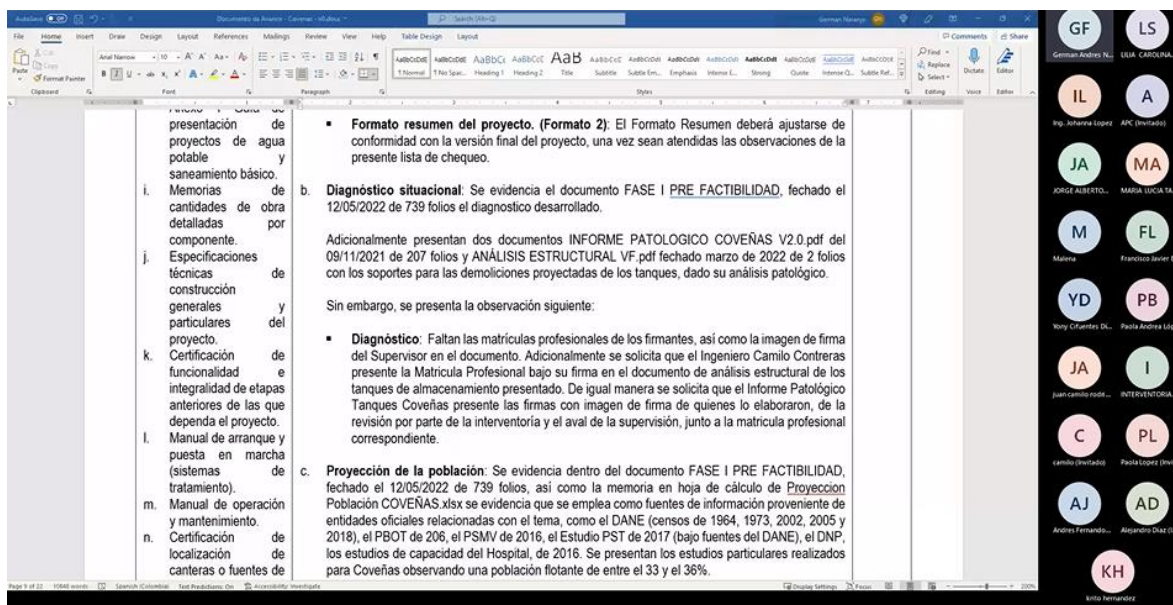

Elaboró: German A. Naranjo F. – Grupo de Evaluación VASB-MVCT.

Fecha: 21-06-2022

Anexos: Grabación de la reunión en MP4

Documento de Avance en las Observaciones al Proyecto, en PDF (22 folios)
