

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 2

DATOS GENERALES

FECHA:	23 de noviembre de 2023
HORA:	De 03:00 pm a 04:00 pm
LUGAR:	Aplicativo Teams
ASISTENTES:	<ul style="list-style-type: none">• Diego Jaimes Pacheco – director Unidad de Servicios Públicos de Bochalema, unisepublicos@bochalema-nortedesantander.gov.co• Arturo Leonel Cortes – secretario de Planeación del municipio de Bochalema, planeacion@bochalema-nortedesantander.gov.co• Mayra Delgado – Asesora técnica de la Secretaría de Agua potable y Saneamiento Básico, mayradelgado77@gmail.com• Adriana Rocío Gomez – Profesional Especializado de la subdirección de programas, líder de PDA para el departamento Norte de Santander, argomez@minvivienda.gov.co• Luis Carlos Garcés Fernández – Profesional Especializado, Evaluador líder, Grupo de Evaluación de Proyectos MVCT, lgarcés@minvivienda.gov.co
INVITADOS:	Alcaldía municipal de Bochalema y Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico del departamento de Norte de Santander

ORDEN DEL DIA:

1. Presentación de los asistentes.
2. Seguimiento a la complementación del proyecto “Consultoría para los estudios y diseños del sistema de acueducto del corregimiento la Don Juana municipio de Bochalema”.
3. Compromisos.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

DESARROLLO:

El ingeniero Luis Carlos contextualiza la reunión, explicando que el proyecto ingreso en el año 2018, llevando bastante tiempo en el mecanismo de viabilización del MVCT. El ingeniero asumió la evaluación a finales del año 2022, por lo cual se procedió a validar toda la trazabilidad del proyecto. En el mes de abril de 2023, se realizó mesa de trabajo, presentando la documentación actualizada del proyecto, teniendo presente que se encuentra en ejecución de obra física de la primera etapa del proyecto.

La Ing. Mayra explica que el departamento a través del PDA se encuentra ejecutando la fase 1, teniendo opciones de una adición presupuestal. Se tuvo reunión informal con el alcalde del municipio de Bochalema, explicando que la fase 2 se encuentra sujeto a la gestión predial que realice el municipio, con relación a la consecución de las servidumbres. Por lo anterior, se solicita a los funcionarios del municipio presentar un informe de la gestión predial realizada, para tener claro por donde se debe retomar las labores. Para la fase 2 se propone incluir la aducción de 7 kilómetros, tanque de almacenamiento y redes de distribución, lo cual se integrará con la fase 1 que se encuentra en construcción.

El Arq. Arturo manifiesta que se deben retomar las gestiones, toda vez que algunos propietarios aun no han dado la autorización de paso (servidumbres), requeridos para la ejecución del proyecto. Propone esperar el ingreso de la nueva administración, para tener claridad si el proyecto se encuentra entre las prioridades. Además, explica que por la construcción de la doble calzada se optó por anular la declaratoria de utilidad publica sobre las servidumbres requeridas en el proyecto.

El Ing. Luis Carlos esta de acuerdo con la propuesta realizada por el Arq. Arturo, en aras de conocer las prioridades de la nueva administración.

La Ing. Mayra reitera que se debe presentar la información de la gestión predial realizada por parte del municipio, para tener certeza sobre el estado de las servidumbres requeridas. Solicita establecer este punto como primer compromiso.

El Arq. Arturo expresa que validarán con el señor alcalde, si da la autorización, se remitirá la próxima semana al PDA, para los fines pertinentes. Consultarán si la nueva administración tiene contemplado continuar con el proyecto o por el

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

contrario tienen otra iniciativa. Además, explica que ya se tiene el permiso de concesión de aguas para el proyecto.

El Ing. Luis Carlos agradece la participación de todos los asistentes en la mesa de trabajo.

El Ing. Luis Carlos ratifica la total disposición para atender las inquietudes del municipio de Bochalema y el departamento de Norte de Santander. Además, explica que, durante el proceso de evaluación, se pueden realizar las mesas de trabajo que se ameriten o requieran por el municipio, en aras de resolver las inquietudes que existan y poder seguir adelante con el proyecto.

No siendo otro el particular, se procede con el cierre de la reunión.

COMPROMISOS (Si aplica)

#	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Presentar la documentación de la gestión predial al PDA de Norte de Santander	Municipio de Bochalema	Próxima semana
2	Dar plazo a que la nueva administración se posesione, para conocer si el proyecto se va a priorizar o no	MVCT	Primeros meses de 2024
3	Atender inquietudes durante la formulación, a través de mesas de trabajo de Asistencia Técnica.	MVCT	Permanente


FIRMAS:

Ver imagen de la asistencia virtual.

Elaboró: Luis Carlos Garcés Fernández
Fecha: 23-11-2023


FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Registro de asistencia

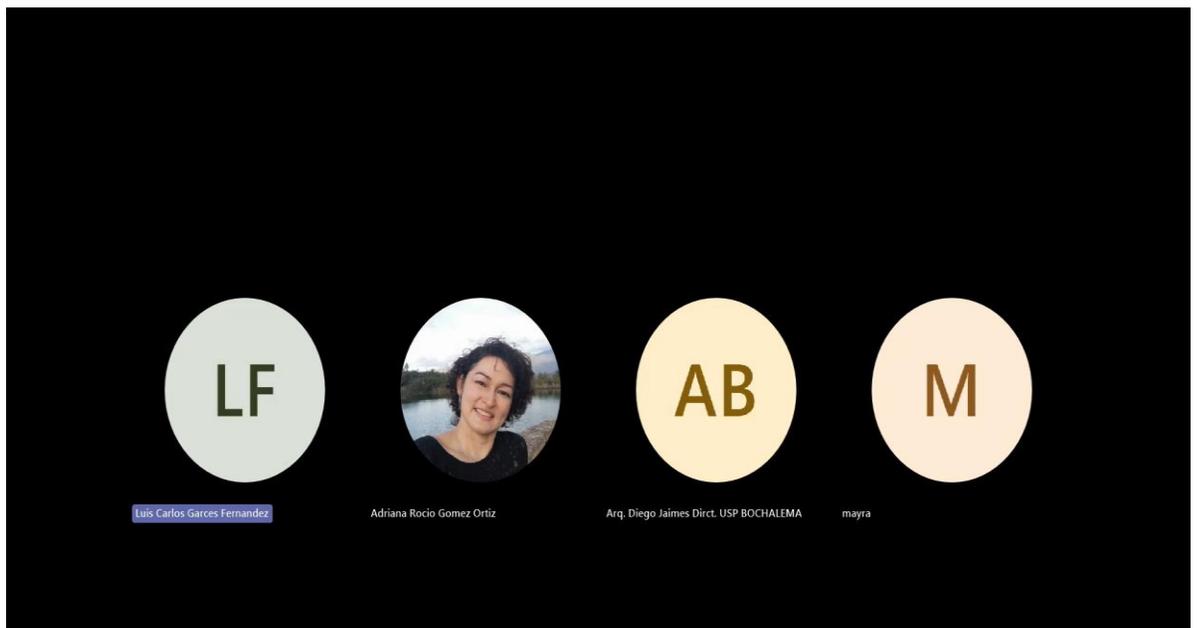

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

Convocatoria

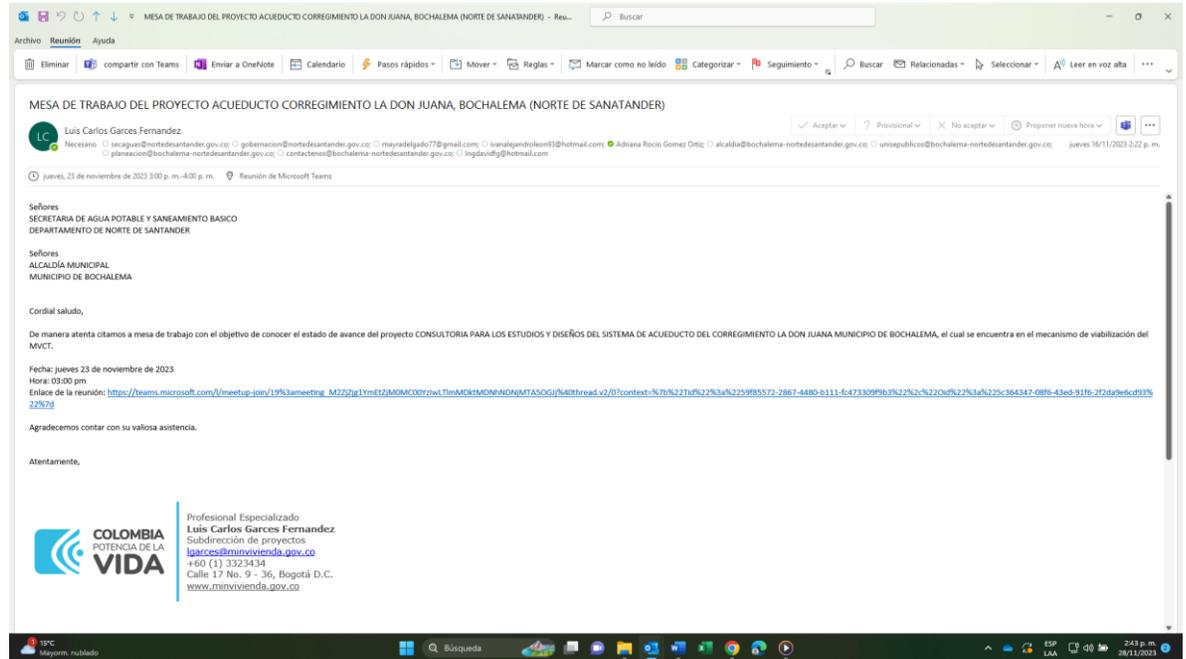

MESA DE TRABAJO DEL PROYECTO ACUEDUCTO CORREGIMIENTO LA DON JUANA, BOCHALEMA (NORTE DE SANTANDER)

Luis Carlos Garces Fernandez
Necesario
gobernacion@nortedesantander.gov.co | mayradelgado77@gmail.com | isanabandoleon91@hotmail.com | Adriana Rocío Gomez Ortiz | alcaldia@bochaleta-nortedesantander.gov.co | unirepublicos@bochaleta-nortedesantander.gov.co | planacion@bochaleta-nortedesantander.gov.co | contactenos@bochaleta-nortedesantander.gov.co | lngdavidg@hotmail.com

jueves 16/11/2023 2:22 p. m.

Jueves, 23 de noviembre de 2023 3:00 p. m. - 4:00 p. m. Reunión de Microsoft Teams

Señores
SECRETARIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

Señores
ALCALDÍA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE BOCHALEMA

Cordial saludo,

De manera atenta citamos a mesa de trabajo con el objetivo de conocer el estado de avance del proyecto CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO LA DON JUANA MUNICIPIO DE BOCHALEMA, el cual se encuentra en el mecanismo de viabilización del MVCT.

Fecha: jueves 23 de noviembre de 2023
Hora: 03:00 pm
Enlace de la reunión: https://teams.microsoft.com/j/19%3ameeting_M22f2411Vne4723M0MCO0vzwlTmMD41MDNNDNMJMTASOGIj540hthread_v2/0?content=5076%221df%22%3a%2259f85572-2867-4480-b111-6473309f9b3f%22%2a%220d%22%3a%225c364347-08f6-43ed-91f5-2f2da9e6cd93f%22%7d

Agradecemos contar con su valiosa asistencia.

Atentamente,

 **COLOMBIA**
POTENCIA DE LA
VIDA

Profesional Especializado
Luis Carlos Garces Fernandez
Subdirección de proyectos
lgarces@minvivienda.gov.co
+60 (1) 3323434
Calle 17 No. 9 - 36, Bogotá D.C.
www.minvivienda.gov.co
