

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 04

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 09 de noviembre de 2023.
HORA:	De las 15:00 a las 16:00 horas.
LUGAR:	Vía Teams.
ASISTENTES:	Luis Carlos Garces Fernández - Evaluador Líder - MVCT. Juan Pablo Mejía Galvis - Evaluador Líder - MVCT.
INVITADOS:	<u>Equipo Formulator:</u> Ing. Jorge Elvecio Baquero Diaz. – Interventoría. Ing. Andrés Muñoz. – Interventoría. Ing. Jaime A. Muñoz. Ing. Esperanza Ortiz. – Aguas del Huila. Ing. Eddy Bernal Collazos. Dr. Gentil Tapiero Buitrago. – Alcalde Acevedo Huila. EMPACEVEDO E.S.P. S.A.S. – Prestador de Servicio. Ing. German Arias.

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación y presentación de Participantes.
2. Exposición Observaciones.
3. Preguntas e inquietudes.
4. Conclusiones.
5. Cierre de la reunión.

DESARROLLO:

1. Verificación y presentación de Participantes.

Se inicia con la verificación de los participantes, dejando constancia de la asistencia con el registro de Audio y Video de esta reunión, previamente

FORMATO: ACTA**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL****Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01**

Además, aun no se cuenta con componente ambiental completo, modelaciones hidráulicas, proyecciones de población, tema técnico y aval de la interventoría; así como el componente predial, específicamente el aspecto de servidumbres.

Con este comentario, se da paso a que la Alcaldía de Acevedo, resalte los avances que a ese respecto indica el Ing. Garces.

Toma la Vocería el Ingeniero German Arias, el cual especifica que en conjunto con la interventoría se levantó el plano predial, resaltando que el IGAC no cuenta con catastro urbano y rural del municipio. La documentación fue ajustada por recomendación de las partes, y atendiendo a solicitud del municipio que se dieran las actualizaciones de firmas respectivas con el señor Alcalde.

El ingeniero German pregunta a la ingeniera Milce sobre las servidumbres levantadas, a lo que ella indica que, a la fecha no se cuenta con la base de datos exacta de las cantidades de servidumbres requeridas ni firmadas debido a diferentes problemáticas sociales y logísticas del territorio.

El ingeniero Garces se permite proyectar el oficio remitido por la administración de Acevedo, aclarando punto a punto, así:

Y es que en la comunicación que se allegó, pues se menciona que el proyecto se va a marcar en la normativa 0844. Eso el ingeniero Mario, el ingeniero Germán, lo explicaron claramente en las en las mesas de trabajo anteriores, pues se yo presumí que se iban AA corregir los documentos a actualizar los documentos enmarcando el proyecto en esa Resolución 0844, pero la documentación que se ha llegó no nos complementó nada al respecto. Y son temas que quedaron pendientes y pues que aún tenemos pendientes por subsanar.

Con relación al tema de hidrología, también iban a marcar el proyecto, Iban a disminuir dotaciones y demás, pero pues eso no se plasmó en los documentos que se allegó, o sea no sé si es que no se ha enviado la documentación completa o qué es lo que está sucediendo, pero ahí todavía tenemos ciertas falencias, lo mismo con relación al tema geotécnico, el tema hidráulico en el listado de observaciones se requerían varios documentos complementarios, no

FORMATO: ACTA**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

sea, llegaron, como ya les mostré, la documentación que se subsanó, son básicamente ciertos, entonces ahí tenemos como esas falencias Eh, y pues con relación al tema predial, en la solicitud menciona que pueden ser actualizados en la etapa de obra y pues ahí de pronto quiere hacer, quiero hacerles la claridad pues la resolución que rige el mecanismo no nos permite hacer esto.

Resalta además que ya se lleva un tiempo prudencial para mostrar avances del proyecto y se invita a definir compromisos claros y contundentes para subsanar las observaciones que se han efectuado, en especial temas de permisos ambientales y servidumbres.

Por otra parte, se hace hincapié en que, si el proyecto no cuenta con los estudios completos, o bajo las condiciones que se encuentra en este momento, muy seguramente el veredicto del comité será devolver el proyecto.

La consultoría e interventoría mencionan que se han realizado innumerables mesas de trabajo para plantear alternativas de solución al componente predial y técnicos en general.

El Alcalde finaliza las intervenciones mencionando que, se encuentra desconcertado por el no avance del proyecto a pesar de los estudios contratados.

La doctora Esperanza Ortiz, manifiesta los aspectos mas relevantes del proyecto que han impedido el avance. Y siempre se ha contado con el apoyo de Aguas del Huila para llevar a termino los proyectos planteados por el municipio.

3. Preguntas e inquietudes.

Las Inquietudes fueron resueltas durante las intervenciones de la presentación.

4. Conclusiones.

El ingeniero Luis Carlos Garces menciona que, de acuerdo a la normativa que tenemos vigente, en el Ministerio y la normativa del sector, el proyecto se evalúa integralmente, por eso no nos limitamos al tema de topografía, el tema

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

hidráulico al tema de estructuras, sino que también le incluimos los componentes de operación, lo que es el tema institucional y pues también la gestión predial, pues por eso es como como que se evalúa integralmente, porque eso es lo que nos dicta la normativa del sector y pues la idea es que los proyectos que se viabilicen sean totalmente ejecutables y sostenibles, pues por eso se hacen esos términos.

Se manifiesta de parte del Ing. Garces estoy totalmente presto a reunirme con ustedes a hacer mesas de trabajo, siempre hemos estado en esa disposición. Pues como primera medida, lo que ya les mencioné para la próxima semana organizamos Mesa Técnica.


5. Cierre de la reunión.

Agradecimientos entre los participantes y despedida.

COMPROMISOS.

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Realizar nueva mensa de Trabajo para subsanar los diferentes componentes, especialmente predial.	Alcaldía Consultoría Interventoría Aguas del Huila Minvivienda	15 de noviembre de 2023.

FIRMAS:

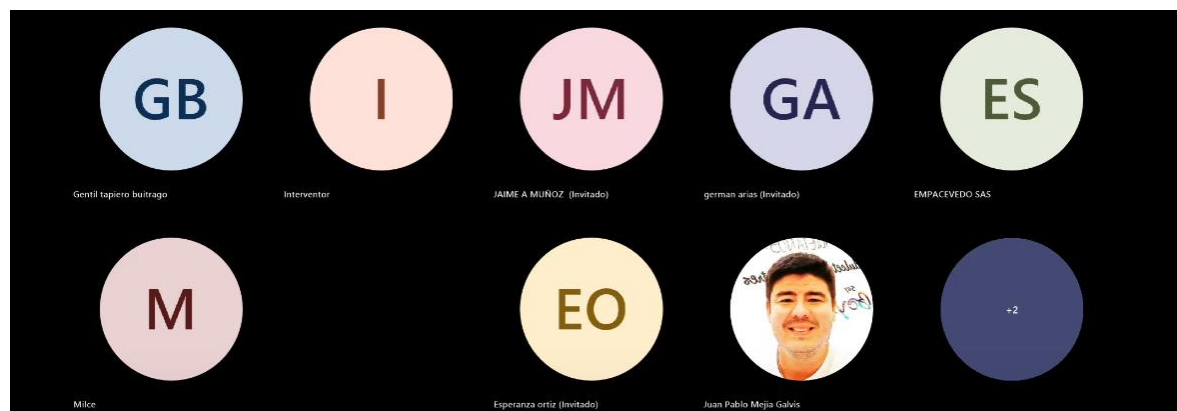

Anexos: Ninguno.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

Elaboró: LUIS CARLOS GARCES FERNANDEZ - JUAN PABLO MEJÍA GALVIS
Revisó: N.A.
Fecha: 09/11/2023
