

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA No. 08
REUNION DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE PAP DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 11 de septiembre del 2023
HORA:	De 3:00 pm a 4:00 pm
LUGAR:	Plataforma Digital Teams
ASISTENTES:	JAVID PEÑARANDA. Director de Aseguramiento ESEPGUA S.A E.S.P. HAROLD SOLANO. Profesional Aseguramiento- apoyo a la supervisión del PAP- ESEPGUA SA E.S.P. LUCIA VERGARA. Contratista Líder Aseguramiento La Guajira. Subdirección de Desarrollo Empresarial -MVCT
INVITADOS:	Ninguno

ORDEN DEL DIA:

- Tema 1. Presentación de los asistentes.
- Tema 2. Revisión de compromisos del 07 del 31 de julio de 2023.
- Tema 3: Revisión de avances ejecución PAP vigencia 2023.

DESARROLLO:

Se inició la reunión por parte de la líder de aseguramiento del PDA La Guajira de la SDE, con el fin de realizar la presentación formal al equipo de aseguramiento de ESEPGUA SA ESP, indicando que la profesional María Mercedes Molina ya no se encuentra vinculada al MVCT desde el mes de agosto de 2023 y, de ahí que desde la SDE se determinara asignar a un nuevo profesional para el seguimiento del PAP para el departamento de La Guajira.

De parte de ESEPGUA SA ESP, el director de aseguramiento Javid Peñaranda, expresó su disposición para continuar trabajando de la mano con MVCT para la ejecución y seguimiento de los compromisos asumidos en el marco del PAP vigencia 2023.

Continuando con el desarrollo de la reunión, se realizó un recuento de los compromisos suscritos en la pasada acta de reunión No. 07 del 31 de julio de 2023, en el cual se encontró lo siguiente:

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

COMPROMISO	COMENTARIO
ESEPGUA S.A. E.S.P. se compromete a enviar el estado actual de los proyectos teniendo en cuenta que la información es pública, aclarando si se les hicieron prórroga o si fueron reformulados por parte del MVCT.	Fue aclarado por parte de la SDE que esta información se trabajará de manera coordinada con el equipo de La Territorial para unir esfuerzo y no duplicar requerimientos de información.
ESEPGUA SAS ESP, debe entregar la información de los 17 proyectos a su cargo, incluyendo los 2 proyectos nuevos que les fueron asignados.	
ESEPGUA SAS ESP, debe enviar la información de línea base solicitada mediante un correo desde el 24 de julio.	Fue aclarado por parte del director de aseguramiento que esta información fue remitida a María Mercedes Molina. Por parte de la SDE se solicitó reenviar nuevamente la información para hacer la revisión de esta.
ESEPGUA SAS ESP, debe enviar la ficha de seguimiento de los meses mayo – junio.	
Se le solicita a ESEPGUA SAS ESP, que comparta el documento que la firma interventora les hizo llegar con el cronograma de actividades.	Al respecto el PDA informó que están esperando el corte del 15 de septiembre en el cual la interventoría se comprometió a remitir la reprogramación solicitada por ESEPGUA SA ESP.
MVCT La contratista María Mercedes Molina, debe enviar comentarios del archivo Excel donde se hablan de las actividades y capacitaciones	Pendiente por parte de la SDE hasta no recibir la reprogramación por parte de ESPEGUA SA ESP.

Como tercer punto en la agenda de la reunión, se retomó el seguimiento a la ejecución del PAP mediante el cual el director de aseguramiento del PDA realizó el siguiente recuento:

- La ejecución del PAP se está adelantando a través de un contrato de consultoría, suscrito con la Unión Temporal Aseguramiento Guajira el día 17 de marzo de 2023, por un plazo de 8 meses con fecha de inicio el 15 de mayo de 2023.
- ESEPGUA SA ESP indicó que, a corte del 15 de agosto de 2023, la consultoría registra un porcentaje de avance de 0%. Esta situación se debe a demoras por parte del contratista en la entrega de las hojas de vida lo cual ha demorado el inicio de actividades.
- Adicionalmente, ESEPGUA SA ESP realizó requerimiento de los contenidos temáticos para las capacitaciones que va a realizar el contratista, donde también demoraron mas de dos meses en entregarlo.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

- ESEPGUA SA ESP, indicó su preocupación con relación al atraso de 4 meses que presenta la consultoría, razón por lo cual han solicitado a la interventoría una reprogramación al cronograma de actividades y el plan de contingencia para atender el atraso que se ya se tiene.
- Con relación a las actividades del PACA, el contratista ya tiene identificadas las comunidades a abordar con el cual podrán consolidar el plan de gestión.

Respecto a lo indicado por ESEPGUA SA ESP, la líder de aseguramiento del PDA por parte de la SDE indicó que para MVCT es una alerta importante el hecho que la ejecución del PAP aprobado para la vigencia 2023 presente un atraso tan importante como lo son 4 meses. Al respecto, se sugirió a ESEPGUA SA ESP revisar a nivel jurídico y de ejecución contractual, las medidas necesarias para avanzar en el desarrollo de las actividades dado que el tiempo de ejecución aprobado en el concepto favorable estaba consumido en un 50% pero 0% de ejecución física, lo cual permite inferir que, a enero de 2024, fecha en la que está prevista la culminación del PAP, no va a estar cumplido.

De igual forma, se solicitó a la dirección de aseguramiento hacer llegar el cronograma de actividades una vez la interventoría remita el mismo, el listado de comunidades priorizada para las actividades del PACA y los informes bimestrales correspondientes a los periodos: a. Mayo- Junio, b. Julio- Agosto

Finalmente, ESEPGUA SA ESP indicó que está en el proceso de revisión de las situaciones anteriormente señaladas con el fin de buscar una solución a la ejecución del PAP.


COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Elaborar y enviar Acta de Asistencia Técnica	SDE	Inmediato
2	Programar próxima reunión de AT	SDE	Entre el 18 y 20 de octubre de 2023
3	Remisión de informes bimestrales correspondientes a los periodos: a. Mayo- Junio, b. Julio- Agosto	ESEPGUA SA ESP	30 de septiembre de 2023.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
4	Remisión reprogramación de cronograma de actividades de la consultoría	ESEPGUA SA ESP	30 de septiembre de 2023.
5	Remisión de ejercicio de priorización de comunidades para la ejecución de actividades	ESEPGUA SA ESP	30 de septiembre de 2023.

CONSTANCIA ASISTENCIA A REUNIÓN

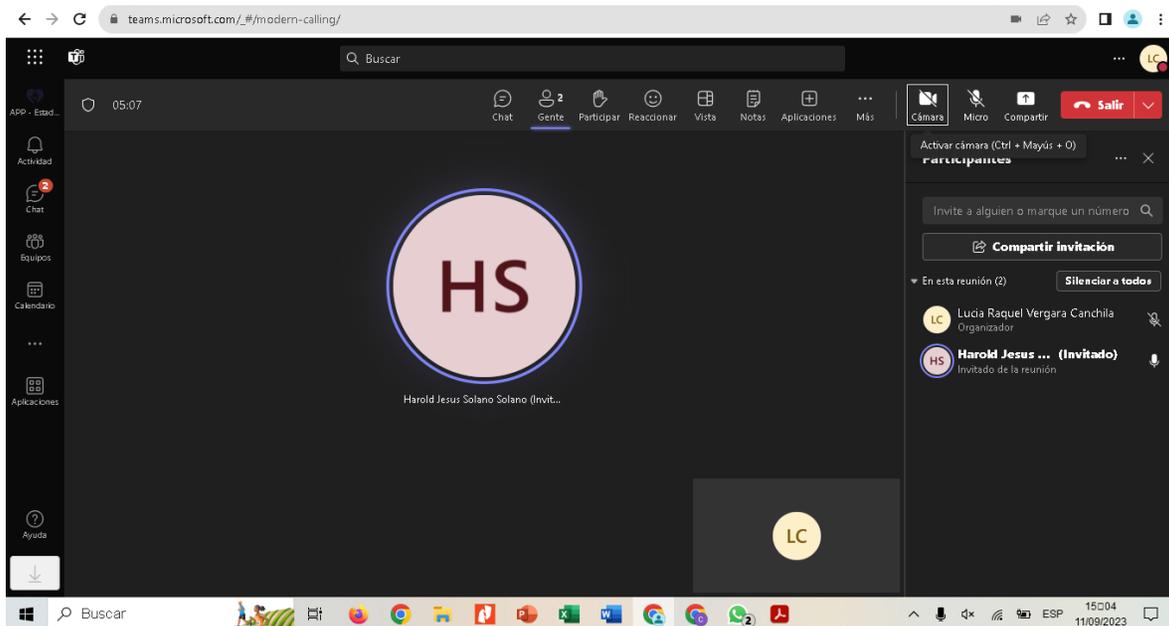

Elaboró: Lucia Vergara. Subdirección de Desarrollo Empresarial
Revisó: NA
Fecha: 15 de septiembre de 2023
