

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA DE REUNIÓN

DATOS GENERALES:

FECHA:	27 de diciembre de 2023
HORA:	De 08:00 a 09:00 horas
LUGAR:	Reunión Virtual MS Teams
ASISTENTES:	- Hugo Nelson Gómez Director área Socioambiental y Territorial Empopasto SA ESP e-mail: hugo.gomez@empopasto.com.co - José Rosales Director área de Diseños Empopasto SA ESP e-mail: jose.rosales@empopasto.com.co - Elizabeth Cuaspud Buesaco Contratista área de Diseños Empopasto SA ESP e-mail: elizabethcuaspud@hotmail.com - Guido Jojoa Topógrafo Empopasto SA ESP - Daniela Guerrero Contratista área Socioambiental Empopasto SA ESP - Daniel Emilio Moreno Montenegro Líder de evaluación de proyectos MVCT e-mail: DEMoreno@minvivienda.gov.co

OBJETO:

Seguimiento a las gestiones realizadas por el Formulator del proyecto "CONSTRUCCIÓN TRONCAL SANTA MÓNICA FASE III MUNICIPIO DE PASTO" - código 2-2019-128 (Radicado: 2019ER0049182), relacionadas con el requerimiento (radicado N° 2023EE0087859 del 15/sep/2023) realizado por el MVCT a la documentación técnica del proyecto en virtud del proceso de evaluación conforme a la Res. MVCT 661/2019.

ORDEN DEL DIA:

1. Seguimiento a las gestiones realizadas por el Formulator del proyecto 2-2019-128 en atención al requerimiento de radicado N° 2023EE0087859 del 15/sep/2023.
2. Observaciones y comentarios finales.


DESARROLLO:

Por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) se dio apertura a la reunión dando la bienvenida a los asistentes. La reunión se desarrolló abordando los temas listados en el orden del día, a saber:

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

1. Empopasto SA ESP señaló que se encuentra trabajando en los ajustes y actualizaciones derivadas de los requerimientos realizados por el MVCT, razón por la cual no le fue posible cumplir con la fecha prevista de entrega acordada para el 18/dic/2023. Frente al componente topográfico se indicó que fueron materializadas 8 placas para efectos de complementar la información del proyecto, sin embargo, por problemas técnicos de las antenas de la red geodésica local, no se ha logrado el avance esperado y en esa medida se ha retrasado la entrega de la documentación del proyecto al MVCT.

Empopasto SA ESP también precisó que producto de una revisión interna del proyecto, se identificó la necesidad de incluir un tramo de alcantarillado pluvial de aproximadamente 300m de longitud, con el propósito de garantizar la funcionalidad del tramo inicial del colector pluvial el "Ejido" y la viabilidad técnica de todo el proyecto.

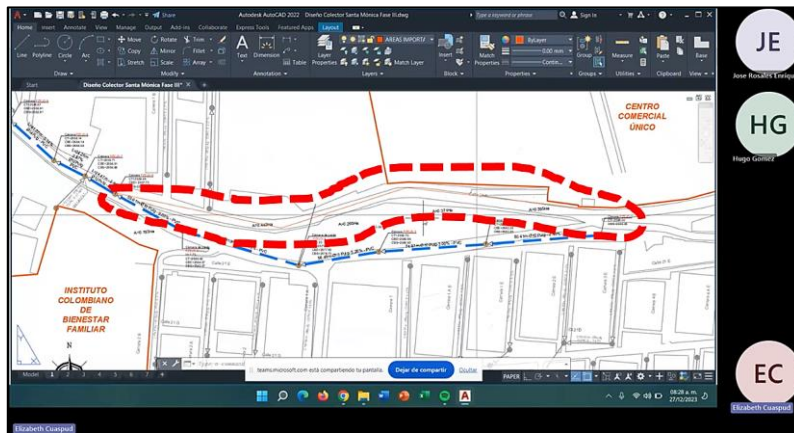

En cuanto a esta novedad el MVCT indicó que la Interventoría de los estudios y diseños debe avalar este ajuste realizado al alcance del proyecto.

Respecto a las comunidades conurbanas de Mocondino Bajo y Canchala, Empopasto SA ESP manifestó que no se han efectuado nuevos acercamientos con posterioridad a la acción de tutela interpuesta por el Resguardo Indígena de Mocondino en septiembre de 2023 contra el municipio de Pasto, Empopasto SA ESP y el MVCT. El MVCT indicó que la subsanación del componente institucional del proyecto en lo relacionado con estas conurbaciones hace parte de los requerimientos consignados en el radicado N° 2023EE0087859 del 15/sep/2023, por lo que debe ser atendido. Empopasto SA ESP indicó que debido a la postura antagónica asumida por esta comunidad conurbana frente al proyecto, cualquier solución o salida que involucre la participación de Empopasto será rechazada por esta comunidad. Teniendo en cuenta las mesas de trabajo realizadas sobre este tema y las conclusiones alcanzadas sobre el particular, el MVCT invitó nuevamente a Empopasto SA ESP a explorar todas las posibilidades que brinda la Carta Política y el marco regulatorio para normalizar el vertimiento de aguas residuales combinadas generado en estas conurbaciones.

El MVCT indicó que mientras se logra una solución de fondo y se normaliza el aporte conurbano de aguas residuales combinadas, es menester avanzar con el proceso de evaluación y plantea para la respectiva consideración de Empopasto SA ESP, la opción de reemplazar en la documentación técnica del proyecto, todas las menciones o referencias alusivas a la "comunidad de Mocondino y Canchala", por ejemplo, por "comunidades conurbanas", sin que esto signifique suprimir del alcance del proyecto los aportes y caudales de diseño correspondientes a estas conurbaciones.

Teniendo en cuenta lo descrito en esta sesión de trabajo, Empopasto SA ESP indicó que entregará al MVCT la documentación del proyecto ajustada y actualizada a más tardar el 15/feb/2023.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

2. Por parte de los asistentes no se generan más comentarios por lo que se procede a terminar la reunión.

COMPROMISOS: (Si aplica)

#	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE DE CUMPLIMIENTO
1	Presentar al MVCT la documentación del proyecto "CONSTRUCCIÓN TRONCAL SANTA MÓNICA FASE III MUNICIPIO DE PASTO" atendiendo la totalidad de los requerimientos realizados mediante el radicado 2023EE0087859 del 15/sep/2023.	Empopasto SA ESP	15/feb/2024
--	-----	-----	-----

EVIDENCIA DE ASISTENCIA:

Meeting Summary						
Total Number of Participants 6						
Meeting Title Mesa de Trabajo 09 - Troncal Santa Mónica Fase III, Pasto						
Meeting Start Time Wed, Dec 27, 7:56 AM						
Meeting End Time Wed, Dec 27, 8:59 AM						
Meeting Id ebbdf946-6f8a-43ff-87af-efc27cbcc0de						
Name	First join	Last leave	Duration	Email	Role	Participant ID (UPN)
Daniel Emilio Moreno Montenegro	Wed, Dec 27, 8:00 AM	Wed, Dec 27, 8:59 AM	59min 40sec	DEMoreno@minvivienda.gov.co	Organizer	DEMoreno@minvivienda.gov.co
Jose Rosales Enríquez	Wed, Dec 27, 8:00 AM	Wed, Dec 27, 8:59 AM	59min 8sec		Presenter	
Elizabeth Cuaspud	Wed, Dec 27, 8:00 AM	Wed, Dec 27, 8:18 AM	17min 48sec		Presenter	
Hugo Gomez	Wed, Dec 27, 8:02 AM	Wed, Dec 27, 8:59 AM	57min 1sec		Presenter	
Daniela Guerrero	Wed, Dec 27, 8:06 AM	Wed, Dec 27, 8:39 AM	30min 42sec		Presenter	
Elizabeth Cuaspud	Wed, Dec 27, 8:23 AM	Wed, Dec 27, 8:59 AM	35min 27sec		Presenter	

Elaboró: Daniel Moreno – MVCT.

Vo.Bo.: José Rosales, Hugo Gómez, Elizabeth Cuaspud, Daniela Guerrero, Guido Jojoa – Empopasto SA ESP (Formulador del proyecto).
