

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ACTA DE REUNIÓN

DATOS GENERALES:

FECHA:	27 de diciembre de 2023
HORA:	De 10:00 a 12:00 horas
LUGAR:	Virtual (MS Teams)
ASISTENTES:	- Diomar Claro Márquez Alcalde municipal de Gamarra, Cesar e-mail: diomarcla09@yahoo.es alcaldia@gamarra-cesar.gov.co - Omar Enrique Conde Pacheco Secretario municipal de planeación de Gamarra e-mail: omacnopa@hotmail.com planeacion@gamarra-cesar.gov.co - Andrius Gómez Sierra Apoyo secretaria de planeación de Gamarra e-mail: planeacion@gamarra-cesar.gov.co - Wilson Fernández Rodríguez Consultor del proyecto e-mail: wilferod@hotmail.com - Loiman Rodríguez Consultor del proyecto e-mail: loimanrodriguez1@gmail.com - Luis Enrique Bautista Badillo Consultor del proyecto e-mail: luis.bautista2@unipamplona.edu.co - Justo Ramos Presidente JAC corregimiento de Palenquillo - Daniel Emilio Moreno Montenegro Líder de evaluación de proyectos MVCT e-mail: DEMoreno@minvivienda.gov.co

OBJETO:

Mesa de trabajo de revisión del alcance propuesto por el municipio de Gamarra, Cesar para el proyecto de inversión "código 1-2023-83. CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CORREGIMIENTO DE PALENQUILLO, MUNICIPIO DE GAMARRA, DEPARTAMENTO DEL CESAR” (Radicado: 2023ER0051247).

ORDEN DEL DIA:

1. Revisión del alcance propuesto por el municipio de Gamarra para el proyecto de inversión 1-2023-83.
2. Observaciones y comentarios finales.

DESARROLLO:

Por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (MVCT) se dio apertura a la reunión dando la bienvenida a los asistentes. Se explicó el alcance que tiene esta mesa de trabajo y se procedió a desarrollar el orden del día según los temas listados, a saber:



1. El MVCT manifestó a la Entidad Formuladora que una vez superada la etapa de “revisión documental preliminar” según lo establecido en la Res. MVCT 661/2019, el paso siguiente de acuerdo al grado de maduración del proyecto es su evaluación bajo la modalidad “por etapas”, instancia en la cual se verifica por parte del MVCT el cumplimiento de los requisitos establecidos para cada uno de los componentes de este proyecto de inversión conforme a la norma referida.

Teniendo en cuenta la documentación técnica aportada por la Entidad Formuladora del proyecto, en esta mesa de trabajo el MVCT generó las siguientes observaciones para que puedan ser consideradas por el Formulator y producto de ello plasmadas en ajustes, complementos, actualizaciones, aclaraciones y subsanaciones a dichos documentos técnicos:

- i) Fundamental registrar el código BPIN del proyecto en la ficha MGA.
- ii) En la ficha MGA se observa la inclusión del Plan Nacional de Desarrollo (PND) del gobierno anterior (2018-2022), por lo que es necesario actualizar este documento incluyendo el correspondiente PND del gobierno actual. Así incluir lo correspondiente a los planes de desarrollo de las nuevas administraciones departamentales y municipales que iniciaran su periodo en 2024.
- iii) Con fundamento en la situación actual y problemática expuesta por el Formulator en esta mesa de trabajo, el MVCT señaló la pertinencia de replantear la estructuración del problema, habida cuenta que en la MGA el “problema central” es en realidad una de las causas que desencadenan el problema; en ese orden de ideas es importante aplicar lo establecido en la Res. DNP 1450 de 2013.
- iv) Conforme a lo descrito por el municipio de Gamarra, se entiende que en el corregimiento de Palenquillo hay habitantes pertenecientes a un Concejo Comunitario Afrodescendiente; en ese sentido es relevante precisar si entre la comunidad directamente beneficiaria con este proyecto de inversión existen personas de ese Concejo Comunitario.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

- v) Es conveniente consolidar la información del proyecto presentada al MVCT; por ejemplo, la población beneficiaria es diferente en la ficha MGA (601 habitantes) y en la ficha resumen del proyecto (1316 habitantes).
- vi) Importante presentar información del sistema de acueducto existente en la cabecera corregimental de Palenquillo y en la vereda La Andia, las cuales son las 2 zonas que se beneficiarán con este proyecto de inversión. Esta observación se realiza con la finalidad de identificar aspectos que sea necesario mejorar en la infraestructura y en el servicio de acueducto prestado, toda vez que, si el acueducto presenta fallas considerables, el sistema de alcantarillado que se pretende construir con este proyecto tampoco operará bajo las condiciones esperadas.
- vii) Según lo descrito por la Entidad Formuladora, se entiende que la comunidad de Palenquillo se muestra resistente a la entrada de una empresa u organización distinta a la JAC existente para ejercer la prestación del servicio público de alcantarillado; en este sentido, es importante realizar el diagnóstico institucional de la JAC de Palenquillo para identificar las fortalezas y aspectos a mejorar de esta organización comunitaria.
- viii) Fundamental ajustar el análisis de alternativas del proyecto atendiendo lo establecido en la Res. DNP 1450 de 2013 y aplicando los criterios de selección establecidos en el RAS. Sobre este particular y teniendo en cuenta el alcance descrito por el Formador, el MVCT considera pertinente realizar un análisis para las alternativas del componente de recolección y transporte de aguas residuales, y otro análisis para las alternativas del componente de tratamiento. Esta observación se realiza con el ánimo de garantizar plena consistencia y coherencia entre las posibles alternativas de solución del problema respecto a las condiciones/limitaciones del contexto en Palenquillo.

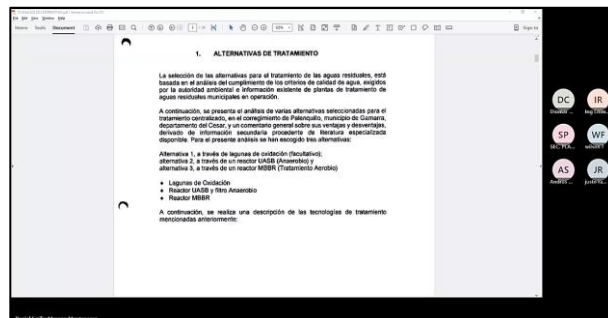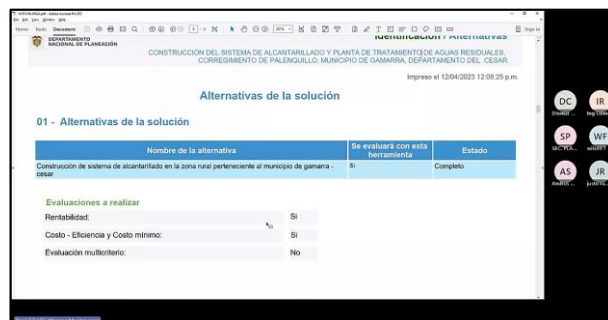

La Entidad Formuladora señaló que trabajará sobre las observaciones realizadas en esta sesión por parte del MVCT y presentará la documentación con los ajustes y actualizaciones a que haya lugar.

El MVCT planteó la conveniencia de revisar cuanto antes la estructuración de la necesidad del proyecto, especialmente el planteamiento, análisis y selección de alternativas. En este sentido el Consultor manifestó que entregará los ajustes concernientes a este tema a más tardar el 19/ene/2024. Una vez recibida esta información el MVCT agendará una nueva mesa de trabajo para brindar la retroalimentación del caso y continuar con la asistencia técnica a la Entidad Formuladora.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

2. Por parte de los asistentes a esta sesión no se generaron más comentarios. El MVCT agradeció la participación de los asistentes. Se procedió a terminar la reunión.

COMPROMISOS: (Si aplica)

#	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE DE CUMPLIMIENTO
1	Presentar al MVCT el planteamiento, análisis y selección de alternativas del proyecto conforme a las observaciones realizadas en esta mesa de trabajo.	Municipio de Gamarra	19/ene/2024

EVIDENCIA DE ASISTENCIA:

Meeting Summary						
Total Number of Participants	11					
Meeting Title	Mesa de Trabajo 02 - Alcantarillado, PTAR Palenquillo, Gamarra					
Meeting Start Time	Wed, Dec 27, 9:57 AM					
Meeting End Time	Wed, Dec 27, 11:59 AM					
Meeting Id	b836466a-75cd-4e71-817c-e299926cff70					
Name	First join	Last leave	Duration	Email	Role	Participant ID (UPN)
Daniel Emilio Moreno Montenegro	Wed, Dec 27, 10:00 AM	Wed, Dec 27, 11:59 AM	1hr 59min	DEMoreno@minvivienda.gov.co	Organizer	DEMoreno@minvivienda.gov.co
Diomar Claro	Wed, Dec 27, 10:00 AM	Wed, Dec 27, 11:59 AM	1hr 58min		Presenter	
LUIS ENRIQUE BAUTISTA BADILLO	Wed, Dec 27, 10:04 AM	Wed, Dec 27, 10:11 AM	7min 7sec	luis.bautista2@unipamplona.edu.co	Presenter	luis.bautista2@unipamplona.edu.co
Ing Loiman Rodríguez	Wed, Dec 27, 10:04 AM	Wed, Dec 27, 11:45 AM	1hr 40min		Presenter	
SEC. PLANEACION - GAMARRA CESAR (Invitado)	Wed, Dec 27, 10:07 AM	Wed, Dec 27, 11:59 AM	1hr 52min		Presenter	
wilson f	Wed, Dec 27, 10:07 AM	Wed, Dec 27, 11:59 AM	1hr 51min		Presenter	
Andrus Gomez Sierra	Wed, Dec 27, 10:10 AM	Wed, Dec 27, 11:59 AM	1hr 48min		Presenter	
justo ramos	Wed, Dec 27, 10:12 AM	Wed, Dec 27, 11:44 AM	1hr 31min		Presenter	
julian	Wed, Dec 27, 10:13 AM	Wed, Dec 27, 10:14 AM	1sec		Presenter	
julian	Wed, Dec 27, 10:14 AM	Wed, Dec 27, 10:26 AM	12min 32sec		Presenter	
maicol	Wed, Dec 27, 11:47 AM	Wed, Dec 27, 11:59 AM	12min 6sec		Presenter	

Elaboró: Daniel Moreno (MVCT).

Aprobó: Diomar Claro, Omar Conde, Andrius Gómez, Wilson Fernández, Loiman Rodríguez (Entidad Formuladora).
Justo Ramos (Comunidad Palenquillo).
