

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

**ACTA DE COMITÉ CONVENIOS 1314 DE 2023 - 18 -12 -2023**

**DATOS GENERALES**

FECHA:	18 de diciembre de 2023
HORA:	De 15:00 a 16:00
LUGAR:	<b>Microsoft Teams</b>
ASISTENTES:	Sebastián Ramírez Gómez - Gestor zona pacifico del MVCT. Lianis María Mosquera – Profesional de seguimiento - MVCT Andrea del Pilar Mantilla Rueda- Profesional especializado MVCT, Acompañamiento social. Ana María Córdova Lozano – Gerente de la Empresa Aguas del Chocó, Gestor PDA Chocó Héctor Emilio Mosquera Murillo - Coordinador Técnico de la Empresa Aguas del Chocó, Gestor Plan Departamental de Agua, ejecutor de los proyectos. Alex Enil Mosquera – Apoyo componente Alcantarillado PDA. Darwin Arley Murillo Palacios - R.L. Consorcio Intentaría alcantarillado 2023. Jhony Albornoz Córdoba - RL. Unión Temporal Alcantarillado Meluk 2023. Dilson Quinto Hurtado Secretario de Planeación Municipal de Medio Baudó – Supervisor designado por la entidad.
INVITADOS:	

**ORDEN DEL DÍA:**

- 1.- Presentación
- 2.- Presentación estrategia social a contratistas.
- 3.- Recomendaciones inicio de ejecución del proyecto construcción sistema de alcantarillado sanitario y PTAR en Puerto Meluk, municipio de Medio Baudó, Departamento del Chocó
- 4.- compromisos

**DESARROLLO:**

- 1.- Presentación: esta es realizada por cada uno de los asistentes relacionados en el cuadro de inicio.
- 2.- Presentación estrategia social a contratistas.  
Ingeniera Lianis inicia la intervención enunciando que la contratación derivada ya cuenta con actas de inicio, pero que hay actividades de no se alcanzaron a realizar por la temporada, como es la segunda fase de la estrategia social, la cual es contarle a la comunidad que ya se cuenta con contratistas, e informarle mas a detalle que sobre los componentes del proyecto y los tiempos

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL  
**Versión:** 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

probables de ejecución, el acompañamiento del Ministerio y en ese orden de ideas se la da la palabra a:

Andrea del Pilar Mantilla Rueda: la cual explica de que antes de iniciar obra se realice la respectiva socialización y explica de que trata la estrategia social que esta implementado el Ministerio, indicando que ya se realizó un primer momento con líderes y autoridades del municipio. Que además es muy importante en el segundo momento la conformación de la veeduría ciudadanía, que dentro de la convocatoria que se balla a realizar quede ampliamente establecido el tema la convocatoria, para que el día de la socialización también se conforme la veeduría ciudadana del proyecto, los cuales no van a estar solos si no que van a tener un acompañamiento permanente por parte del ministerio incluidas capacitaciones.

Se pregunta por las fechas tentativas de socialización para lo cual se realiza el cruce de contactos para gestionar esta actividad de acuerdo con agenda del ministerio y convocatorias en territorio.

Manifiesta el contratista de obra Jhony Albornoz Córdoba, que le preocupan los tiempos para realizar la socialización, por que les restringe el iniciar levantando actas de vecindad, y que por los tiempos les toca volver actualizar pólizas, a lo que se responde que como el proyecto tiene etapa de apropiación de diseños, estos se pueden ir adelantando y si se va realizar las actas de vecindad, se puede hacer socialización casa a casa para ir adelantando mientras se haga el evento general con toda la comunidad. Las pólizas no tienen ninguna injerencia ya que el proyecto estaría en ejecución y que la socialización general es para el inicio de obra, es contarle a la comunidad que se va hacer, como se va hacer y cuando se va hacer y conformar la respectiva veeduría ciudadana.

Como se quiere iniciar con el levantamiento de actas de vecindad, la parte social consulta si al inicio se puede presentar un cambio de trazado a lo que se responde que no por el proyecto que se va a desarrollar en alcantarillado y a menos que se hagan excavaciones que no dejen trabajar se presentaría un cambio de trazado, También manifiesta Dilson Quinto Hurtado, que lo que puede surgir es el crecimiento poblacional (beneficiarios), desde la presentación del proyecto, aprobación y posterior contratación a la fecha de inicio de ejecución del mismo, que el trazado inicial del proyecto no surtiría este tipo de variación.

3.-Recomendaciones inicio de ejecución del proyecto construcción sistema de alcantarillado sanitario y PTAR en Puerto Meluk, municipio de Medio Baudó, Departamento del Chocó

Ingeniera Lianis, continuemos con la parte técnica estableciendo su primera etapa la cual es la apropiación de diseños en los componentes de Topografía y estructurales y que ya se cuenta con actas de inicio; recomendación iniciar apropiación con revisión documental pese a estar en festividades para que el proyecto no se cuelgue en tiempos, tenido en cuenta que ya se cuenta con un plan para el desarrollo de actividades. Dado que esta actividad es una de las más importantes porque ratifica o modifica lo ya aprobado en el proyecto, en ministerio revisa y vela por el cumplimiento de las normas y que los proyectos cumplan el objetivo para lo que fue aprobado, siendo énfasis en los compromisos adquiridos con la firma del cur.

Interviene el ingeniero Héctor Emilio Mosquera Murillo, solicita que el profesional evaluador que identificó en temas de profundización el componente de topografía y el componente estructural, nos informara exactamente que se pudo identificar en la evaluación para así mismo puntualmente, interventoría y contratista de obra puedan conocer de primera mano.

**FORMATO: ACTA**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
**Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01**


Interviene el ingeniero Alex Enil Mosquera: informado que se va realizar una mesa de trabajo con contratista de obra e interventoría revisar a fondo el tema de profundización. Acompañamiento en el tema de las actas de vecindad.

En cuanto a la solicitud realizada por el ingeniero Héctor, se manifiesta que se le consultará a el evaluador líder, la respuesta que este entregue se le hará saber. Mas sin embargo casi por regla general quien diseña no es quien construye; que el objetivo de la profundización es que lo que esta plasmado en documentos se verifique en terreno y mirara en cumplimiento de estos en todos los aspectos.

Se concluye la reunión con los agradecimientos y despedidas de todos los que en ella intervenimos.

4.- compromisos

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Segundo momento de implementación estrategia social. (socialización con la comunidad)	MVCT, Municipio, Entidad contratante y contratistas.	Enero 2024
2	Consulta al evaluador líder y retransmitir respuesta a la entidad contratante PDA - Chocó	MVCT	Diciembre 2023

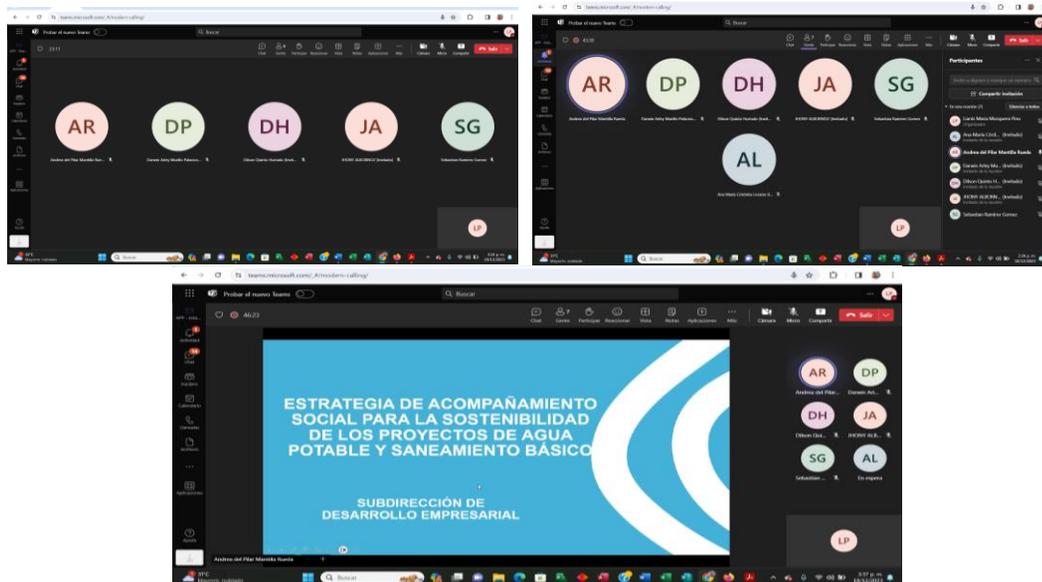

Elaboró: Lianis Maria Mosquera Pino  
Revisó: Sebastián Ramírez Gómez - Gestor zona pacifico del MVCT.  
Fecha: 11-12 -2023
