

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

**ACTA MESA DE ASISTENCIA – FORMULACION PROYECTO DE
PLAN MAESTRO PARA VIABILIDAD**

DATOS GENERALES

FECHA:	Bogotá, 6 de marzo de 2024
HORA:	De 9:00 am a 11:00 am, 2 horas
LUGAR:	Reunión virtual.
ASISTENTES:	German A. Naranjo Faccini, Especialista Hidráulico, Grupo de Evaluación de proyectos VASB. Eduardo Salcedo Velosa, Alcalde municipal, Municipio de Tibasosa, Boyacá. Angela Carolina Medina Higuera, Gerente E.M.T. Municipio de Tibasosa. Jimena Noi, Profesional Apoyo E.M.T. Municipio de Tibasosa.
INVITADOS:	secobraspublicas@tibasosa-boyaca.gov.co alcaldia@tibasosa-boyaca.gov.co

ORDEN DEL DIA:

1. Mesa de asistencia al municipio de Tibasosa para revisar las gestiones ante los condicionamientos presentados al concepto del proyecto PLAN MAESTRO PARA LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA BOYACA FASE I ETAPAS 1, 2 Y 3 y dar recomendaciones al municipio para su presentación a viabilidad ante el MVCT.

DESARROLLO:

Esta mesa de trabajo virtual se desarrolló el miércoles 6 de marzo de 2024, iniciando a las 9:00 a.m., con la finalidad de que el MVCT prestara asistencia al municipio de Tibasosa en la presentación del proyecto PLAN MAESTRO PARA LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE TIBASOSA BOYACA FASE

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

I ETAPAS 1, 2 Y 3 a viabilidad, dado que cuenta con concepto condicionado, así como evidenciar el estado de las gestiones correspondientes a los condicionamientos del proyecto.

Se inicia con el saludo y la presentación de los asistentes, luego de lo cual, el Señor Alcalde realiza un saludo e introducción al proyecto, posteriormente el ingeniero Naranjo presenta los antecedentes del proyecto indicando que este se encuentra con un concepto condicionado que radica en la obtención de predios por parte del municipio así como permisos ambientales y de cruce de vías.

El Doctor Salcedo indica que al momento han avanzado en la parte predial donde se han aproximado a los dueños de 3 de los 5 predios que hacen falta, quienes manifestaron la voluntad de colaborar con el proyecto, indicando adicionalmente que la mayoría de los condicionamientos se encuentran en la etapa 1, y pregunta si hay algún inconveniente en que solo se desarrolle esta etapa. Ante lo cual el Ingeniero Naranjo indica que es decisión del municipio el presentar la etapa 1 (única funcional de manera independiente) pero que de ser así deberán presentar la parte presupuestal separada (únicamente los alcances de la etapa 1) y verificar en la parte técnica que no se requieran por funcionalidad algunos elementos temporales que sean definitivos dentro de los alcances de las otras dos etapas, indicando que en todo caso se debe actualizar los formatos y presentar ya las certificaciones actualizadas así como los permisos correspondientes, en especial los ambientales con la resolución aprobatoria de CORPOBOYACA, y los de vías dependiendo de quien es el ente que tiene dominio sobre la misma.

La Doctora Median indica que han tenido dificultades con el contratista y con la información de proyecto, sobre la cual requieren los planos para verificar las radicaciones ante CORPOBOYACA y los entes viales y constatar el estado de estos permisos, el Ingeniero Naranjo solicita un correo electrónico para remitir la información radicada ante el MVCT, sin embargo indica que procederá a compartir el enlace de los planos para que tengan esta información en los próximos días y puedan proceder con las consultas.


Se deja el comentario que el MVCT esta disponible para atender cualquier inquietud adicional que se presente y se da por terminada la mesa.

FORMATO: ACTA
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL
Versión: 8.0, **Fecha:** 09/06/2023, **Código:** GDC-F-01

COMPROMISOS (Si aplica)

No.	Compromiso	Responsable	Fecha límite de cumplimiento
1	Remitir los planos al municipio.	MVCT	11/03/2024

FIRMAS: Se presentan a manera de firmas la imagen de la reunión evidenciando la presencia de los asistentes:

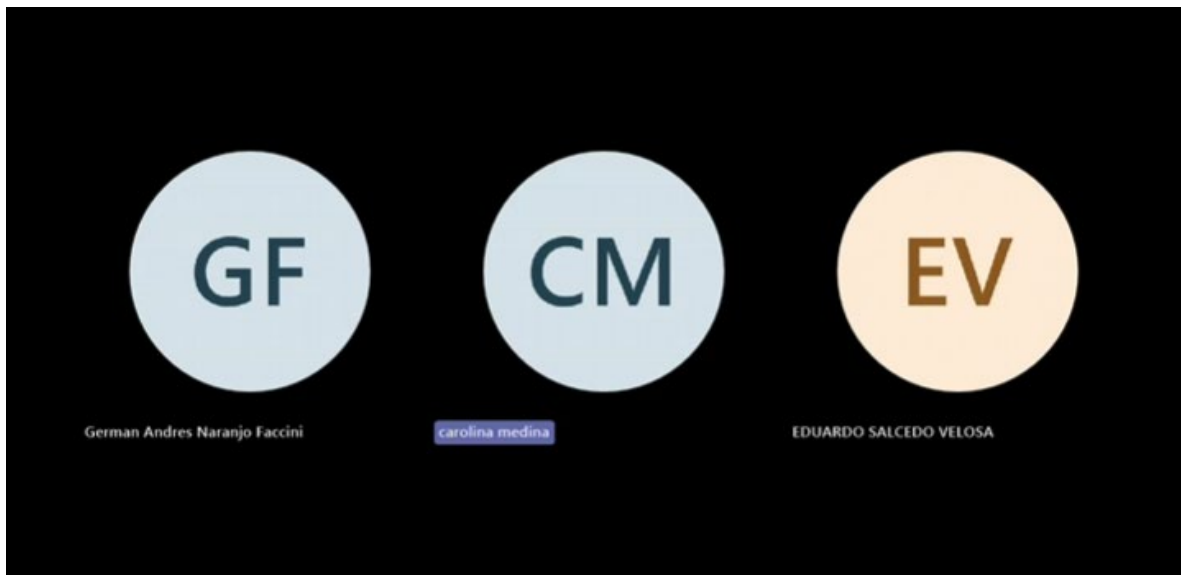

Elaboró: German A. Naranjo F. – Grupo de Evaluación VASB-MVCT.
Fecha: 13/03/2024
