

**FORMATO:** ACTA  
**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

**ACTA REUNION VIRTUAL**

**DATOS GENERALES**

FECHA:	20 de marzo de 2024
LUGAR:	Reunión seguimiento proyecto Támesis
ASISTENTES:	Daily Liliana Lopez Bedoya, Secretaria de Planeación Támesis Armando Larrota Duque, Municipio de Támesis 316 5390086 Leidy Carmona, Supervisora proyecto – PDA de Antioquia Jairo Gómez Riaño: Apoyo Supervisión – Subdirección P. MVCT Jesus Antonio Castro Guerra, Especialista en Topografía Geodesia

**CONVENIO 1137 DE 2020:**

Optimización Redes de Acueducto y Alcantarillado Residual y Pluvial del Municipio de Támesis – Antioquia.

**OBJETO:** Seguimiento a la subsanación de observaciones a la documentación entregada como soportes de la reformulación No. 3

**Agenda:** Avance en la solución a la calibración geodésica cumpliendo la Resolución 661 de 2019 y verificar que los diseños estén acorde a la topografía del sitio de implantación.

**DESARROLLO**

De conformidad con la programado en la última reunión virtual, se inició mesa de trabajo virtual, la cual contó la participación de la administración municipal de Támesis, el contratista encargado de la calibración geodésica, y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

El MVCT solcito se informe sobre los avances que se tiene a la fecha en los trabajos de calibración geodésica del proyecto para cumplir con la Resolución.

El Consultor informó que se han realizado las siguientes actividades:

- Se terminó la construcción de 10 puntos de la red principal, 30 puntos auxiliares red la red secundaria, para un total de 40 puntos, quedo ajustada toda la red.
- Se hicieron levantamiento con RTK con 800 puntos y para la parte más densa se realizó con Estación Total por las interferencias y la densidad de datos a tomar.
- Actualmente se está desarrollando el cálculo de los datos levantados, ajustando las inconsistencias y se inició con el dibujo de correspondiente del levantamiento. Se estima que se tendrán esta información dibujada para el 26 de marzo de 2023.

**FORMATO:** ACTA

**PROCESO:** GESTIÓN DOCUMENTAL

Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

- De los trabajos realizado se tiene una Ortofoto del municipio.

Que falta:

- Terminación de cálculo de resultados trabajo de campo y ajuste levantamiento con la Estación Total.
- Dibujo de los datos próxima semana dibujo.
- Comparación de con la topografía del rediseño la semana 1ª semana de abril.

El Ministerio solicitó se informa si con los datos ya obtenidos se puede establecer las diferencias de la topografía con la que se realizaron la actualización de diseños.

El Consultor manifestó que lo correcto es ajustar toda la topografía en bloque para y no por partes para obtener la consistencia.

De otra parte, el PDA de Antioquia señalo que se esta muy atentos a lograr el objetivo en el menor tiempo posible por que de hay depende los ajustes que se tengan que realizar a los diseños soportes a la solicitud de reformulación que está solicitando al MVCT por parte de Municipio de Támesis y la Gerencia de Servicios Públicos de la Gobernación de Antioquia.


El MVCT solicitó al PDA de Antioquia remitiera nuevamente el Acta de Liquidación de la Interventoria dado que le enviada no cuenta con fecha de suscripción.

Finalmente, el MVCT solicitó al Municipio de Támesis, informara sobre el avance en el proceso de incumplimiento que se lleva a acabo al Consultor inicial de los diseños para tener la trazabilidad y poder reforzar este tema solicitando al COPNIA el estudio del caso.

**COMPROMISOS**



Actividades	Responsable	Fecha
Liquidación de la Interventoria	GSPG Antioquia-PDA	22-03-2024
Calibración Geodésica acorde con a la resolución 0661 de 2029	Municipio de Támesis	12-04-2024
Reunión de seguimiento	MVCT-PDA de Antioquia municipio de Támesis	12 -04 – 2024 3.0 p.m.
Seguimiento al COPNIA	Municipio de Támesis	12-04 2023

**FORMATO: ACTA**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

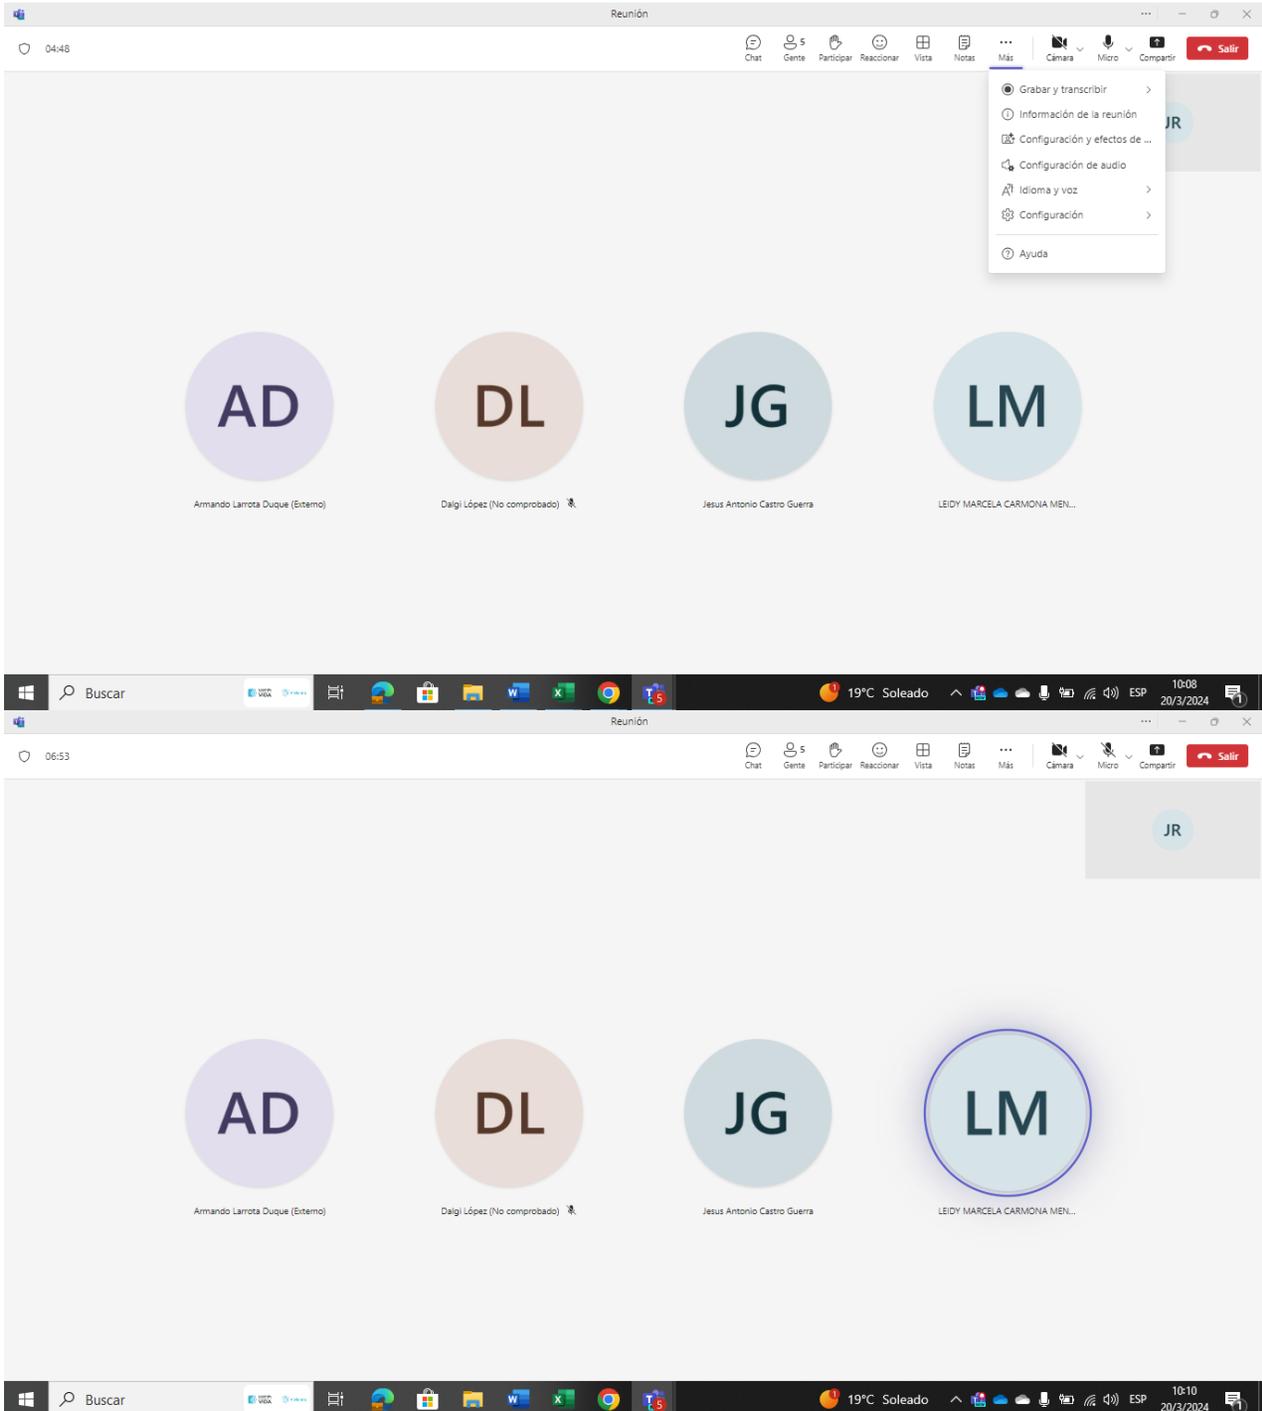

The image displays two screenshots of a Microsoft Teams meeting interface. The top screenshot shows a meeting at 04:48 with four participants: Armando Larrota Duque (AD), Daigi López (DL), Jesus Antonio Castro Guerra (JG), and LEIDY MARCELA CARMONA MEN... (LM). A dropdown menu is open over the 'Más' button, listing options: Grabar y transcribir, Información de la reunión, Configuración y efectos de..., Configuración de audio, Idioma y voz, Configuración, and Ayuda. The bottom screenshot shows the same meeting at 06:53, with the same participants. The Windows taskbar at the bottom indicates the date is 20/3/2024 and the time is 10:08.

**FORMATO: ACTA**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

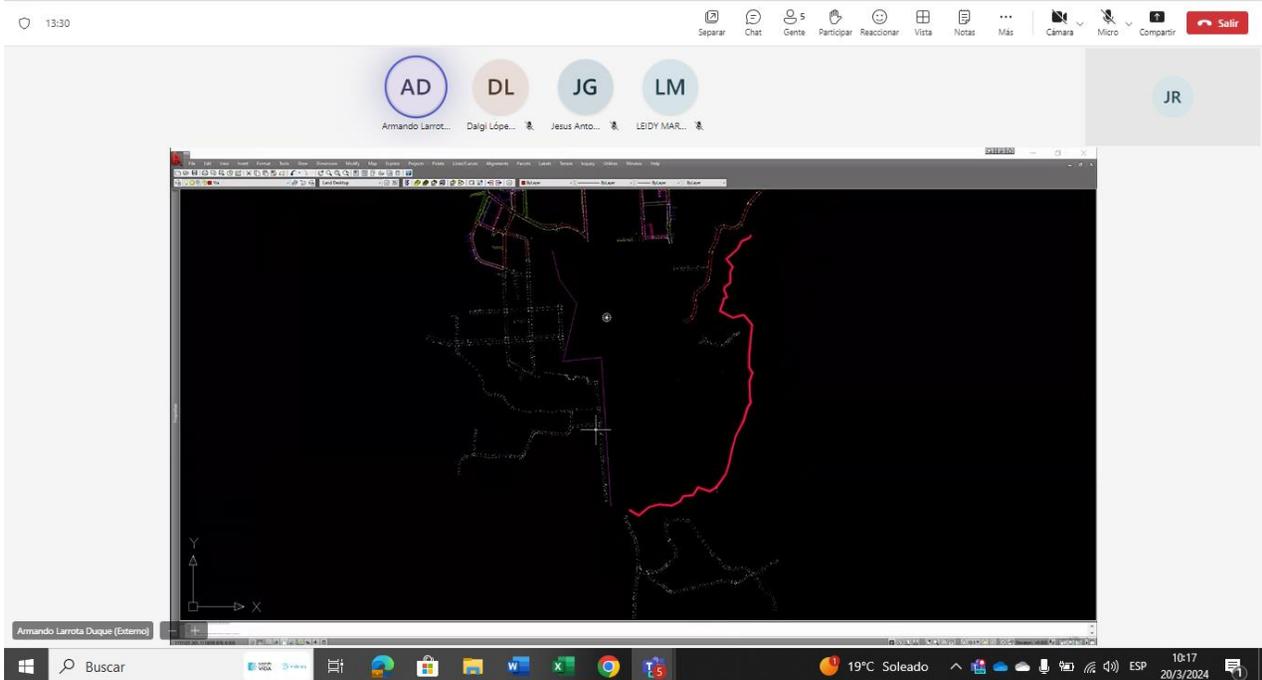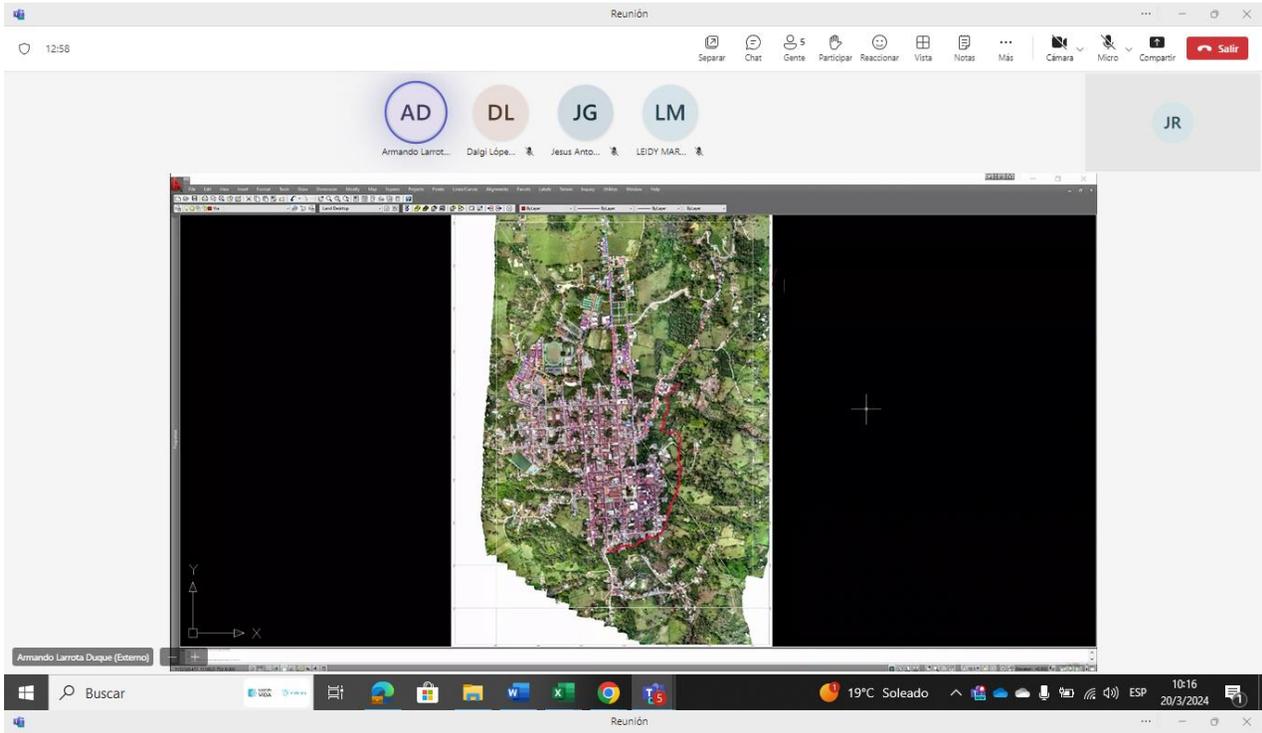

**FORMATO: ACTA**  
**PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL**  
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01

